

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

Дугаар

БА-124/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайран дүүргийн 21 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 4 давхар 1 блок эрдэс чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн зориулалттай барилга, зорьгүй 1 давхар 1 блок хийн хангамжийн зориулалттай барилга, зорьгүй 1 давхар 1 блок халаалтын зуухны зориулалттай барилга нийт 3 блок байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 03 сарын 14-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024/09/26, 0001307, БА32024/0576 дугаартай;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: TPG-02/2023;

2.3. Захиалагч: Тэсо индастриал парк ХХК нэр, 9011847373 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6973817 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороолол, 88100817 холбоо барих утас, teso@gmail.com цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: МГБИ ХХК оноосон нэр, 9011182075 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5283981 регистрийн дугаар, БУ12-725/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, 12-р хороолол, Давст фاینэнс ХХК-н байр 99082231 холбоо барих утас, Battuvshin.pl@gmail.com цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Тэсо Пропертис ХХК оноосон нэр, 9011547043 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5958733 регистрийн дугаар, ЗТ17-475/21 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, энхтайваны өргөн чөлөө, 157, 3, 75756161 холбоо барих утас, head-pdd@tesopropertiea.mn цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Евро базальт ХХК нэр, 9011842961 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6914357 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо, 21 хороолол, үйлдвэрчний эвлэл, 53/2 тоот, 88108698 холбоо барих утас, altannavch09@gmail.com цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 4 давхар 1 блок эрдэс чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн зориулалттай барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок хийн хангамжийн зориулалттай барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок халаалтын зуухны зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:



- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 4 давхар 1 блок эрдэс чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн зориулалттай барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок хийн хангамжийн зориулалттай барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок халаалтын зуухны зориулалттай барилга нийт 3 блок бүхий барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Тэсо Индастриал Парк ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 4 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок хийн хангамжийн зориулалттай барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок халаалтын зуухны зориулалттай барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



Нарийн бичгийн дарга: Захиалагч Тэсо Индастриал Парк ХХК-ийн Дэд захирал



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ТЭСО ИНДАСТРИАЛ
ПАРК ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 4 ДАВХАР 1БЛОК ЭРДЭС ЧУЛУУН
ХӨВӨНГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА, ЗООРЬГҮЙ 1 ДАВХАР 1 БЛОК ХИЙН
ХАНГАМЖИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГА, ЗООРЬГҮЙ 1 ДАВХАР 1БЛОК
ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ЗОРИУЛАЛТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 03 дугаар сарын 14

Улаанбаатар хот

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Тэсо Индастриал Парк ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 4 давхар 1 блок эрдэс чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок хийн хангамжийн зориулалттай барилга, зоорьгүй 1 давхар 1блок халаалтын зуухны барилга нийт 3 блок барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын талбай дээр 2025 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр 09:00 цагт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 10:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын р
Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн
хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Тэсо Индастриал Парк ХХК-ийн
Дэд захирал Ц.Алтаннавч
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт,
аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилга
техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Шинэжаргал
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн
стандартын хяналтын хэлтэс,
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК,
Техник хяналтын ахлах инженер Б.Дашдорж
6. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн
удирдлага төлөвлөлтийн газар, Дэд бүтэц
төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Уранчимэг
7. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Барилгын
зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа М.Батсайхан
8. Үндэсний Төв Архив, Зураг төслийн
баримтын архивч Э.Шижиртуяа
9. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын
материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн
мэргэжилтэн О.Ундрах
10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах
байгууллага, төлөөлөгч Б.Ганбаатар
11. Ашиглалт хариуцах байгууллага:

“Евро базальт” ХХК Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал	Ю.Гончигсумлаа
12. Зураг төсөл зохиогч байгууллага “Тэсо Пропертис” ХХК-ийн архитектор	Э.Цэдэнжав
13. Барилгын ажил гүйцэтгэгч “МГБИ” ХХК-ийн Дэд захирал	Ц.Балжинням

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 13
- Хүрэлцэн ирсэн – 13
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 13

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Тэсо Индастриал Парк ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 4 давхар 1блок эрдэс чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок хийн хангамжийн зориулалттай барилга, зоорьгүй 1 давхар 1блок халаалтын зуухны зориулалттай барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Шинэжаргал**

- Барилгад ашигласан материалын тохирлын гэрчилгээ, ил далд ажлын акт,улаан журнал, бетоны бат бэхийн шинжилгээний бичиг, БАЗГ үзүүлэх
- Зураг төсөл зохиогч зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг шинэчлэн баталгаажуулан илрүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн 14.3, 14.6 заалтын дагуу чанарын баталгаа ирүүлэх
- Дутуу ажлуудыг гүйцэтгэлийг фото зургаар ирүүлэх
- Барилгын зураг төсөл зохиогч өөрчлөлтэй холбоотой тайлбар ирүүлэх
- Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв:**

- Уурын зуухны ашиглалтын паспорт шалгуулах
- Зуухны өрөөний тоноглолд хаягжуулалт бүрэн хийх
- Зуухнаас гарах үнс хадгалах сав төлөвлөх
- Зуухны барилгын агаар сэлгэлт, ажилтанд зориулсан ариун цэврийн өрөөг ашиглалтад оруулах
- Нэвтрэх суваг руу орох хоогийг янзалж аюулгүй болгох
- Гадна эргэлтийн худаг 2 люк хийх
- Гадна дулааны шугамын өөрчлөлтийн зураг шалгуулах

- Даралтат /хий/ савны паспорт холбогдох бичиг баримт шалгуулах
 - Үйлдвэрийн барилгын агаар сэлгэлтийн дефлектор хийх. Усны нөөцийн саванд шатнууд хийх, тоног төхөөрөмжид хаягжуулалт, ашиглалтын заавар тухайн өрөөнд байршуулах
 - Гадна бохир усны цооног угсарсан ил, далд ажлын акт шалгуулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх ТӨХК Техник хяналтын ахлах инженер

Б.Дашдорж:

- Цахилгаан үүсгүүр, дизель генератор ашиглалт засварын төвд бүртгүүлэх
- Шийтнүүдэд хаяг, Брижүүлэх, Гарц орцын тэмдэглэгээ тавих
- Газардуулга хийсэн фото акт шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар, Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг**

- Ажлаа зургийн дагуу камер, зарлан мэдээлэх систем, галын дохиолоо суурилуулах
- Техникийн өрөөнд дэлгэц, микрофон суурилуулж үзүүлэх
- Суурилуулагдсан төхөөрөмжийг бүрэн ажиллагаанд оруулах
- Холбоо дохиоллын актуудыг гүйцэтгэж үзүүлэх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- Гал унтраах автомат төхөөрөмж, галын дотор усны даралтат цэгийг хэвийн ажиллагаанд оруулах
- Галын дохиолол мэдээлэгч хийх
- Барилгын гадна хананы дулаалгын материалын гал тэсвэржилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх
- Хий /газ/ буулгах талбайг засварлах
- Хийн хангамжийн зураг төслийн ХД-2 дугаар хуудсанд төлөвлөгдсөн галын дохиоллын станцыг хийх
- MNS5566:2020 стандартын дагуу гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжээр тоноглох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

Үндэсний Төв Архив, Зураг төслийн баримтын архивч **Э.Шижиртуяа**

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх
- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлд гүйцэтгэгч байгууллага баталгаа гаргах
- Архивд баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, баримт бичгийн хуудас дугаарлах дотоод товъёог үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

ТТ ШАЛГ
ГАЗАР

тууламжийг
руулах ком

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Тэнхлэг 20-ийн дагуух дээврийн усны хаялганы буултыг хийх
- Металл баганын суурийн анкерны далд ажлын акт фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Гадна хаяавч болон дутуу заслын ажлуудыг бүрэн дуусгах
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм, нормативын төлбөрийн тооцуулж төлөх төлбөрийг тооцуулж төлөх

Санал өгсөн үүрэг даалгавар биелэсэн тохиолдолд ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, төлөөлөл **Б.Ганбаатар**

- Ажилчдын ариун цэврийн өрөөний суултуур угаалтуур, босоо шээлтүүр, **АЛТЫН** шүршүүрийг БНБД 31-23-22
- Барилга байгууламжид ХБИ хүртээмжийг төлөвлөх стандартын шаардлагаг ашиглалт хангасан туслах тоноглолуудыг суурилуулах **ИСС**

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна

Ашиглалт хариуцах байгууллага Евро базальт ХХК Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал **Ю.Гончигсумлаа**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад өгөхөд татгалзах зүйл байхгүй

Захиалагч Тэсо Индастриал парк ХХК-н Дэд захирал **Ц.Алтаннавч**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах хүсэлтэй байна

Зураг төсөл зохиогч байгууллага Тэсо Пропертис ХХК-ийн архитектор **Э.Цэдэнжав**

- Галын дохиолол хийж дуусгах
- Тонгус байршуулж дуусгах
- Утаа зайлуулах салхивч
- Зарлан мэдээлэх, камер хийж дуусгах
- Нөөц зуухны тогоо тавих

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна

Барилгын ажил гүйцэтгэгч МГБИ ХХК Дэд захирал **Ц.Балжинням**

- Байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн:**

- Гүйцэтгэгч Барилгын тухай хуулийн дагуу чанарын баталгаа гаргаж ирүүлэх
- Гадна тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлыг оронхий толовлогооний дагуу хийх
- Авто зогоослын тэмдэг тэмдэглэгээг бүрэн хийх
- Зураг төсөл зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт шинэчилж ирүүлэх

- Уурын зуухны барилгын өөрчлөлтийн гүйцэтгэлийн зураг батлуулж ирүүлэх
- Уурын зууханд угаар мэдрэгч байршуулах
- Хот байгуулалт, стандартын газарт хүргүүлсэн албан тоотыг нөхөж үзүүлэх


Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Тэсо индастриал парк ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 4 давхар 1 блок эрдэс чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок хийн хангамжийн зориулалттай барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок халаалтын зуухны зориулалттай барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



(А.МӨНГӨН)

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

ЗАХИАЛАГЧ
ТЭСО ИНДАСТРИАЛ ПАРК ХХК-ИЙН
ДЭД ЗАХИРАЛ



(Ц.АЛТАННАВЧ)

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)





Байгууллага: Мэдэрлэн холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: А. Урианхай

*СХД 21-р хороо
МЭСО Илгээгчийн захирал нарх ахи
Ховалдагчид сэр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ажлаа дүргийн газрууд камер, зарим нэгэн хэ свентен, галын дохиолоо сүүргүүлэх.	1. Ажлаа дүргийн газрууд камер, зарим нэгэн хэ свентен, галын дохиолоо сүүргүүлсэн АТГО Зурнаар баталгаажуулна ирүүлсэн.
2. Техник өрсөл дээр, микрофон сүүргүүлэх.	2. Техникийн өрсөл дээр сүүргүүлсэн фето зурнаар баталгаажуулна ирүүлсэн.
3. Сүүргүүлсэн галын төхсөр хөшүүрэг арэн ажиллагааг сүүргүүлэх.	3. Сүүргүүлсэн галын төхсөр хөшүүрэг арэн ажиллагааг сүүргүүлсэн фето зурнаар баталгаажуулна ирүүлсэн.
4. Хөлөө дохиолон актуулогчийн тус чүүрүүлэх.	4. АТГО зурнаар дохим чүүрүүлсэн микрофон сүүргүүлсэн фето зурнаар ирүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар ... 813 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгоон амилтны гэрэн үеэг
Сүхба
2015 оны 04 сарын 14-ний өдөр

 <p>Космос-а гишүүдэд үүрэг даалгаварга биелэлтээр амжилттай ажил сэлснэ байна.</p>	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>И.Уралшия Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.14.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>И.Уралшия Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.14.</p>

Бүртгэлийн дугаар 815

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... 

2025 оны 03 сарын 14-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн: *Б. Цыбсайтар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Амьтдын эрүүл чэрхий эрхийг суутуур, уламжуур, тосон шитүүр шүршүүрт ШТЭ 31-23-22. барилга байгууламжийг ХТЦ зургаан жилийн туршид ашигласнаар шаардлага хангасан нусгал тогшилгуудыг суурьшуулна.</p>	<p><i>Төлөт Зургийг хэвсэргэв.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ... *813* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
200*15* онь ... сарын *14* -ний өдөр


--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025.03.14.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.01.

Бүртгэлийн дугаар ... 813

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг

..... *сугла*

2025 оны *апр* сарын *14* ний өдөр

Төсө ондоотривал ХХИ-н "Эрхэс агуулам хөвөнгийн
далдварийн барилга"

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: *В. Ойршуров*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Зурган зурхнаа <u>өөсгөл</u> төмн паспорт <u>шалгуулах</u>	2025.03.31-ний <u>NETEIP 25/016</u> тоот
2) Зурхнаа <u>эрхэний төмөр</u> - 1019 хаягшудлалт <u>бүрэн албан бичгээр баталсан</u> хийн,	<u>сарнаж өгөв.</u>
3) Зурхнаас <u>гаран үнэ</u> хадгалааг <u>сав тэвчлэх</u>	— // —
4) Зурхнаа <u>барилга</u> агаар сэлгээлт, <u>ажилтанг</u> зориулсаа, <u>эрчим өврийн</u> эрхээ <u>ашиглаатай</u> зурхна,	— // —
5) Нөвтрэн <u>сүвэггүүр</u> <u>эрх</u> хэсгийн <u>өлзөгч</u> <u>аюул</u> - <u>гүй болгоаг</u>	Биелсэн, <u>Фото Акт</u>
6) Тэгнэ <u>эрхэлтсийн</u> <u>хуудас</u> <u>2</u> <u>хууц</u> <u>хийн</u>	—
7) Тэгнэ <u>дугаанаа</u> <u>дугаан</u> - <u>ийн эрхэлтсийн</u> <u>зурга</u> <u>шалгуулах</u>	<u>Өөрчлөлтгүйн зурга</u> <u>шалгуулав.</u>
8) Дараатай (хий) <u>савнаа</u> паспорт <u>хөлдөгдөө</u> <u>дугаа</u> - <u>Нэгэж авах</u>	—


Бүртгэлийн дугаар 815
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Очир
 2025 оны сарын 14-ний өдөр


9) Үйлдвэрийн барилгын
 ажлаар сэлгэлтийн
 Директор хийж,
 10) Үснэ хөөсний саванд
 шатнууд хийж, тонног
 төхөөрөмжид хаягчид
 -1элт, амьсгалтвэл
 заавар тухайн эрхэнд
 байршдуулах,
 11) Тэдгээ дохир дэмэл
 өөмнөг дасарсан алданд
 ажилвэл хит алагуулах


- Дугаар дугаар
 хийгээгээр алтан тоот
 зардал /2025

- биеэсн

- хит шагуудуулах




Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Гамга, тэмдэг/
 З.Дарлуров / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Гамга, тэмдэг/
 З.Дарлуров / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.04.04

Бүртгэлийн дугаар ... 813 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчлөхтэй гарын үсэг
 Сугла
 2025 оны 04 сарын 14 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын

С.Н.Д.Р.Х.С.

Комиссын гишүүн: *Э. Манжиртүяа*

*Тус хуудас болон баримт
хуудас бүрэн хөвөнгийн
үзэгдэх.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Мэдэгд амьсан актын бүрт бүрдүүлэх.</i>	<i>1. Мэдэгд амьсан актын Бүрт бүрдүүлэн.</i>
<i>2. Барилга зэрэгтэй амьсан үйлчилгээний тайдгээнд үйлчилгээний байгууллага баталсан үзэг.</i>	<i>2. Барилга зэрэгтэй амьсан үйлчилгээний тайдгээнд үйлчилгээний байгууллагын баталсан Бүрт Бүрт, тийрдүүлэн.</i>
<i>3. Архивд баримт бичиг нэгдсэн өгөх нийтэн мессажтай зэрэг баримт бичгийн бүрт бүрдүүлэх, баримт бичгийн нэгдсэн дугаартай зэрэг төвөг үзэг.</i>	<i>3. Баримт Бүрт зэрэгт өдөр нийтэн мессажтай дугаар бүрт үзэг.</i>
<i>4. Баримт бичиг болон амьсан зэрэгтэй өдөр дугаартай зэрэг төвөг үзэг.</i>	<i>4. Өдөр дугаартай зэрэгтэй өдөр төвөг үзэг.</i>

Бүртгэлийн дугаар *813*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛВАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтны тухай үзэг
Сүхлэ
 2022 оны *04* сарын *14* -ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Энхтүлэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Энхтүлэ</i> гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.03.14</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Энхтүлэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Энхтүлэ</i> гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.04.03</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ... *813* ...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг

Энхтүлэ

2025 оны *04* сарын *14* ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)




Байгууллага: Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй гэмцэх хэлтсийн
Барилгын зураг төслийн хяналтын /ахлах/ байцаагч

Комиссын гишүүн: М. Батсайхан

*СХД-ийн 21-р хороо
Тэсо индустриал парк ХХК-
Бүтэц бүрэн хөвөнгийн үндэс
2025.03.14*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Төл үйлдвэрлэх автомат төхөөрөлт, голын дотор усны даралтат цэгийг хэвийн ажиллагаанд оруулах.	- Биелсэн
2. Төлөн дохиолол үзэгтэй хийх.	- Биелсэн
3. Барилгын ларга халсан дүрэмдээ материалчид цахилгаан тэвтрүүлэхийн дэргэ тэвтрүүлэхийн дүрэмт үзүүрч.	- Биелсэн
4. Хий (газ) бууцах тайвныг засварлах.	- 2025.03.27-ны өдрийн 25/сг дугаартай Тэсо индустриал парк ХХК-ийн албан ёсоор биелсэн.
5. Хийн халгалттайн зураг төслийн ХБ-2 дүгээр хуудсанд төлөв үзүүлэн голын дохиололын станцыг хийх.	- Биелсэн
6. MNS 3566:2020 стандартын дагуу гол үйлдвэрлэх алсан материал багатай гэвэл хэргээр тохиолдох.	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар ... 813 ...
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛВАР ҮНЭН** ...
Хуулбар өлгөсөн өмчийн гэрлийн үеэр
Сүхбаатар
200 15 ны 04 сарын 14-ний өдөр

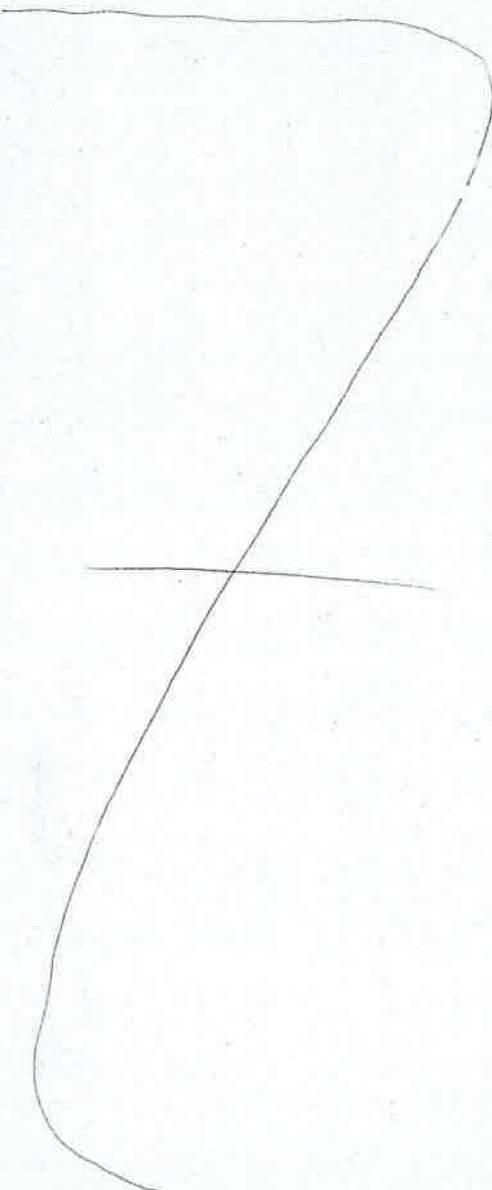	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>У. Батсайхан</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/  АХЛАХ БАЙЦААГУУЛГА</p> <p><i>У. Батсайхан</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.14</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биецэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>У. Батсайхан</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/  АХЛАХ БАЙЦААГУУЛГА</p> <p><i>У. Батсайхан</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.03</p>

Бүртгэлийн дугаар 813


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг

У. Батсайхан

2025 оны 04 сарын 14 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага:

ИГБИУХК

Комиссын гишүүн:

У. Балшикъяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Бабигон ажиллагаа ага санаагаар Бабигон</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар **813**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
 2025 оны *02* сарын *14* ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>[Signature]</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025/03/14</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>[Signature]</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025/04/03</p>

Бүртгэлийн дугаар 813

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН ...

Хуулбар олгосон аломтны гарын үсэг

[Signature]

2025 оны 04 сарын 14-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага:

Комиссын гишүүн: *Ю. Кожинсүмбэр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>КОМИС ТАНИМЛА ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БЭГДЭЛЭГЭЭР БАЙНГУУН АШИГЛАМЖИЙН ӨГӨХӨД ТАТГАЛЗАХ ЗҮҮЛ БАЙЖИЙ</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар ...*813*..
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхба
20*14* онь *09* сарын *14* -ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ю. Бадрагсүмбалаа</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Ю. Бадрагсүмбалаа</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ю. Бадрагсүмбалаа</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Ю. Бадрагсүмбалаа</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар ... *813* ...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН ...

Хуулбар өлгөсөн ажилтны гарын үсэг

Сүлэ

20*15* оны *сеп* сарын *14* ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс,
Барилгын техникийн улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: *Н. Шинэжаргал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын ашигласан Материалын тохиромж Горшгоо, ил гал ашигласан акт, улсын нурнаа, Бетон бай бэхийн шинжилгээний дүнг, БАЗГ үзүүлэх.	1. Ил гал ашигласан акт, улсын нурнаа хэлбэртэй бетон ба бэхийн нурнаа дахин шинжилгээний ордуудыг Нанзан илгээрийн ХХК-ийн 2025 оны 4 дугаар сарын 10-ийн оринд лабораторийн шинжилгээний дүнгээр баталгаажуулав.
2. Зурга тусга зохих зохиогчийн нэгдсэн дүнгийг шинжилгээний баталгаажуулан ирүүлэх.	2. Зурга тусга зохих нэгдсэн дүнгийг шинжилгээний баталгаажуулан ирүүлсэн.
3. БТХ-ийн 14.3, 14.6 зохиогчийн дагуу Улаанбаатар барилга ирүүлэх.	3. БТХ-ийн 14.3, 14.6 зохиогчийн дагуу Улаанбаатар барилга Зарим албан тооцог ирүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар 813.
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
2025 оны 04 сарын 19-ний өдөр

4. Дугуй амьгуурт үүсгэн
ФОТО зургаар ирүүлэх

5. Барилгын зурга тасал
зохиод өөрчлөлтэй
холбоотой талбар
ирүүлэх.

Тийрэгтэй өсөн чурт
дөтөврийн өсөлтийг
хатуулах.

4. Дугуй амьгуур болж
Тогосон барилгын фотозур
ганаар зургаар
ирүүлсэн.

5. Зурга тасал зохиод
өөрчлөлтэй холбоотой
Тогруулаа сайн
байгааг ирүүлсэн.

Өсөн чурт дөтөвөр
өсөлт.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Б.Т.Х.У. Банцурс

Гарын үсэг:

/Гамга, тэмдэг/

Б.Шинэжаргал Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Б.Т.Х.У.Б.

Гарын үсэг:

/Гамга, тэмдэг/

Б.Шинэжаргал Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.11

Бүртгэлийн дугаар ... 813
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН --
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
2025 оны ... сарын ... ний өдөр

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага, Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Комиссын дарга: А Мөнгөн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гүйцэтгэгч БТК-и Аугуу санаром БЭТАЛГАД ГАРГАЖ ИРҮҮЛЭХ.	МОНГОЛЫН ГОЛДОН БРИДЖИ ИНТЕРНЭЙШИЛ КХК 2025.03.24 25/21 ТРИСТОП 4/БЭТАЛГАД ИРҮҮЛЭВ.
2. РАДНА ТУХИЦНАТ, НЭГЭМ БАЙГУУЛАМЖИЙН АНХЫГ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ АУГУУ ХАИХ.	ТЕСО ИНДУСТРИАЛ ПАРК ХУК 2025.04.02 025/016 ТРИСТОП БЭТАЛГАД ИРҮҮЛЭВ.
3. АВТО ЗОТООЛЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГХАРАА БҮРЭН ХИЙХ.	"
4. Зураг төсөл зохиогчийн хэдсэн дүрмэт шилжүүлэн ирүүлэх	2025.03.24-ийг өдрийн зохиогчийн хэдсэн дүрмэт шилжүүлэн ирүүлэв.
5. Зурын зуухны барилгын өөрчлөлтийн гүйцэтгэлийн зураг байгууллыг ирүүлэх	

Бүртгэлийн дугаар ... 813
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
...
2025 оны 03 сарын 24 ний өдөр

- Уурьд зүүхэн 9 урсаг
мэдүүл байрлуулах

- ЗХРАТ АРХИВ.
2025.03.15 - 2025.03.20
ХИВ.

1. 10Т БЭН ГЭЖИЛТ,
Стандартын газарт
хурцлын өлбөг.
Робот мөхөөр
сүүдэж,
Мөн түүрхтэй
архив.

- 10Т БАЙГУУЛАГТ, КОТДИ
СТАНДАРТЫН ГАЗАРТ
ХИРГИВЛСЭН ЗУ
ХИ СЭХТ ҮЗВЭЛЭВ.
2024.09.25 ТИР 24/13,
2024.10.15 ТИР 24/18,
2024.10.31 ТИР 24/22.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

(Тамга тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 03 сарын 14 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:


(Тамга тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 04 сарын 14 өдөр

Бүртгэлийн дугаар 813
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 14 ний өдөр

25/218



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)




Зураг төсөл зохиогч байгууллага:

Комиссын гишүүн: Э. Цэцэгшав

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Үзвэл дохиолох хийж дуусгах	- Дүүссэн
- Төмгөр байрлуулах дуусгах	- Дүүссэн.
- Утас зайлуулах салхивч	- Хийсэн
- Зарлиг нэгдэл, камер хийж дуусгах	- Дүүссэн
Бусад зүйл	
- Ноогц дууриар тусга тавих	- Анхны бичлээр хийгдсэн
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашигласнаар авар амалтай байна.	Үүрэг даалгаврын биелэлт болсон.

Бүртгэлийн дугаар 813
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2025 оны 09 сарын 14 ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Э.Цэрэншав</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.14</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p><i>Э.Цэрэншав</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.04</p>

Бүртгэлийн дугаар 813 ..

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН ..

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүхбаатар

2025 оны 04 сарын 14 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Вихимал*

Комиссын гишүүн: *У. Тугайнаев*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр оруулах ажиллагаа байна.</i>	<i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгавар биелүүлсэн оруулах ажиллагаа байна.</i>

Бүртгэлийн дугаар *813*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ..
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
Огула
.....
15.04 оны сарын *14* ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

У. Анхсүх

/Тамга, тэмдэг/

У. Анхсүх

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.03.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

У. Анхсүх


/Тамга, тэмдэг/

У. Анхсүх

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.04.04



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчингэй)

Байгууллага: *УБ УТС*

Комиссын гишүүн: *Б. Дамсдорж*

*ХА-21-р хороо тус
ширээтний хэргийн
хэлтэст оруулах.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Үндэсний төв архив дээрх төлөвлөгөө хэрэгт шилжүүлж өгөх төв зорилго.</i>	<i>1. Өвгө хороо хэлтэст шилжүүлж өгсөн.</i>
<i>2. Үндэсний төв архив дээрх төлөвлөгөө хэрэгт, тэрч орчуулж тэмдэглэж өгөх</i>	<i>2. Төлөвлөгөөг өвгө шилжүүлж өгсөн.</i>
<i>3. Төлөвлөгөөг өвгө шилжүүлж өгөх.</i>	<i>3. Өвгө хороо шилжүүлж өгсөн.</i>



Бүртгэлийн дугаар ... *813* ...
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН** ...
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
Сүхбаатар
2005 оны *09* сарын *14* ний өдөр

8

Саван!

Хүрээ газар тариалан
Бүтэцтэй ажлын байр
0202.

Үүрэг даалгавар өгсөн: ХВ үдс тэхк

Гарын үсэг: *Сүрэгт*
/Тамга, тэмдэг/

Б. Доржсүрэн /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008. 07. 14.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Сүрэгт*
/Тамга, тэмдэг/

Б. Доржсүрэн /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008. 07. 27

Бүртгэлийн дугаар ... 813 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүрэгт
2008 оны 07 сарын 14 ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

"МТБЦ" ХХК

Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: *У. Чигрэх*

*Чиглэвэрийн барилга
Континентальн дүрэг, 2-р хороо*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Тэнхлэг 20-ийн дагуу гээврийн усны хаялганы бүтцийг хийх</i>	<i>- Тэнхлэг 20-ийн дагуу гээврийн усны хаялганы бүтцийг хийн фото зургаар үзүүлэв.</i>
<i>2. Металл баганын суурьтай анкерны галз ангийн ИКТ фото зураг төхөөрч үзүүлэх</i>	<i>- Баганын суурьтай анкерны галз ангийн ИКТ, фото зураг төхөөрч үзүүлэв.</i>
<i>3. Галз хөдөлгөөн тооцогчийн засалтын анжиргааг зураг дүрсэлж</i>	<i>- 2025-03-27-ны 25/007-ны албан тоот төсөлгөөр үзүүлэв.</i>
<i>4. Барилгын тухай хурлын Б.Х.Б. засны галз норм, нормативын төсөлгөөр төлөв.</i>	<i>- Норм, нормативын төсөлгөөр төлөв.</i>

Бүртгэлийн дугаар 813 ...
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛВАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
2025 оны *Фев* сарын *14* ний өдөр

<p>Төлбөрсийг отолх</p> <p>Төсвийн</p>	
<p>Сачал. Огоч үүрэг даалгавар биелсэн</p> <p>Төхөөрөлдө ашигтай судуудыг сахнагчид</p> <p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>МОНГОЛ 19-405 АТХЭТН Тамга, тэмдэг УНДРАХ МОНГОЛ СЭН АРХИТЭГ Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-03-14</p>	<p>- Биелсэн</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-03-31</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 813 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
 Хуулбар олгосон өжилтны гарын үсэг
[Signature]
 2025 оны ... сарын 14 -ний өдөр
