

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 05 сарын 14-ны өдөр

Дугаар БА-135/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар, 1 блок, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2022 оны 2 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1 Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2023/07/07 огноо, 0013152 дугаар, БАГ32023/446
- 2.2 Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар Шифр: ТГ-22/02
- 2.3 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9011122089 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2659603 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 23 дугаар хороо, Наадамчдын гудамж, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын цогцолбор барилга Б блок, 11-327199 холбоо барих утас, www.ulaanbaatar.mn цахим шуудангийн хаяг.улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2659603 регистрийн дугаар, Хаяг:
- 2.4 Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Элсэн морьт” ХХК оноосон нэр, 511001020 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2024842 регистрийн дугаар, БУ48-1263/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Монгол улс, Говь алтай аймаг Хөхморьт, 1 баг, Цоохор Утас 88118689
- 2.5 Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.
- 2.6 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Төгс Гранд Констракшн ХХК оноосон нэр, 9011113047 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 663791 регистрийн дугаар, 3Т17-114/21 зураг төслийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: БЗД, 1-р хороо, 12-р хороолол, токиогийн гудамж 95, Оффисын барилга, 3 давхарт
- 2.7 Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгийн газар нэр, 9070003041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9077065 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хороо, багшийн хөгжлийн ордон, 70113039 холбоо барих утас;

2.8 Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар, 1 блок, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилга байгууламжид түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.


3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 4 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга



байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар, 1 блок, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо,
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай,
зоорьгүй 2 давхар, 1 блок, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга

ДЭГНЭЛТИЙН
АШИГЛАЛТАНД
ОМИСС

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)
8314551 8314551
8314551 8314551

Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
ОНӨААТҮГ-ын Барилга захиалагчийн
хэлтсийн дарга



Нийслэлийн Хөрөнгө
Оруулалтын газар
5369622
(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



МЭДЭЭЛЛИЙН САНАА БҮЛЭГ
Объект: 05 762 09
Огноо: 05 762 09
Бүртгэсэн: О. Мунуу
УЛААНБААТАР ХОТ ТИВ 10114

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 2 ДАВХАР, 1
БЛОК, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 10 дугаар сарын 17

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар, 1 блок, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2024 оны 10 дугаар сарын 08 -ний өдөр 13:00 цагт 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 15:00 цагт дуусав.

Хуралд:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн дарга | О.Оджаргал |
| 2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын, Төвийн бүсийн ахлах инженер | Б.Намсрайжав
Г.Батбаатар |
| 3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч | З.Очирпүрэв |
| 4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч | Б.Цэрэннадмид |
| 5. Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ий техник хяналтын инженер | Н.Даваадэмид |
| 6. Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨХК-ий Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн | Д.Болормаа |
| 7. Ус сувагийн удирдах газар менежер | Б.Даваасүрэн |
| 8. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, хошууч | Э.Шижиртуяа |
| 9. Үндэсний төв архивын газар, зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч | О.Ундрах |
| 10. Барилга хөгжлийн төвийн Норм нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн | Б.Ганзориг |
| 11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага | Ч.Мөнхгэрэл |
| 12. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгийн газар мэргэжилтэн | П.Ундармаа |
| 13. Зураг төсөл гүйцэтгэгч байгууллага Төгс гранд констракшн | С.Ширбазар |
| 14. Гүйцэтгэгч байгууллага: “Элсэн морьт” ХХК-ийн захирал | |

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 14
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 14

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар, 1 блок, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга, Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч

Г.Батбаатар

- Барилгад хэрэглэсэн бетоны шинжилгээг үе шат бүрээр нь үзүүлэх
- Барилгад хэрэглэсэн арматур шинжилгээг үзүүлэх
- Барилгад хэрэглэсэн цонх хаалга хулдаас тохирлын гэрчилгээ сертификатыг /Монгол хэлээр/
- Гадна тохижилт ногоон байгууламжийг зураг төсөлд заасны дагуу дуусгах
- Гадна хаяавчны бетоныг нэмж гүйцэтгэх
- Дээврийн ил далд ажлын акт үзүүлэх.

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв:**

- Узелийн өрөөний тоног төхөөрөмжийн хаягжуулж цахилгааны 4ш бойлуурын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг бойлууран дээр байршуулах, цэвэрлэгээ хийх
- Халаалтын коллектерт хайрцаг хийж хаягжуулалт хийх
- 2-р давхрын ариун цэврийн өрөөний бохир усны шугамд хаалт хийх
- Дээвэр дээрх үнэр гаргагчийг дулаалах шатны засал дуусгах
- Гадна шугам мэдээллийн санд оруулах ундны ус шинжилгээнд хамруулах
- Эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчаар дүгнэлт гаргуулах
- Гадна цэвэр бохир дотор сангийн угсралт ил далд ажлын актууд шалгуулах
- Сангийн угсралтад хэрэглэсэн материалын сертификат шалгуулах
- Эрэгтэй 00-ын тоноглол бүрэн угсрах

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ий техник хяналтын инженер **Б.Цэрэннадмид:**

- Ерөнхий шидний өрөөний хүрээ газардуулгыг гүйцэт хийх
- Ерөнхий оролтын самбар , Хүчний оамбаруудад хаяг бисрк охсм байршуулах
- Аянгын буултын газардуулга эсэргүүцэл хэмжүүлсэн протокол шалгуулах
- Гадна ЦДХШ-г оруулсан акт шалгуулах

- Ерөнхий шидний өрөөний хаалганд хаягжуулах, тоноглолын шороо тоос цэвэрлэх.

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨХК-ий Удирдлага төлөвлөлтийн газрын дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид**

- Гадна холбооны акт шалгуулах
- Холбооны техникийн өрөөн гаргаагүй Зураг гүйцэтгэгч тайлбар бичиг өгөх
- Худаг доторх консул кранштейн суурилуулах, хоолойг тайрах
- Зарлан мэдээлэх ажилд бүрэн оруулах.

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Ус сувагийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **Болормаа**

- БУЯ-2 өндөрлөх
- БУЯ-ийн шугамын уналтын отвьд бэхлэх
- Худгуудын таг битүүмж сайжруулах шатыг хананд бэхлэн тогтоох
- Узельд Цэвэр усны шугамд монометр суурилуулах
- Цэвэр уснаас дээж авч шинжилгээ өгч дүгнэлт гаргуулах
- Бохир усны шугам угсралтын далд ажлын акт баталгаажуулах
- УСУГ-тай үндсэн гэрээ байгуулах
- Тойрох шугамын юүлэх сосонк таслах.

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, хошууч **Б.Даваасүрэн:**

- Гадна дулаалгын дүгнэлт үзүүлэх гадна ил далд ажлын акт фото зураг хавсаргах
- Дотуур галын гидратын хомут хошуу солих
- Галын хор байршуулах
- Цахилгаан шийтийн өрөөнд бие даасан автомат гал унтраах модулийн систем төлөвлөх
- Галын дохиоллын систем шалгасан акт фото зураг хавсаргах
- Дээврийн ажлын ил далд ажлын акт үзүүлэх
- Аваарын шатны хийцлэлийн зураг тайлбарлах.

Архивын ерөнхий газар, ахлах архивч **Э.Шижиртуяа:**

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх
- Архивд баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрдүүлэх, хуудас дугаарлах, дотоод товъёг үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэж өгөх.

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Барилга хөгжлийн төвийн Норм нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- 3 мертрээс дээш өндөртэй дотор өрлөгөн ханын хучилтын бэхэлгээ хийсэн акт фото зураг нөхөж үзүүлэх

ХЯНАЛТ Ш
ГАЗ
га байгуулам
оруулах

- Төв хаалга болон аваарын хаалганы татуурга тоноглолыг хийх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу Норм нормативын төлбөрийг гэрээний дүнгийн дагуу төлөх

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага: **Б.Ганзориг**

- Гадна зогсоолд хөгжлийн бэрхшээлтэй авто зогсоол тэмдэглэгээ хийх 6*4,5
- 1 давхарын ариун цэврийн өрөөнд байрлуулсан тоноглолын талбайн хэмжээ том ариун цэврийн өрөөнд шилжүүлэх.

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна

Ашиглалт хариуцах байгууллага Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгийн газар мэргэжилтэн **Ч.Мөнхгэрэл**

- Гадна тохижилтын ажлыг хийж дуусгах ногоон байгууламж
- Комиссийн гишүүдийн үүрэг даалгаврыг биелэлтийг хангуулах байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна
- Барилгын материалын 1 хувийг Засаг даргын тамгийн газарт хүлээлгэж өгөх
- Цахилгаан усны гэрээ хийж код авах төлбөр тооцоог бүрэн барагдуулсны дараа ирж Засаг даргын тамгийн газарт шилжүүлж өгөх
- Баталгаат хугацаанд гарсан эвдрэл гэмтэл засварлах шаардлагатай ажлуудыг хийж өгч байх
- Шороон хэсгийн тохижилт янзлуулах.

Зураг төсөл гүйцэтгэгч байгууллага Төгс Гранд Констракшн **П.Ундармаа**

- 1-р давхарын 13, 14 дугаартай өрөөннүүдийн шилэн хаалганы дээр байрлах шилэн гэгээвчийг хийж гүйцэтгэх
- Халаалтын коллектерийн хайрцагыг хийж гүйцэтгэх
- Гадна талбайд зүлэгжүүлэлт хийх сандал хогийн савзэргийг байршуулах
- 1-р давхарын эрэгтэй нүйлын ариун цэврийн тоноглолыг суурилуулж суултуурын хэсэгт зураг төсөлд заасны дагуу хавтангаар хаалт угсрах

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага” Элсэн морьт” ХХК захирал **С.Ширбазар**

- Комиссийн гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ, Төвийн бүсийн ахлах инженер: **Б.Намсрайжав**

- Гадна хаяавчны хөлдсөн бетон дахин цутгах
- Тохижилтыг ажлын дагуу гүйцэтгэж хийх

- Зогсоолын баруун талын хэсгийн баруун талаар ус зайлуулах сувагчлал хийх
- Бичиг баримтны бүрдлийг хангуулах.

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн дарга **О.Оджагал**

- БТХ-ийн 14.3, 14.6 заалтын дагуу барилгад чанарын баталгаа гаргаж албан бичгээр ирүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу баригад чанарын баталгаа ирүүлэх
- Батлагдсан зураг төслийн дагуу гадна тохижилт хийх
- Гадна орчмын аюулгүй байдлыг хангуулах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:


Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар, 1 блок, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ, Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга

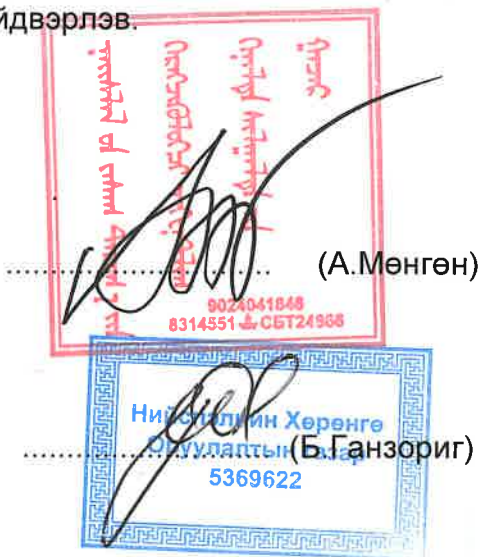

25/215

199, 8-р хороо, 4101-ийн захиралтай,
Архивийн Зүүн-Мэргэйн ТӨВ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавералт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар. Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн дарга

Комиссын дарга: О.Оджаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) ДТХ 11-01-16 дугуй зөвшөөрлийн гүйцэтгэл.	Зөвшөөрлийн ингэсн гүйцэтгэл сүлжээ.
2) ДТХ тус дугуй зөвшөөрлийн зөвшөөрлийн гүйцэтгэл.	2025.04.09 01/10 ТӨВ чамарын Ашигласан үржүүл.
3) Барилга АТХ тус дугуй зөвшөөрлийн гүйцэтгэл.	Зөвшөөрлийн сүлжээ.
4) ДТХ тус дугуй зөвшөөрлийн зөвшөөрлийн гүйцэтгэл.	Зөвшөөрлийн сүлжээ.

Бүртгэлийн дугаар 779

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН ...

Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
..... Сүлба

2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр

ХНД, 8-р хороо, АХФ-ын захиралын,
Ахуйн зуурын үндэсний архив

	<p>① 2025.02.26 2/1048 дугаартай Эрх зүйн үндэсний архив Төрийн баримт бичгийн дэргэц Д.Оджаргалын хуучинтай зургаан ② Мөн дүүргийн хөдөлгөөн орчуулсан хөдөлгөөн баримт бичгийн үндэсний архив</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ /О.Оджаргал/ Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024. 10. 07.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ /О.Оджаргал/ Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 04. 10</p>

Бүртгэлийн дугаар 779
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг
2025 оны 04 сарын 10-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЧД Б-р хороо өрхийн эрүү (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Монголын Төв Зарвар Засаггүй "Часар"


Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: Г. Батбоатар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Барилгау ажлынхан бичгийн шалгалтад үе шат бүрээр үзүүлэх	Биелэв
2) Барилгау ажлынхан Архивээр шалгалтад үзүүлэх	Биелэв
3) Барилгау ажлынхан эванд хяналт, аюулгүйн Тохирлын заримат сертификатыг үзүүлэх (мөнгө ахуй)	Биелэв
4) Газра төлөмт ногоон байгууламжийг ЗТ тусгаарлан зарцуулах үүрэг	Биелэв
5) Газра хяналтын бичгийг эванд тусгаарлах	Биелэв
6) Зарварын шалгалтын акт үзүүлэх	Биелэв

Бүртгэлийн дугаар 779
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2020.09.10-ний өдөр

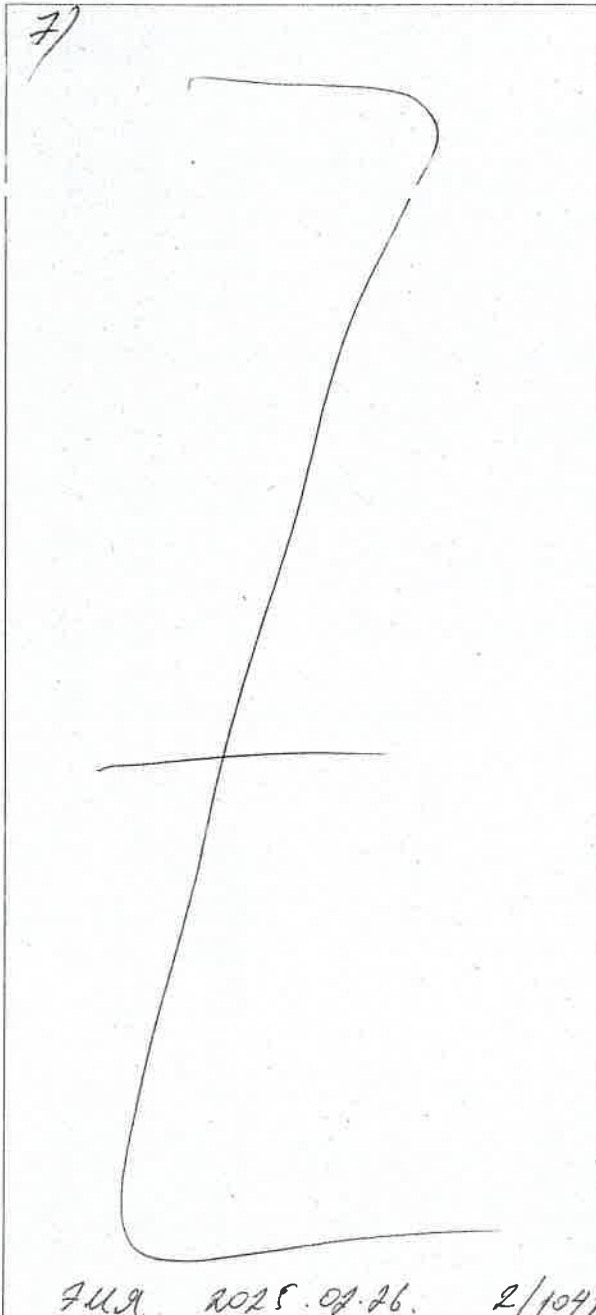

7/ 7ИЯ 2025.04.26. 2/1048

Үүрэг даалгавар өгсөн: БТХ ҮАБ

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Улсын Ахлах /Г.Балбоагын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Улсын Ахлах /Г.Балбоагын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.10.

Бүртгэлийн дугаар 729
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын ... 10 дий өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар , **ДБСХХ, ХХУАБ**

Комиссын гишүүн: **З. Очирпүрэв**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1) Үзлийн өрөөнийг тэнгэ тэсвэрлэлийн хаягч дуураг, хаягч дуураг Нш байгууран агуулах өмчлөгөөсөө зөв баримтааг байгууран дээр байршудаа хянаж хийж.</p>	<p>- Биелсэн</p> 
<p>2) Хаягч дуурагт хаягч дуураг хийж хаягч дуураг тавих.</p>	<p>- Биелсэн.</p>
<p>3) 2-р даваарын сүлд зургийн өрөөнийг дохиу үеийг хянаж хийж.</p>	<p>- Биелсэн Фото зураг авч үзжээ.</p>
<p>4) Дээр дээрх үнэр гаргалуудыг дуурааг шатны зөвөлгөөгөө,</p>	<p>- Биелсэн Фото зураг</p>
<p>5) Гадна шураа мэдээллийг сонг оруулах үндэс дэс үнэмлэхтэйг хянаж үнэр гаргалуудыг хянаж хийж.</p>	<p>- 2025.01.06 10-15.02/059/05 ЗГГААРТАЙ Г/Б ДҮГНЭЛТ</p>

Хаягч дуураг

Бүртгэлийн дугаар **779**

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН ...

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... **Очирпүрэв**

2025 оны 04 сарын 16 нын өдөр

6) Гадна хэлээр, дохор дотор сангийн дэсралт үз, дунд амьтны үйлдлийн шалцуулаа.

ХИТ шалцуулав.


7) Сангийн дэсралтад харгалзан материалын есгэрэлт шалцуулаа.

Биехэн фото зураг

8) Звятга 00-ын тоногдол бэрэн дээрээ.

Биехэн фото ХИТ

Handwritten signature or mark.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Handwritten signature of Z. Varg.

/Тамга, тэмдэг

З.Варг Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.10.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Handwritten signature of Z. Varg.

/Тамга, тэмдэг

З.Варг Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.02.27

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮГЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн:


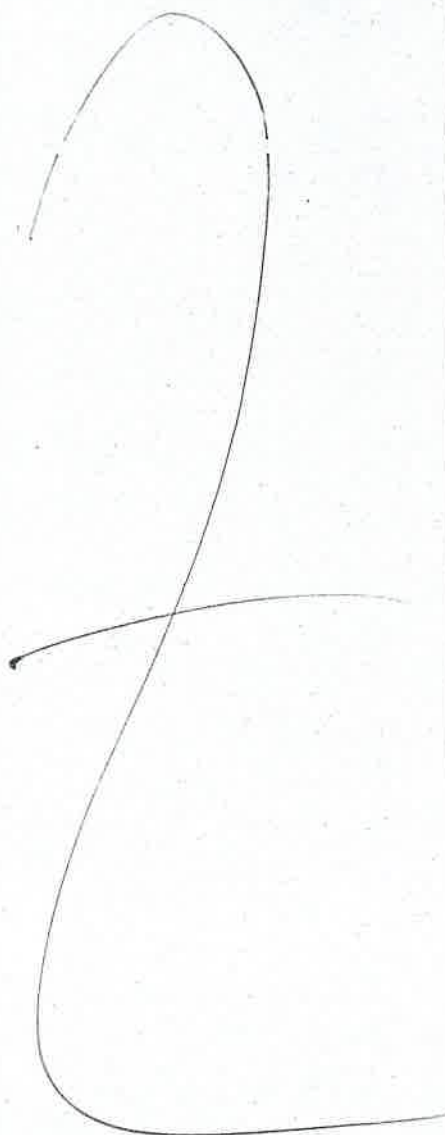


С. Нарангын

2008.07.10
Улаанбаатар
ТӨХК

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ерөнхий шийдэмгий гэрээний хэлтэс	1. Дүрээ гэрээний хэлтэс
2. ЭДС, ХС-үүдийн хэлтэс	2. Хэлтэс бүтээгдсэн хэмээн багцлагдсан
3. Ажилын бүтээгдсэн гэрээний хэлтэс	3. Гэрээний хэлтэс бүтээгдсэн хэмээн багцлагдсан
4. Гэрээний хэлтэс-г НМС-д оруулсан хэлтэс	4. НМС-д оруулсан хэлтэс
5. Ерөнхий шийдэмгий гэрээний хэлтэс, цахилгаан хэрэг, цахилгаан хэрэгтэй тус тус хавсаргасан	5. Ерөнхий шийдэмгий гэрээний хэлтэс, цахилгаан хэрэг, цахилгаан хэрэгтэй тус тус хавсаргасан

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 779
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 *сүлэ*
 2008 оны *август* 10 ний өдөр

 <p>Салбар: Чухан даалгаврын Биелэлтэй байдал Ашигтай ажлын</p>	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Д. Цорингийн / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.10.07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ Д. Цорингийн / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.12.04</p>

Бүртгэлийн дугаар 779
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
.....
2024 оны 12 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)





Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

- ХЧД, 8-р хороо

Комиссын гишүүн: *Н. Давсодорж*

- НХӨГ
- Архийн элчлэл

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Гадна холбооны акт бичиг баримт бүрдүүлэх үүрэг.	1) Үүрэг даалгаврын биелэлтийн фото зураг болон биеер олт үзэн шалтгаан авав.
2) Холбооны техникийн өрөө гартамжийг зураг гүйцэтгэлтэй тайлбар бичиг өгөс.	2) Акт бичиг баримтын бүрдүүлэлт өгөв.
3) Лудан доторх болон кронштейн сууршгуулах, хоолойн тасрал.	
4) Зарлан мэдээлэл өгөх үүрэг бүрэн орооно.	
<p style="font-size: 4em; text-align: center;">f</p>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>779</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>сүхсэ</i></p> <p>200<i>8</i> оны <i>04</i> сарын <i>10</i> ний өдөр</p> </div>

	
<p>Чүрэг даалгаврын биеллээр</p>	<p>Чүрэг даалгаврын биелсэн гэт чүрэг.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>ИХС" ТӨХК</i></p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>А. Давсодорж</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2024-10-07</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: <i>ИХС ТӨХ</i></p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>А. Давсодорж</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025/02/21</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *779*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Сүлбэ*

2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)





*ХУА 2-р хороо
архивын зөвхөн
мөнгөний төвшин
барилга.*

Байгууллага: Ус сувгийн удирдах газар

Комиссын гишүүн: *Х. Болорсаяа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. - ХУА-2 - ондорлох - ХУА-н шугамын уналтын өмнө бэлтгэ - худалдсан тал дистрийн сайжруулах. шатаа хангалу бэлтгэ тэгтгэх.</p>	<p>1. <i>01/64 төст хугацаатай баталгаа албан дугаар авав.</i></p>
<p>2. <i>Ууцны ХУ-н шугамын менежер сургуулиуулах.</i></p>	<p>2. <i>(хөдөлмөр үзүүлжээ)</i></p>
<p>3. <i>ХУА-с гэрээ авч менежерийг өгөх дүрмийн гаргуулах.</i></p>	<p>3. <i>Гүйцэтгэсэн.</i></p>
<p>4. <i>ХУ-н шугам - үсрэлтийн дагуу ажлын акт баталгаажуулах.</i></p>	<p>4. <i>Гүйцэтгэсэн.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *979*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ..
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Орүүл
 2025 оны 04 сарын 10 нөдөр

<p>5. Цэцэг-тасар үндсэндээ 1977 оагт агуулах.</p> <p>6. Өвөрхангай мужийн Юртайл засаг тасаах.</p> 	<p>5. Өвөрхангай</p> <p>6. Өвөрхангай</p> 
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>И. Өвөрхангай Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.10.07.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>И. Өвөрхангай Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.11.06.</p>

Бүртгэлийн дугаар 779

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... Сүлэ

2024 оны 11 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зург төслийн хяналтын /ахлах/ байцаагч

Комиссын гишүүн: *Б. Давдсүрэн*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Хүнд 2-р хэсэг Архив материал хэргийн ӨТМТ-ын баримт</p>	
<p>Барилга дэвсгэлийн зургийг үзүүлж, барилга нь барилд Амгийн фото зургаа ХАБС-аар авах</p>	✓
<p>Датвар хараагчид Урсгал үзэг хараагчид тэдгээ хочуулж, селлах, төлөвдөгөөр харах</p>	✓
<p>Цахилгаан цахилгаан систем Где барилга барилдсан үед Эхлэхэд мэдээлэл систем төвөрхөх</p>	✓
<p>Барилга зургааг анхны цахилгаан барилга зургааг зөвшөөрөх MNS 5566: 2010 стандартын дагууль барилга зургааг</p>	✓
<p>Барилга зургааг анхны цахилгаан барилга зургааг зөвшөөрөх МНС 5566: 2010 стандартын дагууль барилга зургааг</p>	✓

Бүртгэлийн дугаар *779*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
 200*2* оны *11* сарын *10* өдөр


Борлогын уяат батлагдсан
Зургийн дагуу хэсэг



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



/Х.Т. Дорноо/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


/Х.Т. Дорноо/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.02

Бүртгэлийн дугаар 779
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

"Элсэн мөрөн ХХК"



Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах, Норм нормативын саңгийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Архивын эрүүл мэндийн төвшин барилга / Хан Уул дунд, 8-р хороо

Комиссын гишүүн: *О. Ундрах*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. 3 метрээг дотроо өндөр тээг дотор орлогон ханын хушлагын бэхлэлтээ хийсэн эхтэ, фото зураг нөхөн үзүүлэх.</p>	<p>— Орлогийн бэхлэлтээ хийсэн нт фото зураг нөхөн үзүүлэв.</p>
<p>2. Төв хаалга болон аваарын хаалганы татцурга төсөглөлийг хийх.</p>	<p>— Хаалганы татцурга хийн фото зурагаар үзүүлэв.</p>
<p>3. Барилгын тухай хурлын дагуу норм, нормативын төлбөрийг гэрээний дүнгийн дагуу төлөх.</p>	<p>— Норм, нормативын төлбөр ийт төлнэ барилгын хавсардав.</p>

Бүртгэлийн дугаар 279
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ..
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 *Сүх*
 2005 оны 04 сарын 10 ний өдөр

<p>Сэнхал: Өгсөн үүрэг даалгавар биелэсэн технологууд ашигтайгаар орчуулах санхалтай.</p>	<p>- Өгсөн үүрэг даалгавар биелэсэн болно.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  МОНГОЛ УЛС Оюунтөрийн УНДРАХ /Тамга, тэмдэглэн АРХИТЕКТОР МА-БЯ 2023-2026 / О. Юундах / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024-10-07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт илалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / О. Юундах / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024-11-05.</p>

Бүртгэлийн дугаар 779
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2024 оны 04 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн: *Б. Танзориг*

*Хол үүрэг - Эрх зорилго
Эрхийн эрүүл мэнд
ТӨВ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1) Тагна зогсоолд Хол тиймийн бэрхшээлтэй авто зогсоолын тэмдэг- лэгд хийх (6.4.5) Бала үүрэг хийгээтэй 2. Их давсаран ариун цэврийн өрөөн байрзүүлсэн тоноглогын талбайн хийгээтэй том ариун цэврийн өрөөн шилжүүлж</i></p>	<div data-bbox="885 1680 1492 2004" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>779</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>Сүхсэ</i> 200<i>7</i> оны 0<i>6</i> сарын 10-ний өдөр</p> </div>

 <p>Чүрэг доошговарын Биелэлтээр ажиллалтаагу авар саналтай байна</p>	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Тамгори</i> /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.10.07</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар *779*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *Сүхба* ..
200 *26* ны *04* сарын *10* ны өдөр

<p>Морсан ажлын Төлөөлөгч 1. 2024. 10.07 2. 2024. 12.04</p>	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Ч.Монгол</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Ч.Монгол</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024. 10.07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Ч.Монгол</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Ч.Монгол</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024. 12.04</p>

Бүртгэлийн дугаар 779
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Ч.Монгол
 2024 оны 04 сарын 10

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: *Төс үрчилж хийсн орчим ХХК*

Комиссын гишүүн: *П. Умармаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. 1р давхрын 13, 14 дугаар тасал ороонцуг-н шилэн хаслагыг доор брлах шилэн сөгсөвч-н хийжгэ мбисотгох.</p>	
<p>2. Малаатомон коллекторын хайрмал-н хийжгэ мбисотгох.</p>	
<p>3. Тэгнэ д талбайг дунткеруулам, шийжгэ, сандга өсөл-н сав үүрэг-н брлуулах.</p>	
<p>4. 1р давхрын өрөмтөө 00-н тал АЗ-н тоноглолоси суурь-мүүжгэ, н суурьтүүрт хөөсгт суурал төсөл-н дагуу хавтангаар хайлт үсрэх.</p>	<p><i>Биедсэн.</i></p>
<p>5. Комиссын гишүүд-н үүрэг даалгаврын биелэлт-н үндэслэн үсвэн тооцолот хуульчлан өгөхөг тал барилгогч бтлөгч ашигчлан танд авох соналтад брла.</p>	

Бүртгэлийн дугаар *779*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүржа

200 *15* ны *04* арын *10* ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>С. Цугармаа</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>С. Цугармаа</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024. 10.07.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>С. Цугармаа</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>С. Цугармаа</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар *279*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *С. Цугармаа*
2024 оны 10 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: *ТЭМ* *МОН* *ХХК*

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгаварт биелүүлж, хүлээлгэн өгөх санхүүг б/на.</i></p>	<div data-bbox="845 1657 1444 1982" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>219</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН ...</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>Согол</i></p> <p>200<i>8</i> оны <i>11</i> сарын <i>10</i> өдөр</p> </div>

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>Ш.сүрд</i></p> <p>/Гарын үсгийн тайлал/ <i>Ш.сүрд</i></p> <p>Огноо: <i>2024.10.07</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ш.сүрд</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>Ш.сүрд</i></p> <p>/Гарын үсгийн тайлал/ <i>Ш.сүрд</i></p> <p>Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар *779*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүлд

200...ны 04 сарын ... 10-ий өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Захиалагч байгууллагын төлөөлөл: *НХДГ*

Комиссын нарийн бичгийн дарга: *Вассерман*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Газраас хөдөөгийн хөдөөгийн төлөв зогсоох.</p>	<p><i>Биелсэн</i></p>
<p>2. Тогшилтотой олон жилийн өмчлөлтийг үргэлжлүүлэх.</p>	<p><i>Биелсэн</i></p>
<p>3. Зогсоогдох баруун талын талын баруун талд үс зайлуулах сувгалгаа хийх.</p>	
<p>4. Төмөр замын гэрээг хатуулах буюу барилгын бүрдүүлэх хийх.</p>	
<p><i>З</i></p>	<p><i>З</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *779*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
 200*8* оны *04* сарын *10* өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *У. Байрanchu*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.04

Бүртгэлийн дугаар *779*


**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН .**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *С. М. Б.*

200*25* оны 04 сарын 10-ий өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Мунгал</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Мунгал</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2024.10.07</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Мунгал</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Мунгал</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2024.10.07</i></p>



Бүртгэлийн дугаар *779*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

.....

2007 оны *04* сарын *10* ний өдөр
