

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 09 сарын 15-ны өдөр

Дугаар

БА-449/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй, нийт Q=308 м3/ц хүчин чадал бүхий 144 м2 талбайтай, зоорьтой, 1 давхар, 1 блок насос станцын барилга; Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 4 дүгээр хороодод баригдсан дунд төвөгшилтэй, ф160-ф225мм голчтой, 3735м урттай гадна ус хангамжийн шугам угсралтын ажилд Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 07 дугаар сарын 28-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/03/19 огноо, 0002278 дугаар, БАЗГ2025/0150; 2025/02/11 огноо, 0002055 дугаар, БАЗГ2025/0048;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар MCPN PCDP-07/2021, CPN-UEWS-01/21; TSEW-07/2021, PCDP-07/2021

2.3. Захиалагч: Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгж, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж 2 Соёлын төв өргөө, Г корпус 415 тоот, холбоо барих утас: 70003099, цахим шуудан: info@ub-subcenter.mn

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: И Жи Өү ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011339030, регистрийн дугаар: 5571863, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ11-662/23, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 26 дугаар хороо, автохаб төв, 401 тоот, холбоо барих утас: 77124848, 88112972, цахим шуудан: info@ego.mn

Набсан ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011152141, регистрийн дугаар: 2039974, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ18-949/21, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Лааганы гудамж, 122-11 тоот, холбоо барих утас: 77275656, 77272929, цахим шуудан: info@nabsan.mn

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Пис Си Ди Пи ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011392005, регистрийн дугаар

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд

5669995, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ18-339/22, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нарны зам-91, Санроуд барилга 5 давхар, холбоо барих утас: 77117196, цахим шуудан: Doccontroller@pcdp.mn

Усны эрчим ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011108139, регистрийн дугаар: 2020084, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ19-110/22, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 16 тоот, холбоо барих утас: 99059516, цахим шуудан: khandmaa@uec.mn

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Ус Сувгийн Удирдах Газар ОНӨААТҮГазар, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9014001025, регистрийн дугаар: 2117568, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, Токиогийн гудамж-5, Өөрийн байр, холбоо барих утас: 91116944, цахим шуудан: usug1959@gmail.com

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй, нийт Q=308 м3/ц хүчин чадал бүхий 144 м2 талбайтай, зоорьтой, 1 давхар, 1 блок насос станцын барилга; Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 4 дүгээр хороодод баригдсан дунд төвөгшилтэй, ф160-ф225мм голчтой, 3735м урттай гадна ус хангамжийн шугам угсралтын ажилд түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэхүү насос станцын барилга болон цэвэр усны шугамын ажил нь зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагуудад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

ХЯНАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР

б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй, нийт Q=308 м3/ц хүчин чадал бүхий 144 м2 талбайтай, зорьтой, 1 давхар, 1 блок насос станцын барилга; Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 4 дүгээр хороодод баригдсан дунд төвөгшилтэй, ф160-ф225мм голчтой, 3735м урттай гадна ус хангамжийн шугам угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгжийн захиалгатай, Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, Толгойт дэд төвийн насос станцын барилга; Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 4 дүгээр хороо, Толгойт дэд төвийн гадна ус хангамжийн шугам угсралтын ажил

КОМИССЫН ДАРГА: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗРЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(А.МӨНГӨН)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР
ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ
ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

(А.БАТ-ЭРДЭНЭ)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ
ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ТОЛГОЙТ ДЭД
ТӨВИЙН УС ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 07 дугаар сарын 28

Улаанбаатар хот

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгжийн захиалгатай, TRDH11-C Толгойт дэд төвийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй, нийт Q=308 м3/ц хүчин чадал бүхий 144 м2 талбайтай, зоорьтой, 1 давхар, 1 блок Насос станцын барилга; Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 4 дүгээр хороодод баригдсан дунд төвөгшилтэй, ф160-ф225мм голчтой, 3735м урттай ачаанаг ус хангамжийн шугам угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 08:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 11:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн дарга
А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн
нэгжийн төслийн менежер
А.Бат-Эрдэнэ
3. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын
техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч
Б.Тэмүүлэн
4. Хяналт шалгалтын газрын дэд бүтцийн
стандарт хяналтын хэлтэс, эрчим хүчний
хяналтын улсын ахлах байцаагч
З.Очирпүрэв
5. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК-ийн
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын
Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
Э.Уранчимэг
6. Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын ус
хангамжийн хяналтын инженер
Г.Ган-Оч
7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Барилгын
зураг төслийн хяналтын байцаагч ахмад
Б.Дөл-Эрдэнэ
8. Архивын ерөнхий газар,
Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын
архивын ахлах архивч
Э.Шижиртуяа
9. Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын -ийн Барилга,
барилгын материал үйлдвэрлэл,
баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын
сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн
Б.Жаргал
10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
эрхийг хамгаалах байгууллага. Монголын
тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны

хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан	Н.Эрдэнэтөгс
11. Ашиглагч байгууллага Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын Мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын албаны ахлах инженер	П.Чинборгил
12. Зураг төсөл зохиогч байгууллага, Усны эрчим ХХК-ийн инженер	Д.Өлзийсайхан
13. Зураг төсөл зохиогч байгууллага, Пи Си Ди Пи ХХК-ийн төслийн менежер	Ч.Чимэдноров
14. Гүйцэтгэгч байгууллага, И Жи Өү ХХК-ийн Барилга угсралт хариуцсан захирал	Ц.Хосбаяр
15. Гүйцэтгэгч байгууллага, Набсан ХХК-ийн дэд захирал	Д.Энхтайван

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан - 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгжийн захиалгатай, TRDH11-C Толгойт дэд төвийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй, нийт Q=308 м3/ц хүчин чадал бүхий 144 м2 талбайтай, зорьтой, 1 давхар, 1 блок насос станцын барилга; Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 4 дүгээр хороодод баригдсан дунд төвөгшилтэй, ф160-ф225мм голчтой, 3735м урттай гадна ус хангамжийн шугам угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд ажлын зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн дарга **А.Мөнгөн:**

- Хоёр зураг төсөл зохиогч дүгнэлтээ шинэчилж ирүүлэх
- Гүйцэтгэгч тус бүр чанарын баталгаа гаргаж албан тоотоор ирүүлэх
- Комисст санал өгсөн захиалагч, хоёр гүйцэтгэгч, хоёр зураг төсөл зохиогч нийт 5 хүн итгэмжлэл, томилгоог нотариатаар батлуулж ирүүлэх
- Шугамын трасс дагуух зам талбайн тохижилт, нөхөн сэргээх ажлыг бүрэн хийх

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Б.Тэмүүлэн:**

- Гэр хоолой хийсэн акт, орчинтой фото зураг шалгуулах
- ЦУХ 17 худаг далан сувагтай хэсэгт ГУББГазартай зөвшилцсөн бичиг
- Шугам сүлжээний шахалт, тохируулгын акт гүйцээж шалгуулах

- ЦУХ 2,3 шатны байршил шугам сүлжээний давхцаж байгаа шатыг шилжүүлэх
- ЦУХ 17"2 худаг /даралт тохируулах худаг/ шингээх худаг хийх
- Шугам сүлжээний холболт хийх
- Насос станцын туршилт тохируулгын акт гүйцээж шалгуулах
- Техникийн комиссын үүрэг даалгаваруудыг гүйцээж баталгаажуулах
- Насос станцад хэрэглэсэн холбох хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн гарал үүслийн гэрчилгээг шалгуулах

Хяналт шалгалтын газрын дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв:**

- Насос станцын шугам тоноглол, гадна шугам сүлжээ гэх мэт угсралтын ил далд, шахалтын актууд шалгуулах
- Шугам сүлжээг хотын мэдээллийн санд оруулах
- Техникийн комиссын үүрэг даалгаварыг гишүүд бүрээр гаргаж баталгаажуулах
- Насос станцын цахилгааны холболтыг бүрэн хийж ашиглагч УСУГ-т хүлээлгэн өгөх

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ХХК-ийн ТУТГазрын ДБТХэлтсийн мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг:**

- Гадна холбоог МХС ХХК-д техникийн актаар хүлээлгэн өгөх /тусгай зөвшөөрөл нөхөж үзүүлэх/
- Шинээр хийсэн худагт консол хийх
- Зургийн дагуу зарлан мэдээлэх систем гүйцээж суурилуулах, ажиллагаанд оруулах
- Суурин утас суурилуулж ажиллагаанд оруулах /физик кабельтай/
- Суурилуулсан камеруудыг ажиллагаанд оруулж видео бичлэг болон фотогоор ирүүлэх
- Дотор холбооны акт болон тусгай зөвшөөрөл нөхөж ирүүлэх

Ус сувгийн удирдах газрын ус хангамжийн хяналтын инженер **Г.Ган-Оч:**

- Толгойт насос станцад туршилт тохируулга хийх
- Станцын арын холболтыг яаралтай хийх /цэвэр усны шугам, цахилгаан/
- Алсын удирдлагыг холбох

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч ахмад **Б.Дөл-Эрдэнэ:**

- Галын дохиоллын гар мэдээлэгч, утаа мэдрэгчийн ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллуулах, утаа мэдэрэгчийн таг авах
- Гал унтраах даралтын хоолой, техникийн шаардлага 6576:2016 стандартын дагуу галын гидрантын хоолой, хошууны тотго, хомут солих I К тэмдэглэгээ хийх

- Өрөө тасалгаануудад гал унтраах автомат бие даасан модулийн систем төлөвлөх /ОБЕГ-ын 2022.11.08-ны өдрийн 349/03-161 дүгнэлтийн 2-р заалт/ мөн уг дүгнэлтийн эх хувийг нөхөж үзүүлэх
- Анхааруулах санамж, плакат тэмдэг тэмдэглэгээг хийх
- Техникийн комиссын баталгаажсан акт нөхөж үзүүлэх

Архивын ерөнхий газар, Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч **Э.Шижиртуяа**:

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх
- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг гүйцэтгэгч байгууллага баталгаажуулах
- Архивт баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, хуудас дугаарлах, дотоод товъёг үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх

Барилгын хөгжлийн төв ББМҮБХ-ийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **Б.Жаргал**:

- Барилгын тухай хуулийн дагуу баталгадсан төсөвт өртгөөс норм нормативын санд төлбөр төлөх
- Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч, захиалагчийн техникийн хяналт нь ЗГ-ын 343 тогтоолоор баталагдсан журамд хэрхэн нийцэж байгаа талаар НЗДТГ-с албан бичгээр тодруулга ирүүлэх
- Насос станцын барилгад 5 тн-ийн гүүрэн краны ББ-н зургийг нөхөж үзүүлэх
- Барилгад ашигласан материалуудын гарал үүсэл, тохирлын гэрчилгээ, лабораторын дүгнэлтийг нөхөж шалгуулах. Ил далд ажлын акт, фото зураг

Ашиглагч байгууллага УСУГ-ын МТАА ахлах инженер **П.Чинборгил**:

- PLC-н прогамм хангамжийг бүрэн дуусгаж эх код болон backup-ийн хамт хүлээлгэн өгөх
- SCADA программ хангамжийн ажлыг УСУГ-тай харилцан тохиролцож хийж гүйцэтгэх
- УСУГ-ын хяналт удирдлагын төвтэй холбож төвөөс хянах, удирдах боломжтой болгох
- Гарын авлага, зураг схем, сургалт зохион байгуулах
- Шилэн кабелийн холболтыг раканд суурилуулж бүрэн дуусгах
- Touch дэлгэцийн программ хангамжийг бүрэн дуусгаж backup хүлээлгэн өгөх
- Усан сангийн түвшин мэдээлэгчийг насос станцад авчирч удирдлагыг усан сангийн түвшингөөс хамаарч ажиллахаар хийх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, **Н.Эрдэнэтөгс**:

- Тухайлсан саналгүй, ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч байгууллага, Усны эрчим ХХК-ийн инженер **Д.Өлзийсайхан**:

- Комиссын гишүүдийн санал дүгнэлтийн дагуу улсын комиссоор ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Захиалагч байгууллага, УБХГХХХОДХТН-ийн Төслийн менежер **А.Бат-Эрдэнэ:**

- Улсын комиссын үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллага, Пи Си Ди Пи ХХК-ийн төслийн менежер **Ч.Чимэдноров:**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага, И Жи Өү ХХК-ийн Барилга угсралт хариуцсан захирал **Ц.Хосбаяр:**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага, Набсан ХХК-ийн дэд захирал **Д.Энхтайван:**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгжийн захиалгатай, TRDH11-C Толгойт дэд Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй, нийт Q=308 м3/ц хүчин чадал бүхий 144 м2 талбайтай, зoorьтой, 1 давхар, 1 блок насос станцын барилга; Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 4 дүгээр хороодод баригдсан дунд төвөгшилтэй, ф160-ф225мм голчтой, 3735м урттай гадна ус хангамжийн шугам угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**



(А.МӨНГӨН)

**НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР
ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ
ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР**



(А.БАТ-ЭРДЭНЭ)


Нэгдсэн
Цуглам, сүүлээр
3.5 км.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын барилга байгууламжийн Ажиллагаа бүртгэлийн хэлтсийн газар*
Комиссын гишүүн: *А. Монгол*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 2 Зохиогч дугуйн багц шинэчилж оруулж.	= Дугуйн багц шинэчилсэн.
2. 2 Гүйцэтгэгч тус бүр чамаран бандлаган орбан тоот оруулж.	= Чамарын бандлаган орбан тоот оруулж.
3. Засварагч, 2 Гүйцэтгэгч, 2 Зурт Зохиогч нийт 5 хүн (Коллежт оролцсон) ажлын хэргийг, төлөвлөгөөг нотарилгаар батлууриж оруулж.	 <p>= А. Монгол, Г. Дорнод, С. Дорнод, Д. Дорнод, О. Дорнод нийт 5 хүн (Коллежт оролцсон) ажлын хэргийг, төлөвлөгөөг нотарилгаар батлууриж оруулж.</p>

4. *Илүүтэйгээр ТРАСС* D НЦД ӨУ КХК
Автуур зам талбайн 2025.08.13
Төлөвлөгөө, цооног 25/130 2025002958
сэргэн ажилт бүртгэлийн хэлтсийн газар
(Автуур зам, цооног байгууламж)

ТЫН

ИНСПЕКЦИ

Бүртгэлийн дугаар2056.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....*Н. Агдас*.....
2025 онь 08 сарын 28-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *А. Мөнгөн* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *А. Мөнгөн* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.28

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг оруулах ко


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХЦЦГ*

Комиссын гишүүн: *Б. Тэмүүлэн*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тэр хоолой хайсан акт, орчинтой фото зураг. <u>далгуулах</u>	1. Биелсэн.
2. ЦУХ 17' хугацаа далан дүвстэй. <u>харгал</u> ТУВТ. газартай. <u>зөвшөөрсөн</u> болго	2. Биелсэн
3. Шугам суртлооноос <u>харгал</u> төхсүүлсэн акт <u>гүйцэтгэл</u> <u>сэлгүүлэх</u>	3. Биелсэн. <u>04 дүг</u>
4. ЦУХ 2, 3. <u>шатныг</u> байршил шугам суртлооноос <u>давхар</u> байгааг <u>шатныг</u> <u>шилжүүлэх</u>	4. Биелсэн
5. ЦУХ 17"2 хугацаа (<u>даралт</u> <u>тасаруулах</u> <u>хугацаа</u>) <u>шилжүүлэх</u> <u>хугацаа</u> <u>шилж</u>	5. Биелсэн
6. Шугам суртлооноос <u>харгал</u> <u>шилж</u>	6. Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар ... *2056* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2025 оны *08* сарын *28* -ний өдөр

<p>7. Насос станцвн түрслэлт тохируулгын акт гүйцээлт шалгуулах</p> <p>8. Техникийн хэмжэсэн үүрэг даалгаваруудыг гүйцээлт баталгаажуулах</p> <p>9. Насос станцад ахоромжсон хатгах ахоромжсон матог төхөөрөмжийн гарал үзэлийн гэржээг шалгуулах</p> 	<p>7. Биелсэн</p> <p>8. Биелсэн</p> <p>9. Биелсэн</p> <div data-bbox="869 1052 1492 1377" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 2056</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг Н.Бүдүү</p> <p>2005 оны 08 сарын 28 -ний өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Б.Тэмүүлэн</i></p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>[Signature]</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2005, 08 28</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Б.Тэмүүлэн</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2005.08.15</p>

ТҮҮН

Шалгалтанд

С

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг оруул

Төлвийг дээг төв Нэвсэс станцон барилга, шугам сулжээ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Комиссын гишүүн: З. Оюунпуров

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1) Нэвсэс станцон шугам тоноглох, гэднэ шугам сулжээ 2и үлсрэлтэй, ай даяг, шохалтэй Ангууш махуураа</p> <p>2) Шугам сулжээ хөтөл мэдээллийн санг эрхуулаа</p>	<p>- Ангууш махуураа</p> <div data-bbox="861 952 1460 1265" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 2056 ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>Н.Оюунпуров</p> <p>2025.08.27-ний өдөр</p> </div> <p>- № 5 82025/1890</p>
<p>3) Техникийн комиссын үүрэг даалгавруудыг гишүүд бүрээр гарсан баталгаа жуураа,</p>	<p>- Ант үндэсөл</p>
<p>4) Нэвсэс станцон захирагчид хөлдөлтэй дүрэн хийлт өөрөө хөлдөх ДСУГ-д хувиаран өгөө</p>	<p>- Биелсэн (хөлдөлт хийлтэй ДБЦТ төрөө хийсэн)</p>

ТАЛТЫН
Р
ийг ашиглалтанд
ОМИСС

Бүртгэлийн дугаар ... 2056 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
Н. Огчи
2025 оны 08 сарын 08-ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *З. Дорж*
/Тамга, тэмдэг/
З. Дорж /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 07. 18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *З. Дорж*
/Тамга, тэмдэг/
З. Дорж /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 07. 14

ОАУ 14 рхөдөөд
 Улаанбаатар хотын тэр
 хөрөөнийг хог буцаах
 хөдөөгө оруулах
 бүтэц хөдөөгөртосийн
 ийн (Көсөс дагуу)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


Барилга байгууламжийг ашигласнаар оруулах

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХС ХХК*

Комиссын гишүүн: *Э. Уранчимэл*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тэгш хөлөөг МХС-г техникийн аргаар хүлээн авах. (Тусгай зөвшөөрөл лохоме үзүүлэх)	1. Тэгш хөлөөг аргаар МХС-г хүлээн авах.
2. Шаар хийж худалт хөдөөг эхл.	2. Көсөс хийж худалт зоргоор МХС-г аргаар хөдөөрсөн байна.
3. Зургийн дагуу зарсан мэтлэх систем гүйцэтгэх сурьцанг амьлагаану ердийн.	3. Зургийн дагуу зарсан мэтлэх систем гүйцэтгэх сурьцанг фото зургаар ирүүлсэн.
4. Сурьцанг амьлагаану ердийн (Файл кабельтай)	4. Сурьцанг амьлагаану ердийн файл үзүүлсэн.
5. Сурьцанг амьлагаану ердийн видео ойлгох болон фотогаар ирүүлэх	5. Сурьцанг амьлагаану ердийн видео ойлгох болон фотогаар ирүүлсэн.
6. Хөдөөг ашиглах арга болон тусгай зөвшөөрөл лохоме үзүүлэх.	6. Тусгай зөвшөөрөл лохоме үзүүлсэн.



ГАЛТЫН
Э
ЭГ АШИГЛАЛТАНД
МИСЭ

2

Чурьга гэсэн нэвтрэн
бичлэгтэр байсан
ашигласангаар авах
салбатай байна

Бүртгэлийн дугаар 2056
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н. Агван
2025 оны 08 сарын 08-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: МХСХК

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Улаансүх Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 07. 08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Улаансүх Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 08. 08.


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэвсрэлт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ
ГА
Барилга байгуула
оруула
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ус сувгийн удирдах газар*

Комиссын гишүүн: *Г. Ган-Оч*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Төлөвт нэгэс станцуд туршилт тохирцуула амьх.</i></p> <p><i>2. Станцын арын хялбартай нийх цовч ухивь нисгал, Вахынгаан.</i></p> <p><i>3. Арын удирдлагаг халбаг</i></p> <p><i>Итрх үүрэг даалгаврыг баглантөр байнгын ашиглалтад оруулж авах.</i></p> 	<p><i>1. Төлөвт нэгэс станцуд туршилт тохирцуула хийсэн.</i></p> <p><i>2. Станцын арын хялбартай амьсон.</i></p> <p><i>3. Арын удирдлагаг халбасан.</i></p> <div data-bbox="845 1400 1436 1736" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>2056</i> ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар өгөгсөн ажилтны гарын үсэг</p> <p><i>Н. Агдуй</i></p> <p><i>20</i> оны <i>08</i> сарын <i>08</i> ний өдөр</p> </div>

ГАЛТЫН
Э
Эг ашиглалтанд
МИСС

Бүртгэлийн дугаар 2056
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н. Ойун
2025 онь 08 сарын 28-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: АБ
/Тамга, тэмдэг/
/ Тан-Ог / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: АБ
/Тамга, тэмдэг/
/ Тан-Ог / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХАНАЛТ Ц
ГА


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг оруулах

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НОВС*

Комиссын гишүүн: *Б. Дэл - Дрүмэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>УБХГХХХОДХ Төсөл</i> <i>Төлөвт дүр төвийн үс</i> <i>хангамжийн ажил, насас</i> <i>стандарт барилга</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Талын дохиоллын гар</i> <i>мозгалалт, утас мээрэгийн</i> <i>ажиллагаа бүрэн хангам</i> <i>ажиллагаа, утас мээрэгийн</i> <i>төл авал</i> - <i>Төл үйлдвэр дарааллын</i> <i>хоолой, төхөөрөмжийн шаардлага</i> <i>6576:2016 стандартын дагуу</i> <i>талын төл гэрэлтэн хоолой</i> <i>хоолой, төмөг, хоолой</i> <i>сониол (Толгонов төмөг)</i> <i>ГК шаардлага хийгээ</i> - <i>Орво тасалгаануудад</i> <i>гол үйлдвэр автоматад</i> <i>дүр даасан мээрэгийн</i> <i>систем төгөвлөл.</i> <p><i>ОБЕГ-ын 2022.11.08-ны</i> <i>озууш 349/03-164 дүрэмийн</i> <i>2-р заалт</i> <i>дүрэмийн эх үрвэр төлөм үзүүлэх</i></p>	

ГАЛТЫН

йг ашиглаг танд
МИСС

- Анхарагдсан санхүүг, мөхөөг
талзур талуудыг хийж
- Жаашигийн комиссын баталсан
акт нөхцөл үзүүлж

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



СХД 1, 2, 19-р хороо
УБХГХХОД ХТөсөл
Шалт дэд төвийн
үе хангамжийн ажил,
Насоо станцын барилга

Чуулбар даалгавар бүтээсэн


Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ 
Байцаагч /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ 
Байцаагч /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.14

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ЧТӨ**

Комиссын гишүүн: **Э. Шиншур тугаа**

СХБ, 1, 2, 19-р хороо. Төлөөт өгдү төвийн үе хөмөлгөөний өмнө, хэсэг орой, барилга

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. <i>Барилга шилдэг ажлын өмнө бүрэн бүрдүүлэх.</i>	1. <i>Шилдэг ажлын өмнө бүрэн бүрдүүлэх</i>
2. <i>Барилга үерхэлтэй ажлын үржүүлсэн гүйцэтгэл үйлдвэрийг байгууллага бэлтгэвчлүүлэх.</i>	2. <i>Барилга үерхэлтэй ажлын үржүүлсэн гүйцэтгэл гүйцэтгэл бэлтгэвчлүүлэх</i>
3. <i>Ажилд барилга бичиг үйлдвэр өгөх нийтлэл маягаар дамжуулан барилга бичиг бүрэн бүрдүүлэх, гүйцэтгэл үйлдвэр, гүйцэтгэл төвийг үйлдэх.</i>	3. <i>Барилга бичиг бичиг маягаар дамжуулан барилга бичиг бүрэн бүрдүүлэх өгөх.</i>
4. <i>Барилга бичиг бичиг өмнө ажлын зурвасын эх үзвэл ажилд үйлдвэр өгөх.</i>	4. <i>Барилга бичиг бичиг өмнө ажлын зурвасын эх үзвэл үйлдвэр өгөх.</i>

Бүртгэлийн дугаар **2056**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н. Азми
 2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр

ТАЛТЫН
Р

ийг ашиглалтанд
эмисс

Бүртгэлийн дугаар ... 2056 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н. Огчи
2025 оны 08 сарын 28-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Н. Огчи*

/Тамга, тэмдэг/

Н. Огчи Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.28.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Н. Огчи*

/Тамга, тэмдэг/

Н. Огчи Гарын үсгийн тайлал

Огноо: УХАД-25/0087369 *28*

ЦХД, Төлөөтэй ⑧
 ᠑᠑᠑ төв иди гурим
 шурим шурим, Навс
 стандам бүрмэ.

ХЯНАЛТ И
 ГА
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 Барилга байгуула
 оруула

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Барилгын хөгжлийн төв.*

Комиссын гишүүн: *Б. Наран*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгын гурим шурим иди гурим Шурим шурим гурим орлогчос норм норм шурим шурим төв дөр төв дөр</p>	<p>1. Норм норм шурим шурим төв дөр төв дөр Шурим шурим шурим</p>
<p>2. Зөвсөө гурим иди 4544 нэг, Зөвсөө төв иди шурим 51 343 төв төв шурим шурим шурим шурим шурим шурим 45271-аас шурим шурим шурим шурим шурим шурим</p>	<p>2. Шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим</p>
<p>3. Навс стандам шурим шурим 570-и шурим шурим шурим шурим шурим шурим</p>	<p>3. Шурим 570 шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим шурим</p>

Бүртгэлийн дугаар 2056
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН**

ТАЛТЫН

Э

Тайлбар ашиглалтанд
МИСС

Ноомон 4544 нө.

Н. Баруунгу амтгалын
мөсөр илтгэлээр гарын
үүсэг төхөөрөмж
гэрэлтэй, мэдээллийн
дүгэмтэйгээр илгээ
хэмээн гүйгээ. /Тайлбар
санаагаа амт, дүгэм
гэрэл /

Тайлбар
Дүгэмтэйгээр амт
14 ноомон дот
хэмээн гүйгээ

Н. Баруунгу амтгалын
мөсөр илтгэлээр гарын
үүсэг төхөөрөмж
гэрэлтэй, мэдээллийн
дүгэмтэйгээр илгээ

Бүртгэлийн дугаар 2056
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
Н. Энхтүвшин
2025 оны 08 сарын 28-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/ Баянгол Улс
ЖАРГАЛ
ХЭВЛЭХ
ИМЖИЛЭГ
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.28-д.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/ Баянгол Улс
ЖАРГАЛ
ХЭВЛЭХ
ИМЖИЛЭГ
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.28-д.

Төлөөтэй гэдэг гэдгийг үс хангалуу (9)
ашигласан хэргийн баримтаа
усралтын ашиг.
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) ГА

Байгууллага: УБМЭЛБ

Комиссын гишүүн: Н. Эрдэнэтуул

Барилга байгуула
оруула

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Тухайлаан санхүүг</p>	<p>Бүртгэлийн дугаар 2056 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг Н. Эрдэнэтуул 2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр</p>

2025002950

ГАЛТЫН
ийг ашиглалтад
МИСС

Бүртгэлийн дугаар 2056
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эжилтны гарын үсэг
Н. Агшил
2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр

Самал
у/ашиглалтад
авсаг шилжүүл

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Н. Агшил/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-07-28



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Н. Агшил/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-08-13



ХЯНАЛТ I
Г

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт байгуул оруул

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ашиглагч байгууллага Үс сувгийн удирдах газар*

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① PLC -н програмыг хангамжийг бүрэн гүйцэтгэх эх код болон бакир -н хэлт хүндэтгэн өгөх	Биелсэн
② SCADA програмыг хангамжийн ажилч ҮСҮГ -тай харилцан тохиролцоо хийж гүйцэтгэх	Биелсэн
③ ҮСҮГ -н хяналт удирдлагын төвтэй хөдөлж төвөөс хянаж удирдах боломжтой болгох	8/21 өдөр гүйцэтгэнэ.
④ Гарин авлага зурга эхлэл сургал зохион байгуулах	8/21 өдөр гүйцэтгэнэ
⑤ Ижилэн кабелин хөдөлгөөн рөхөөг эдүрүүлж бүрэн гүйцэтгэх	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Биелсэн дугаар <i>2056</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p><i>Биелсэн Н. Агши</i></p> <p>2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр</p> </div>
⑥ Touch галгачын програмыг хангамжийн бүрэн гүйцэтгэх бакир хүндэтгэн өгөх	
⑦ Улам сэлтэн түвшин мэдээлэл нэвч станц-д эвсгэж удирдсанаар улам сэлтэн түвшингөөс хөдөлгөөрт амчлахаар хийж	
	Биелсэн

ИГЭЛТЭЙН
ЭР
ийг ашиглалтанд
КОМИСС

Бүртгэлийн дугаар 2056
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н. Чиндоржиев
2025 онь 08 сарын 11 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: УСҮГ
ИТӨА хасах ийнхөөр
Гарын үсэг: Н. Чиндоржиев

/Тамга, тэмдэг/
Н. Чиндоржиев /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: Н. Чиндоржиев

/Тамга, тэмдэг/
Н. Чиндоржиев /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.8.11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ Ц. ГА.
Барилга байгуулагуула:
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчтэй)

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Байгууллага: *Усань Эрчим ХХК.*

Комиссын гишүүн: *Огдсайхан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн санал, дүрмийн хамт ганц үлсэм комиссоор ажиллалтааг оруулах саналтай байна.</i></p>	<p><i>Биелсэн</i></p> <div data-bbox="821 1339 1439 1659" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>2056</i> ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p><i>Н. Огдсайхан</i></p> <p>200... оны ... сарын ... <i>25 08 28</i> -ний өдөр</p> </div>

ГАЛТЫН

йг ашиглалтанд
МИСС

Бүртгэлийн дугаар 2056

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н. Агдеев

2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

Д. Доржиев Сайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/07/28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

УЛААНБААТАР ХОТ
Гарын үсэг: *[Signature]*

Тамга, үзэмдэг
ЭРЧИМ

Д. Доржиев Сайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/08/11

ТТБ 52512-202804

ХЯНАЛТ ША.
Барилга байгууламжийг ашиглалтад ГАЗА
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламж оруулах к

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Замнамрын ашигт малтмал төлөөлөгч (PCDP)

Комиссын гишүүн:

Чинзоргов

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн үрэг даалгаврын бие мэтээр ашигт малтмал төлөөлөгч ажил сэтгэлтэй байна.</i></p>	<div data-bbox="842 1265 1445 1590" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ..2056...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг <i>Н. Аюул</i></p> <p>2008 оны 08 сарын 28 -ний өдөр</p> </div>

УЛТЫН


ашиглалтанд
сс

Бүртгэлийн дугаар ... 2056 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
Н. Агви
.....
2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Ц. Чингуноров*
Гарын үсэг: *Ц.Ч*
/Тамга, тэмдэг/
Ц. Чингуноров Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Ц.Ч*
/Тамга, тэмдэг/
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.28





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт байгуула оруула

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НАВСАН ХХК.*
Комиссын гишүүн: *Д. Анхтайван - 2.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын ажлын үр дүндийг үүрэг даалгаврын биелэлтээр амжилттай оруулж сэтгэл хангалуунтай байна.</i></p>	<div data-bbox="790 1209 1404 1534" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>2056</i> ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p><i>Н. Анхтайван</i></p> <p>.....</p> <p><i>25</i> .. оны .. сарын <i>28</i> -ний өдөр</p> </div>

ТАГАЛТЫН
Тайг ашиглалтанд
ЭМИСС


Бүртгэлийн дугаар 2056
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н.Озгий
2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: Д. Зохиолсон
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/ [Signature]
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/ [Signature]
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо:



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ц-Ми-Оу ХБК

Байгууллага:

Комиссын гишүүн: *Э. Хосбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтэр байнгын ажлаар хийгдэж турши олох саналтай байна.</i></p>	<div data-bbox="869 1131 1484 1467" data-label="Image"> </div>

АЛТЫН
ашиглалтанд
ИСС

Бүртгэлийн дугаар ... 2056
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н. Вигдсий
2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэг/

Н. Хос /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.28.



Үүрэг даалгаврын бүтээлт шалгасан:

Гарын үсэг


/Тамга, тэмдэг/

Н. Хос /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.28.



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт





БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Комиссын гишүүн: *А. Бат-Эрдэнэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>#1. Улсын комиссын хурал даалгавар - # биелэлтээр БОТЖН-ын ашиг-лолтонд оруулах санхүүгийн байр</i></p> 	

ТАЛТЫН
Эг ашиглалтанд
ИСС

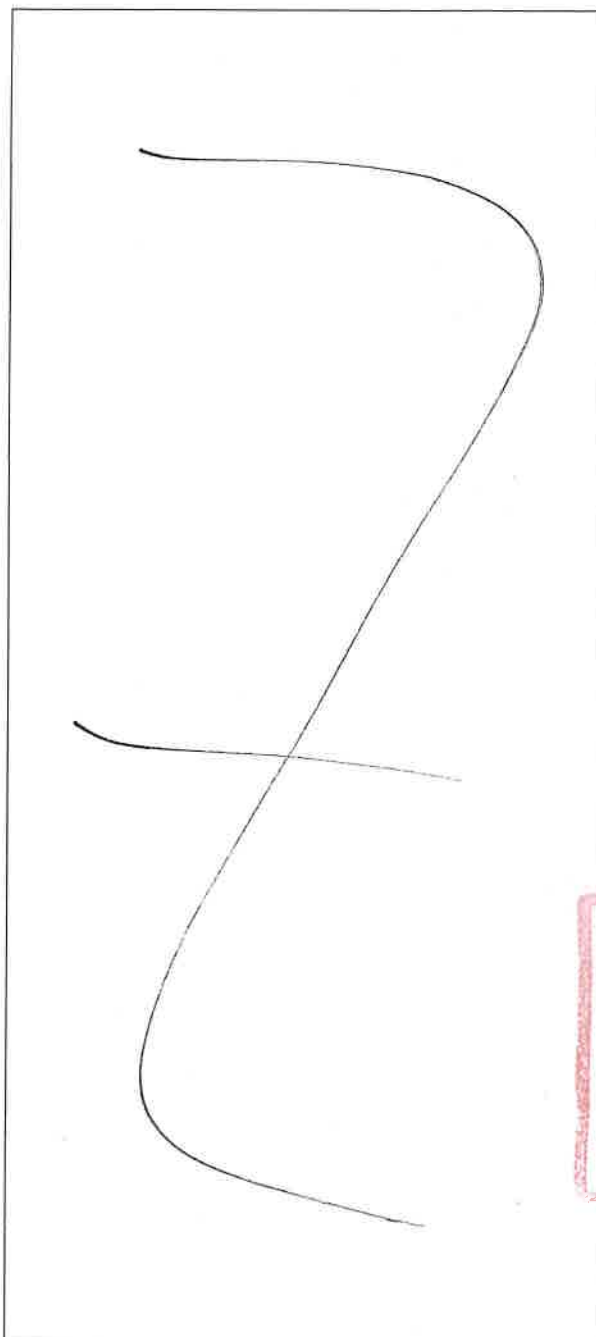

Бүртгэлийн дугаар ... 2056 ...
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
..... *М. Огзиев*
2021 оны 08 сарын 28-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ *М. Огзиев* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ *Сам-Огзиев* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

