

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 10 сарын 28-ны өдөр

Дугаар ...

БА-300/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 1 блок, 100 (нэг зуу) ортой цэцэрлэг, 180 (нэг зуун ная) суудалтай бага сургууль бүхий хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 09 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/03/25 огноо, 0002314 БАЗГ2025/0168 дугаар,

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: БП-01/72

2.3. Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9014001040 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5369622 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг 23 дугаар хороо, Арцатын аманд байрлах Нийслэлийн нутгийн захиргааны нэгдсэн цогцолбор барилгын Б блок 5 давхар, холбоо барих утас: 11-324249

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Нарангэрэл мандал ХХК оноосон нэр, 9011136120 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5202221 регистрийн дугаар, БУ17-770/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дүгээр хороо, 11-р хороолол, Ардын эрхийн байр 305 тоот, 88106246 холбоо барих утас,

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Батпроект ХХК оноосон нэр, 9011113047 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2773643 регистрийн дугаар, ЗТ19-583/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 6 дугаар хороо, бага тойруу, 26-р байр, 1-213 тоот, холбоо барих утас: 99249997

2.7. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Дукат ХХК оноосон нэр, 9011177089 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5277965 регистрийн дугаар, ЗТ16-29/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс

дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар хороо, Монхауз 33-1 тоот, холбоо барих утас:99109303

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

2.8.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Нийслэлийн Боловсролын газар оноосон нэр, 9070003041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9977065 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хороо, Багшийн хөгжлийн ордон 5 давхар, холбоо барих утас 70113039

2.9.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 1 блок, 100 (нэг зуу) ортой цэцэрлэг, 180 (нэг зуун ная) суудалтай бага сургууль бүхий хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 1 блок, 100 (нэг зуу) ортой цэцэрлэг, 180 (нэг зуун ная) суудалтай бага сургууль бүхий хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газрын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар 1 блок, 100 (нэг зуу) ортой цэцэрлэг, 180 (нэг зуун ная) суудалтай бага сургууль бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

Комиссын дарга:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Нарийн бичгийн дарга:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газрын Барилга захиалагчийн
хяналтын хэлтсийн дарга



(А.Мөнгөн)



(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН УУЛ ДҮҮРГИЙН 12 ДҮГЭЭР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 2 ДАВХАР 1 БЛОК, 100 (НЭГ ЗУУ) ОРТОЙ
ЦЭЦЭРЛЭГ, 180 (НЭГ ЗУУН НАЯ) СУУДАЛТАЙ БАГА СУРГУУЛЬ БҮХИЙ БАГА
СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс
Улаанбаатар хот

2025 оны 09 дугаар сарын 08

Хан-Уул дүүргийн 12 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 1 блок, 100 (нэг зуу) ортой цэцэрлэг, 180 (нэг зуун ная) суудалтай бага сургууль бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 09 сарын 08-ны өдрийн 09:00 цагт 14 гишүүний бүрэлдхүүнтэй эхэлж 11:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч: А.Мөнгөн
2. Хяналт шалгалтын газрын, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч: Ж.Жүгдэрмаа
3. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч: З.Очирпүрэв
4. Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, техник хяналтын инженер: Ц.Билигт
5. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх алба борлуулалт, мэдээлэл лавлагааны инженер: Г.Өлзийхишиг
6. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар, Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн: Ц.Дагвадорж
7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч: Б.Дөл-Эрдэнэ
8. Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн норм нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн: Б.Жаргал
9. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч: Э.Шижиртуяа

10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага:

11. Зураг зохиогч, "Батпроект" ХХК-ийн захирал:

12. Гүйцэтгэгч, "Нарангэрэл Мандал" ХХК-ийн захирал:

13. Хан-Уул дүүргийн боловсролын газрын мэргэжилтэн:

14. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн барилгын хяналтын инженер:


Н.Эрдэнэтөгс

Н.Наранчимэг

Б.Батзориг

Б.Пүрэвдорж

Г.Буянжаргал



ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 14
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 14

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 12 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 1 блок, 100 (нэг зуу) ортой цэцэрлэг, 180 (нэг зуун ная) суудалтай бага сургууль бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын гүйцэтгэлийг шалган ашиглалтад оруулах шаард

Шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Хогийн сав солих (тамхины хэсгийн битүүлэх)
- Хүүхдийн тоглоомын талбайн хиймэл зүлгийг солих зоиулалтын шал дэвсэх
- Гүйцэтгэгч БТХ-н дагуу чанарын баталгаа гаргах (14.3, 14.6)
- Цэцэрлэгийн ангиудын халаах хэрэгсэлд хаалт хийх
- Зохиогч дүгнэлтээ шинэчлэн бичих (БНБД 11-04-16)
- Цэцэрлэгийн ангиудын аюулгүйн гарцанд хуулга наах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Ж.Жүгдэрмаа**

- Барилгын ажил гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийн журналыг зааврын дагуу хөтлөж хянуулах, зохиогчийн дүгнэлтийг дүрмийн дагуу шинэчлэн үзүүлэх

- Спорт заалны цонхонд хаалт хийх, гал тогооны уур шүүгчийн шрупыг засварлах, цэцэрлэгийн хэсгийн шилэн душийг автороос тодруулж хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангуулж фото зураг ирүүлэх
- Сургуулийн хэсэгт ариун цэврийн өрөөний хаалга угаалтуурт тулж байгааг хүүхдийн орчин нөхцөлд нөлөөлөхгүйгээр засварлах
- Цэцэрлэгийн паркет шалны хөвөө хэсгийн зай завсарыг анхаар, сургуулийн хулдаасны ирмэг завсарыг дахин шалгаж засах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Гадна узелийн шугам дулаалах, цэвэрлэгээ хийх
- Шугам тоноглол хаягжуулалт бүрэн хийх
- Халаалт, халуун усны цахилгаан тогооны ашиглалтын заавар тогоон дээр байрлуулах
- Цэвэр усны нөөцийн саванд түвшин мэдрэгч угсрах
- Гадна бохир усны худагт цэцэрлэгээс гарч байгаа шугаманд отвод хийх
- Цэцэрлэгийн шалны халаалтын коллектор цэвэрлэх ажиллагааны заавар байршуулах
- Гал тогооны өрөөний угаагуурт тос баригч усрах
- Гал тогооны уур сорох зоонтны бэхлээс тогтоогчийн илүү гарсан хэсгийг тасдаж богиносгох
- Заалны дефлектортхүйтэн агаар шууд орохгүй байхаар хавхлаг хийх
- Гадна цооногт бохир сороход тохиромжтой таг хийх, үнэр гаргагч хийх
- Гадна узель, шугам угсралт, дотор сан, салхивчийн сорилт, ил далд ажлын актууд бүрэн баталгаажуулан шалгуулах
- Зарим нийтийн оо-өрөөний АС-н сэнстэй решотиг 1ш байгааг 2 болгох (суултуур болгоны харалдаа)
- Ердийн системийг багажаар шалгаж бичлэг хийж шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, техник хяналтын инженер: **Ц.Билигт**

- Шинэ хэрэглэгчийн сүлжээнд залгах зөвшөөрлийн бичиг
- Ерөнхий самбарыг зургийн дагуу угсрах /АТ / сургууль-1 тогооны барилга-1
- Холбооны өрөөнд хүрээ газардуулга хийх
- Давоарын самбаруудад бирк схем, плакат, кабельд төгсгөвч хийх
- DC-24-A3-09 шифр зургийн дагуу цэцэрлэг тогооны барилгад АВВБ 3*150+1*70 (4ш) татах одоо 3х120 байна.
- Цахилгааны ерөнхий самбаруудад бирк, схем, плакат, хасах хийх,

- Гал тогооны хүрээ газардуулгыг барилгын ерөнхий газардуулгад холбох /цэцэрлэг, сургууль, тогооны барилга/
- Аяндын хүрээний фото акт
- Дизель генераторыг АЗБТ-д бүртгүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны борлуулалт, мэдээлэл төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Г.Өлзийхишиг**

- Бохир усны цооногт (салхивчийн яндан) үнэр гаргагч яндан зургийн дагуу угсрах, зориулалтын стандарт тагаар таглах,
- Бохир усны худгуудад шат угсрах, бохир усны шугамын уналт хийх
- Ундны усны шинжилгээ өгөх НЭМГ
- Нөөцийн савны ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэх
- Нөөцийн савны ус зайлуулах хэсэгт трап угсрах
- УСУГ-тай бохир зөөврийн гэрээ байгуулах
- Гадна шугам сүлжээг хотын мэдээллийн санд бүртгүүлж актаар баталгаажуулах,
- Цэцэрлэг сургуулийн гал тогооны угаалтуурт тос баригч суурилуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар, Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн: **Ц. Дагвадорж**

- Алдаа заасан хяналтын камер ажиллуулах
- Гадна камеруудын холболтын хэсгийг хайрцагт хийж ус орохоос хамгаалж битүүмж хийх
- Гадна холбооны шилэн кабелийг FDF-т цэнэглэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Галын дохиоллын утаа мэдрэгч, дулаан мэдрэгчийг бүрэн хийж гүйцэтгэх (дутуу хийгдсэн өрөө тасалгаанд утаа мэдрэгчийн таг авах)
- Аврах зам гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ хийж байршуулах
- Гал унтраах даралтын хоолой хошуу тотго хомут солих, /Багданов тотго/гал унтраах даралтад цэгийн /ГК/ туршин шалгасан акт, видео бичлэг фото зургаар баримтжуулж нөхөж үзүүлэх
- Гадна дулаалгын материалын шинжилгээний бичиг нөхөж үзүүлэх
- Захиалагч гүйцэтгэгч автор нар албан бичиг дүгнэлт гаргаж өгөх
- Гал унтраах машины орц гарц төлөвлөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн норм нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн:

Б.Жаргал

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм нормативын санд төлбөр төлөх
- Анги танхимын халаалтын секц (паар) хүүхдийн гэмтэхээс хамгаалах
- Спорт заалны сагсан бөмбөгний шийт, самбар хийж тогтоох
- Спорт заалны цонхонд төмөр торон хамгаалт хийх
- Дотор хананаас гарсан баганы булан тохиод хүүхдийг бэртэж гэмтэхээс хамгаалсан зөөлөн булан наах шаардлагатай,

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч **Э.Шижиртуяа**

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх
- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг гүйцэтгэгч байгууллага баталгаажуулах
- Архивт баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, дотоод товъёг үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага **Н.Эрдэнэтөгс**

- Гадна авто зогсоолд ХБИ-д зориулсан босоо болон хэвтээ тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийх
- Гадна хашааруу орох хэсгийн налуу замд 2 талд нь ижил төвшний бариул хийх/урд талд/
- Гадна явган хүний замыг ямарч доголгүй болгож харааны бэрхшээлтэй хүний хөтөч замын сануулга стандартын дагуу хийх
- Сургууль руу орох хэсгийн үүдний довжооны налуу замд ижил түвшинд дагуу бариул зургийн дагуу хийх
- Сургуулийн хэсгийн ХБИ-ний ариун цэврийн өрөөнд угаалтуур суултуур стандарт тоноглолоор тоноглох мөн 2 давхарт зураг зохиогчтой зөвшилцөж ХБИ-д зориулсан ариун цэврийн өрөө гаргаж угаалтуур суултуурыг тоноглох
- Цэцэрлэгийн хэсгийн хүүхдийн өрөөнүүдэд 2-с доошгүй суултууранд түшигч бариул хийх /хаалганд/

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

“Батпроект” ХХК-ийн захирал Н.Наранчимэг

- Цэцэрлэгийн бүлгийн ариун цэврийн өрөөнүүднд хийгдсэн душны шилэн хаалтыг буулгаж поддон хийх
- Шатны хашлагад нэмэлтээр хийгдсэн бариулыг авах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

“Нарангэрэл Мандал” ХХК-ийн захирал Б.Батзориг

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг биелүүлэн комисст хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Хан-Уул дүүргийн боловсролын газрын мэргэжилтэн: Б.Пүрэвдорж

- Спорт заалны цонхны хамгаалалт, паарны хаалт хийх
- Спорт заалны тоног /сагсан бөмбөгийг шийт/ хийх
- Гадна талбайн тоглоом
- ХБИ-ний угаалтуур
- 2 давхарын шалны хөдөлгөөн байхгүй болгох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн барилгын хяналтын инженер: Г.Буянжаргал

- Гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтийг ажлуудыг ажлын 14 хоногт бүрэн хангуулах
- Барилгын тухай хуулийн 14.3 болон 14.6-д заасны дагуу чанарын баталгаа захиалагчид гаргах
- Ашиглагчтай хүлээлцсэн акт үйлдэж хүлээлцэх
- НӨМГазарт хүлээлгэн өгөхөөр өмчийн задаргаа гаргаж манай байгууллагатай хүлээлцэх
- Гал тогоо шийдний өрөөнүүдийн газардуулга холбох
- Цахилгаан тогооны насосыг газардуулгатай холбох
- Хаяг бирк самбаруудад хийх
- 0.4 кВ-н кабел зургийн автороор тооцоо хийлгүүлж дүгнэлт авах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 12 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар 1 блок, 100 (нэг зуу) ортой цэцэрлэг, 180 (нэг зуун ная) суудалтай бага сургууль бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилдгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ, БҮРТГЭЛИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:**

А.МӨНГӨН

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

**НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН
ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА:**

Б.ГАНЗОРИГ



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) оруулах комисс

Байгууллага: *Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын барилга байгууламжийн шийшээт бүртгэлийн хэлтсийн дарга*
Комиссын гишүүн: *А. Монгол*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зохлогч дүгнэлтээ шийдвэрлэн бичих (БНБД 11-04-16)	- 1. 2025.09.28. Бат проект хял. Дүрмийн үүрэг.
2. Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх (БТХ-1 14.3, 14.6)	2. Нарангийн мөсөгд хял. 2025.10.06 0025/30
3. Цэцэрлэгтэй ангилал халах хэрэгсэл хял, хамгаалалт хийх.	3. Дамьса үүрэг.
4. Хогцон газрын үнэ тэмцэн хял, БТХ-1, ЭСВМ хогцон савыг сольх	4. Дүрмийн үүрэг.

Бүртгэлийн дугаар...2633...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Мун
 2025 оны 10 сарын 27 ний өдөр
 2025004824

5. ХИХААНИЙ ТАСЛАОЛМОН
ТАЛБНИ ХИЙМЭЭ
ЗҮЛГИЙГ СОЛЧУ,
ЗОРЧУМАЛТВИ ШАЛ
АДВСАХ.

6. ТАР ЦЭНГЭРХЭЭНИЙ
АНХАГААРИ АЮУЛЧУЙН
ГЭРЧЭЭНИЙ ХУУМА
НААХ.



5. ЗУМБ СӨМӨӨН
ГЭВ.
ЗУРБ ШИШЭЭЛ.

6. ЗУРБ ШИШЭЭЛ.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д.МОНГОН / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д.МОНГОН / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-10-06

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газар
Барилгын техниклийн үзсэн ахлах байцаагч
Комиссын гишүүн: М. Мүрдэрмаа
Хантн дүүрэг 12р хороо
280 Хүүхдийн үзвэрийн, сургууль.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын ажил үрйцтөгт Төлүглэлийн журна хөтлөл Зөвхөн залуу аотлох хэтрэх мөн зохмоогийн дүрмийн үрмийн залуу шилжтн үүхлэг.	1. Барилгын ажил үрйцтөгт Төлүглэлийн бопон зоммоогийн нгзет дүрмийн бшнжн үрүлст байгааг зовлооно гшлгт өн байсгаагн үрлээ.
2. Спорт зуално цонхонг Хамгаалагч хийн, гал тогтоон дур үүрмийн шүрлэл зэвэрлэх үзвэрлэгийн хэслэийн шилт дундн автороос түүрлэг Хүүрмийн шүрлэг бийжон Хамгаалагч харуу фото үрүлст	2. Спорт зуално цонхонг Томор тэр хамгаалагч хийн (ашиглантын үеэ поршиг онгойлт анхаарах), Гшл тогтоон дур үүрмийн шүрлэл зэвэрлэж, шилт хамгаат брэгшн автороос зовцшнэкс фото үүрлээр баталгаануулжн үрүлстийн хөтнэв.
3. Сургуулийн хөтн ариун цэврийн ариунтай хаалагч Гшлгчтүүрт түүлс байгааг Хүүрмийн аргин Номоонг Номлоохкоор үрй зэвэрлэх.	3. Сургуулийн гшлгчтүүрт шилн үүлст хаалагчнээс Холүүрлэн байгааг хянан баталгаануулсан.
4. Үзвэрлэгийн паркст шалког ховоо хэслийн зай зөвхөн анхаар. Сургуулийн хүүдсэлн үрлн зэвэрлөн дэжн шалганг засах. Мүрн зуалгооврон Биелэлтээр байлгон ашиглан-туу ордох санал өгөв.	4. Паркст, хүүдсэлн шалког ховоо үрлн хэслийн зэвэр үрйцтөгт байгааг хянав. Мүрн зуалгооврон Биелэлтийн хөтнэсэн.

Бүртгэлийн дугаар 2633

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон шилтнн гарын үсэг
2025 оны 10 сарын 27-ний өдөр

2025004825

Handwritten signature

Handwritten signature

Хр,
нд

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Даалгаврын бичиг*
-Төлөөлөгчид даалгавар өгүүлэх
Гарын үсэг: *Сэнэл Огов.*

Тамга, тэмдэг
УЛСЫН АХЛАХ
БАЙЦААГЧИ
02-13-01/027

М.Мугурмаа Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.09.08*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *-ийг*
ХЭНЭБ.

Тамга, тэмдэг
УЛСЫН АХЛАХ
БАЙЦААГЧИ
02-13-01/027

М.Мугурмаа Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.09.25*

Бүртгэлийн дутвар *2633*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Огул
2025.. оны *10* сарын *27*-ний өдөр

8) Гал тогтоомж үүр сорох
ЗООМТНИЙ ДЭХЛЭЭС ТОГТОО
- 74мийг илүү гарсан хэсгийг
тасгаж богиносгох ✓

9) Засагч Директор
хүлээн аваар аугдур оролцоо
байлаар явчихаг хийн ✓

10) Газраа зоомногт зохиар
сорохог тохиромжтой
тэг хийн, үнэр гаргааг
хийн ✓

11) Газраа дээр, аугаа
дээр, дотор сал, сайхивчтай
сорилт, илдэг ажилын хатуу
бүрэн баталгаа илүүдэл
илүүдлээ ✓

12) Зарим нийтлэл 00-оронд
АС-ийн санстай рожотыг
1ш байлааг 2 болгох
(сүүлтээр болгож харалдаа) ✓


13) Эрдийн системийг
баталгаар илгэн
бичлээг хийн илгээгээ.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/


 / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

 / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.25.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дугаар хавсралт
ХАГААРЧЛАЛГА
ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийн их шийтгэл зөвшөөрлийн ажлыг ашиг оруулах комисс
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБЦТС, ТӨХК *техник хяналтын инженер*

Комиссын гишүүн: *Ц. Боньин*

*ХУД 12 хрвоо
180 хүрээний өрөөн, суурь*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. <i>Шинэ хэрэгсэлтэй сууригч газар зориулалтын бүтэц</i></p> <p>2. <i>Борилгийн салбарын зуршил дагуу үндэрт 1АТ5 / суурь - 2 төвшин барилга-1</i></p> <p>3. <i>Холбоотой өрөөн мунд суу-14 хийр</i></p> <p>4. <i>Давсрын салбарууд бүр, сэлм тэмдэг, хадгаль төслөгч хийр</i></p> <p>5. <i>ДС-24-А3-09 ширр зуршил дагуу үндэрт, төвшин барилга АВВБ 3x150x1x70 (4ш) татах. 0900 3x120 бидна</i></p>	<p><i>АХММ-Ц 2024/10/03-ий өрөөн ЦОХ-332/2024 дугаар комиссын дүгнэлт</i></p> <div data-bbox="837 1064 1444 1377" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 2633</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг</p> <p><i>сүх</i></p> <p>2025 оны 10 сарын 27-ний өдөр</p> </div> <p><i>"Дунд" ТӨХК ийн 2024/09/22-ий өрөөн 104/2025 дугаар илрэн бүтээгч (салаа) төвшин дүгнэлт өрөөн дүгнэлт</i></p>


6. Урьдчилсан эрхийг
 салбаруудад бүрх
 охи, мөхөт, хамт хийж
 7. Үнэ төлбөргүй хурт
 газардүүний баримт
 эрхийг иш-г хэлбэр
 /цацарил, бүрэл, хослол
 баримт
 8. Ажил хуртын
 фото акт
 9. Дунд мэдээлэл
 /ЭТЗ бүтээгч


свар,
 ганд

Фото зурсар
 батламжуулав.

Самал. Чуртс дамсар
 Дамсар амжилт
 оруулах

Бүртгэлийн дугаар ...2633...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүе.....
 2025 оны 10 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025/09/08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025/09/08

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МХС ТӨХК

Комиссын гишүүн: *У. Дарвагдорж*

*ХТБ, Н-р нэгж, 200 хүрээнд
сүрьеэ, амьсгаруулах
сүрьеэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - Арван гурван хангалтын нэвтрэмж амьсгаруулах. - Тэдгээрийн хөвдөгтэй хэсгийг хабрчигт хийж үе орохоос хамгаалж битүүлж хийв. - Тэдгээрийн нэвтрэмж нэвтрэмж FDF-г сүрьеэ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Хангалтын нэвтрэмж амьсгаруулах. - Хөвдөгтэй хэсгийг битүүлж хийв. - FDF сүрьеэ.

Бүртгэлийн дугаар ... 2033 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
Сүрьеэ
 2025 оны 10 сарын 27-ний өдөр

2025004828

ар,
нд

Санал: Үүрэг даалгаврын
дисциплиныг амжилтаар
эрүүлэх.

Бүртгэлийн дугаар ... 2633
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
... стүүл
2008 оны 10 сарын 07 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2008.09.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2008.09.16

7. Илгээлт, сургуулийн
лаг тооцоог улаахуурт
тос барилга суурьжуулах

7. Сургууль үнэ-эрхлэлийн
гөл олгоог улаахуурт
ос барилга суурьжуулах

ар,
энд



Санах:

Чуулбар даалгаврын биелэлтээр
ажилладаг оршуулах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Д. Вүрмийнхүү*

/Тамга, тэмдэг/

Д. Вүрмийнхүү | Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Д. Вүрмийнхүү*

/Тамга, тэмдэг/

Д. Вүрмийнхүү | Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.10.02

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ЗАР ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

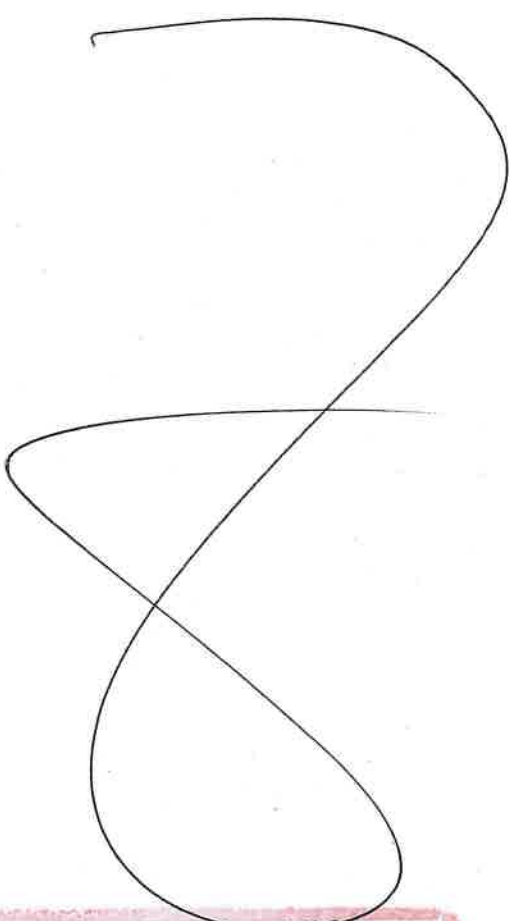
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Барилга байгууламжийн их шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй

Байгууллага: **НӨБТ**

ХУТ 1д-р хороо НХОТ

Комиссын гишүүн: **Б. Дор - Зурган-э** *Баян суурин илэрхийллийн нөхцөл*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утасны дохиоллын утас мэдэрэг, дууны мэдэрэгийг бүрэн гүйцэтгэн хийж үйлдвэрлэх /дууны хийгдсэн ороо тасалгаанд/ утас мэдэрэгийн тас авал 2. Аварг зам гарын тавиур тавигдаж хийж байрлуулах 3. Зол унтрал дөрвөлтийн хоолой хөвүүн тотио, хөвүүн солих /Балдаров тотио/ Зол унтрал дөрвөлтийн шийн /ГК/ туршилт шалгах акт тусгай дүгнэлт, орто зургаар баримт тухай нөхцөл үзүүлж 4. Тусгай дууны материалын шийжилтийг бүрэн нөхөж үзүүлж 5. Золныг үйлдвэрлэх авчир нар өдөр дүгнэлт бүрэн гаргаж өгөх 	

Бүртгэлийн дугаар ... **2633** ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүд
 2025 оны 20 сарын 27-ний өдөр

6. 201 үнтрээх автомашини
орс гары төлөвлөх ✓

Чүрэг даалгаврын биелэлтийг
албай бүлгээр ирүүлж
/Фото зурга хавсаргалах/

АУд 1д-р хороо
НХОГ

Бүлэг сургуули илэрхийлэлтэй хамт

Чүрэг даалгавар биелсэн

свар,
ганд

Бүртгэлийн дугаар 2633
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгоогч ажлын гарын үсэг
2025 оны 10 сарын 27 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөнгүй
Гарын үсэг
/Тамга, тэмдэг/
Огноо: 2025. 09. 08



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг
/Тамга, тэмдэг/
Огноо: 2025. 09. 24



гар,
анд

Бүртгэлийн дугаар ... 2633
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхр
2025 оны 10 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Мажура*

/Тамга, тэмдэг/

Мажура Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Мажура*

/Тамга, тэмдэг/

Мажура Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08



зар,
анд

Handwritten signature in the left column.

Handwritten signature in the right column.

Бүртгэлийн дугаар ... 2633 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон бүртгэлийн гарын үсэг
Сүхэ
 2025 оны 10 сарын 27 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

/ *Б. Нямсүх* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 10. 27



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

/ *С. Нямсүх* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 10. 27



ХЭА 10000000
 НХОТ ОНӨААТҮГ
 Бага сургууль, Үзүүрлэвч
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн хяналт шалгалтын

40

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийн их шинэчлэлтийн ажлыг ашигл

орлуулах комисс
 (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ХБЦАБ*

Комиссын гишүүн: *Н. Эрдэнэ төгс*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тагнаа авто зогсоолд ХБЦАБ зориулсан зогсоолыг босоо биед хөтөн тусгай тэмдэглэлтэй стандартын дагуу хий</p>	<p>Биелсэн</p>
<p>2. Тагнаа хашааруу сая хөнгөлөх налуу заманд автог нь ижил төвшинд баригдсан (үүрэг ашиг)</p>	
<p>3. Тагнаа явган хүний заманд алар 2 дүрвэр биед нь баргана ёршилтэйгээр ажил хөтөн замны салуулга хөтөн ашигтаа ашигтай дагуу хий</p>	
<p>4. Сургууль руу сая хөнгөлөх үүдэнд зогсоол налуу заманд ижил төвшинд дагуу баригдсан зурвас дагуу хий</p>	

Бүртгэлийн дугаар *2633*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эзэлтний гарын үсэг
Сүх
 2025 ОНЫ 10 САРЫН 27

2025004830


- 5. Сургуули өмчийн дэвх арь орохыг улаагуур, аунууруу свайрагь ташаагь ташаагь Мон дгалаарт зураг зохилтоого зохилтоогон дхи - зохилсан арь ороог туган улаагуур сунуурууг ташаагь
- 6. Үнэмтэн хамга хураан арь ороогуурдг д-с зохилуурь аунуурааг ташаагь баруур дех (хавилсанг)

Свар,
Танд

Өмчлөгч

Санаа
 4/9 - бтр
 амжилтын дүр
 саншб ат

Үүрэг даалгавар өгсөн
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг: 
 /# *Эрмэл* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.09.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг: 
 /# *Эрмэл* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.09.25

Бүртгэлийн дутаар *2633*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Куулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
суги
 25 онь 20 сарын 27-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
ХАНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийн их за
Синэчлэлтийн ажлыг ашигла
оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБЦ-ийн боловсрол-н газрын мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Б.Пурэвдорж

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Спорт засны цонхыг хөнгөлөлт, гаарыг асарт 2. Спорт засны тэнц (саяан бэлдсний шийт) хийн 3. Тарна талбайн тэгшлэл 4. ХБЦ-ийн үзэмжүүр? 5. 2-р давхаргыг шалгах хөдөлгөөн байхгүй болгох 	

2

Бүртгэлийн дугаар 2633
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон явдалтай гарын үсэг
 2025 оны 10 сарын 27

зар,
анд



Үүрэг даалгавар өгсөн: *ХЧД*

Гарын үсэг: *Ө. Түвш*

/Тамга, тэмдэг/

Ө. Түвш / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Ө. Түвш*

/Тамга, тэмдэг/

Ө. Түвш / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.24

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТИ
 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС
 Барилга байгууламжийн их шинэчлэлтийн ажлыг ашиг. (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Зураг төсөл зохионоч: "Бат проект" ХХК

Комиссын гишүүн: Н. Наран шимсэл

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Мэдрлэгийн баримат бүтцийн ариун цэврийн өрсөлдүүдэд хийгдсэн дүгнэлт өшөөн хяналтыг Гуримт погдон хийх.</p>	
<p>2. Мөтөлгө номлолод нэмэгдээр хийгдсэн Гариуныг авах.</p>	

Бүртгэлийн дугаар ... 2633
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтан гарын үсэг
 стуга
 2025 оны 10 сарын 27

А

эсвар,
илтанд

Бүртгэлийн дугаар 2633
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ёмолтны гарын үсэг
Орш
2025 оны 10 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Наранцогол Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 09. 18.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Наранцогол Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 09. 15.

25/063

(23)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР
 Барилга байгууламжийн их з шинэчлэлтийн ажлыг ашигла
 (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Байгууллага: "Наран гэрэл мандал" ХХК Захирагч

Комиссын гишүүн: Б.Батзориг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Мурт даалгавар Биелэлтээр авчирж авах санхүүжилт байна.</p>	

Бүртгэлийн дугаар 2633
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон бичигтний гарын үсэг
 2005 оны 10 сарын 27-ний өдөр

2025004836

вар,
анд

Бүртгэлийн дугаар 2633
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
Сүх
2025 оны 10 сарын 27 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/*Батзориг* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.09.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан.

NGM XXX

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/*Батзориг* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

ХЭО т-р т-р
Билэ судангы, цэвэрлэлийн
чонолбор.

19

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн ~~ХЯНАЛТ ШАБРАЛТЫН~~ ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийн их з. шинэчлэлтийн ажлыг ашигла оруулах комисс (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХОГ ОНВААТУГ хэмээх санхүүжилт**

Комиссын гишүүн: **Г. Буянмаргал**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гишүүдийн үүрэг даалгаврын бие эхлэлийн амлын 14 хоног бүрэн хангуулах.	- Биелсэн.
2. БТХ-үүдийн 14.3, 14.6-т заасны дагуу газрын баталгаа захирагч байгууллагад хандан ирэх.	- Биелсэн.
3. Ашиглагчтай хүлээцтэй акт үйлдэн хүлээлэх.	- Биелсэн.
4. НӨМГ-аарт хүлээлгэн өлөхөөр олгогчийн зогсоол гаргах маяг байгууллагатай хүлээлэх.	- Биелсэн.
5. Гал тогоо, шийдний өргөөний газар дүүжин хөлдөх	} Биелсэн.
6. Цахилгаан тогооны насалт газар дүүжинтэй хөлдөх	
7. Хаяг бүрк салбаруудад хөх.	
8. 0.4квн кабели зурган авчирнаас тооцоо хийлгэн дүнгээ авч.	

Бүртгэлийн дугаар ... 2633
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬСАР ҮНЭН
 Хуульсар өргөсөн амлалтын газрын үеэр
 2025 оны 10 сарын 27

2025004837

гар,
ганд

Гийшүүдгийн үүрэг даалгаврын
Биелэлтээр байнгын
хүлээн авах.

Бүртгэлийн дугаар 2633 Биечсэн.
ХЯНАЛТЫН ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2025 оны 10 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Г.Буданторма / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Г.Буданторма / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.24

