

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 12 сарын 12 -ны өдөр

Дугаар БА-340/2025 Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Налайх дүүргийн 8 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 1 давхар 1 блок, 50 (тавь) ор бүхий хүчин чадалтай цэцэрлэгийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламжид Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 11 сарын 24-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024.06.19 огноо, 0002950, БАЗГ2025/0484 дугаар;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ПИ.М-2024/12;

2.3.Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9014001040 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5369622 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Арцатын аманд байрлах Нийслэлийн нутгийн захиргааны нэгдсэн цогцолбор барилгын "Б" блок 5 давхар, 11-311632 холбоо барих утас, nhog@invest.ub.gov.mn цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Төгс шийдэл ойл ХХК оноосон нэр, 9011650118 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6146244 регистрийн дугаар, БУ15-878/25 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо, Дамдины гудамж, Жаргалантын 29/1 өөрийн байр, 80532122 холбоо барих утас, tugsshiidelo@gmail.com цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Пико инженеринг ХХК оноосон нэр, 9011812890 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6495869 регистрийн дугаар, ЗТ19-627/25 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Рашаанбулаг төв 504 тоот, 89361166 холбоо барих утас, wprism.archstudio19@gmail.com цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Нийслэлийн хүүхдийн 140 дүгээр цэцэрлэг оноосон нэр, 9067001156 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5369185 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Налайх

дүүрэг, 8 дугаар хороо, 140 дүгээр цэцэрлэг, 70232316, 99807744 холбоо барих утас, kindergarten_140@edub.edu.mn цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**;

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

-Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 1 давхар 1 блок, 50 (тавь) ор бүхий хүчин чадалтай цэцэрлэгийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга


ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
оруулах коми

байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 1 давхар 1 блок, 50 (тавь) ор бүхий хүчин чадалтай цэцэрлэгийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:



Налайх дүүргийн 8 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьгүй 1 давхар 1 блок, 50 (тавь) ор бүхий хүчин чадалтай цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газрын
Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 1 ДАВХАР 1 БЛОК, 50 (ТАВЬ)
ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс
Улаанбаатар хот

2025 оны 11 дүгээр сарын 24

Налайх дүүргийн 8 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 1 давхар 1 блок, 50 (тавь) ортой цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10:30 цагт тус газарт 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 13:00 цагт дуусав.

Хуралд:


1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Нарийн бичгийн дарга: Захиалагч
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар,
Барилга захиалагчийн хэлтсийн хяналтын инженер Х.Энхбаатар
3. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт,
аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Б.Өнөртэгш
4. Налайх дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн
Дулааны шугам сүлжээний инженер Т.Жондос
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн
Техник хяналтын инженер Б.Цэрэннадмид
6. Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн
Улаанбаатар хотын сүлжээний газрын
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар
Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Дагвадорж
7. Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ газрын
Хэсгийн инженер Ц.Үйтүмэн
8. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын
Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн
хяналтын байцаагч, /ахмад/ Б.Дөл-Эрдэнэ
9. Үндэсний төв архивын
Зураг төслийн баримтын архивч Н.Өлзийжаргал
10. Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ийн
Барилгын чанарын аюулгүй байдлын
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Жаргал
11. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо,
Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Б.Даваасүрэн
12. Ашиглалт хариуцах байгууллага,

Нийслэлийн хүүхдийн 140 дүгээр цэцэрлэгийн
Эрхлэгч
13. Зураг зохиогч, Пико Инженеринг ХХК-ийн захирал
14. Гүйцэтгэгч, Төгс шийдэл ойл ХХК-ийн
Захирал

Ж.Одгэрэл
А.Мөнхжаргал
Э.Мөнхжаргал

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Налайх дүүргийн 8 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 1 давхар 1 блок, 50 (тавь) ортой цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтанд оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.



СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилга угсралтын гүйцэтгэлийг хянаж дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангаж; гарын үсгээр баталгаажуулах.
- Гүйцэтгэгч, Барилгын тухай хуулийн дагуу чанарын баталгаа гаргах; (БТХ-ын 14.3, 14.6)

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Өнөртэгш**

- БТХ-гийн дагуу баталгаа гаргаж ирүүлэх;
- Өргөтгөлийн барилгын хойд талын аваарын гарцаар хурын ус нэвтрэх эрсдэл үүсэж байгааг анхаарч эрсдлийг арилгах;
- Барилгын урд талын нүүр хэсэгт гарсан хялгасан цууралтыг засварлаж фото зургаар баталгаажуулах;
- Ангийн угаалтуурыг засаж янзалж фото зургаар баталгаажуулж ирүүлэх;
- Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын байгууламж БНБД 31-24-22-ыг хангаж байгаа эсэх талаар баталгаа гаргаж ирүүлэх;

Налайх дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Дулааны шугам сүлжээний инженер **Т.Жондос**

- Өргөтгөлийн барилгын үзелийн өрөөний шугам сүлжээг дулаалах, хаягжуулах;
- Дулаан тохируулгын коллекторын хаалтуудыг гүйцэт нээж, халаалтыг жигдрүүлэх, хаягжуулах, шалны халаалт; халаах хэрэгсэл гэх мэт
- Узелийн өрөөнд дотоод халаалтын шугам сүлжээний схем зураг байрлуулах;

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер **Б.Цэрэннадмид**

- Өргөтгөлийн барилгын цахилгааны хувиарлах самбарын тэжээлийг ерөнхий самбарт гал хамаалагчийг гаргалгаа талаас нь засаж холбох;
- Бусад гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр;
- Цахилгааны самбарыг дулааны узелийн шугамаас тусгаарлаж аюулгүй байдлыг хангуулах;

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Улаанбаатар хотын сүлжээний газрын Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Дагвадорж**

- Хяналтын камеруудыг бүрэн ажлуулах; /5ш камер/

Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ газрын Хэсгийн инженер **Ц.Үйтүмэн**

- Гадна байрлах тус өргөтгөлөөс гарсан бохирын шугамны төв бохирын шугамруу орсон оруулгатай худагт засвар үйлчилгээ хийхэд хүн орж гарах шат хийх;

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, ахмад **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Гал унтраах даралтын хоолой техникийн шаардлага MNS6576:2016 стандартын дагуу гал унтраах хоолой хошууны тотго хомуут солих (Балданов тотго) ;
- Халаах хэрэгслийн далдлах норм дүрмийн дагуу;
- Барилгын гадна дулаалгад ашигласан материалын шижилгээний дүгнэлт нөхөж үзүүлэх БНБД 31-24-22-ын 5.2.3 дахь заалт;
- Ил далд ажлын акт фото зураг нөхөж үзүүлэх;
- Захиалагч, гүйцэтгэгч, автор нар албан бичиг дүгнэлт гаргаж өгнө;
- Ус зайлуулах суваг шуудуу хийх, үүрэг даалгаварын биелэлтийг албан бичгээр ирүүлэх (Фото зураг хавсаргах) ;
- Галын дохиоллын утаа мэдрэгчийн ажиллагааг хангуулах;

Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын архивч **Н.Өлзийжаргал**

- Хувийн хэргийн бүрдлийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдүүлэх;
- Барилга угсралтын ил, далд ажлын акт, гэрэл зураг, бараа материалын сертификатыг бүрэн бүрдүүлэх;
- Баримт бичгийн хуудас дугаарлан дотоод товъёг үйлдэх;
- Ажлын зураг болон холбогдох баримтын эх хувийг хүлээлгэн өгөх;

Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ийн Барилгын чанарын аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **Б.Жаргал**

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм, нормативын санд төлбөр төлөх;
- Ангиас гарах металл хаалганы тохиргоо хийх, шаардлагатай тохиолдолд резин солих. Цонхны үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл тохирлын гэрчилгээг ирж шалгуулах;

- Ангиас гарсан гадна довжоо хэсгийн усны гарах хэсгийг засварлах;
- Ариун цэврийн өрөөний шалны плитаны чигжээс, хана шалны чигжээс хийх;
- Гадна ханын бүтэц өөрчлөгдсөн байгааг засварлах, тайлбар ирүүлэх;
- Барилгад ашигласан барилгын материалын гарал үүсэл, тохирлын гэрчилгээг нөхөж шалгуулах;
- Гүйцэтгэгч байгууллага чанарын баталгаа гаргаж ирүүлэх;

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Даваасүрэн**

- Өргөтгөл рүү орох хэсгийн босгонд налуу зам пандус хийх;
- Ангиудын ариун цэврийн өрөөний нэг суултуурын хажуу хананд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан бариул хийх; /2 анги/
- Гадна үүдний налуу замын доод хэсгийн бариулыг хийж гүйцээх; /2 талд ижил/

Ашиглалт хариуцах байгууллага, Нийслэлийн хүүхдийн 140 дүгээр цэцэрлэгийн Эрхлэгч **Ж.Одгэрэл**

- Япон улсын засгын газрын шууд санхүүжилтээр гүйцэтгэлд тасралтгүй тасралтгүй санхүүжилт олгогдож ирсэн нь төслийг хугацаандаа, чанартай хэрэгжүүлэх маш том боломж байсан. Гэсэн хэдий ч хэрэгжилтийн явцад хүн хүч, мэрэгжлийн нөөц дутмаг, инженер техникийн бүрэлдэхүүн хэт цөөнөөс үүдэн гарсан дутагдалтай ажлуудыг тухай бүрт нь ярилцан шийдвэрлэсэн.
- Цаашдаа бид чанарын баталгааг хангах ашиглалтын хугацаанд илрэх аливаа доголдлыг шуурхай засах хариуцлагатай хандах үүргийг гүйцэтгэгч талд өгч байна.
- Санхүүжүүлэгч байгууллагын мэдээлэл бүхий самбарыг хэвлүүлж өргөтгөлийн гадна баырлуулах.

Захиалагч, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Барилга захиалагчийн хэлтсийн хяналтын инженер **Х.Энхбаатар**

- Гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Зураг зохиогч, Пико Инженеринг ХХК-ийн захирал **А.Мөнхжаргал**

- Ангын галын гарцын ус зайлуулагчыг зураг төслийн өөрчлөлтөөс харж гүйцэтгэх;
- Бусад гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр барилгыг ашиглалтад авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч, Төгс шийдэл ойл ХХК-ийн Захирал **Э.Мөнхжаргал**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээлгэн өгөх саналтай байна;

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Налайх дүүргийн 8 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 1 давхар 1 блок, 50 (тавь) ортой цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**


(А.МӨНГӨН)


ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

**НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗАР, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА**


(Б.ГАНЗОРИГ)

25/936

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХМБ*

Комиссын гишүүн: *дарга А.Монгол*

*Н.Эрдэнэ, 1400
Улаанбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгаварт бүрэн хангалттай гарын үсэгээр баталгаанд оруулах.</p>	<p>Биелсэн.</p>
<p>2. Гүйцэтгэгч Уширалын Баталгаа үрчлэх (ВТХ-ийн № 5/14.6)</p>	<p>Гүйцэтгэгчийн 2025.11.28-н өдрийн № 153/25 дугаартай албан ёсоор галарын баталгааг үрчлэв.</p>

Handwritten signature



2025007982

ЭН

МАЛТАНД

Бүртгэлийн дугаар ... 3124
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг
.....
2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А. Мөнхон/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-11-24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгагч:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А. Мөнхон/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-11

Налайя дүүргийн 140-р
уугуур малчин
өргөт малчин барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАРГАЛТЫН
ТАСАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиг
оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИЖИМ

Комиссын гишүүн: БТХУБ Б.Өмөртөвийн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. БТХ-ийн дагуу баталсан барилгын үзүүлэх.	1. 2025.11.28-ны өдрийн № 153/25 дугаартай албан ёсоор танилбар үзүүлэв.
2. Өргөт малчин барилгын хойд талын авсарын саруураар дүрэн үе, нэвтэрэх эрэгдэл үүссэн байгааг анхаарч эрэгдлийг арилгах.	2. 2025.11.28-ны өдрийн 154/25 дугаартай албан ёсоор үзүүлэв.
3. Барилгын урд талын нүүр хэсэгт гарсан хялгасан үзуралтийг засварлам фото дурлаар баталгаажуулах.	3. Биелэлтийг фото дурлаар үзүүлэв.

Бүртгэлийн дугаар 3124
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуульч О.Сүх
 2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

4. Ангийн зураг туурвал
дасам энэ гол м
фото зургаар
баталгаа туурвал
уруулах.

Б. Сургуулийн анхны
боловсролын
байгууллагын байгуулагч

БНБЦ 31-24-22-ийн
хангам байгаа эсэх
талаар баталгаа
гаргам уруулах



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Оюунтөгс / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 11. 24



4. Бичлэгтний
фото зургаар
уруулах.

Б. - Нийслэлийн хүүхдийн
140-р уугурч өрмөгийн
2025. 12. 09 -ийн
30 дугаартай албан
бичлэгтний уруулах.

- Зураг төсөл зохиох
Генерал-инженер
УХК -ийн 2025/12/01
-ийн өдрийн
25/01 дугаартай
албан бичлэгтний
уруулах.



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Оюунтөгс / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 12. 11



Бүртгэлийн дутаар 3124
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 15 -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашигл
орлуулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Налайн дурман*

Комиссын гишүүн: *Дунзан мунгон армэний эмменер Т. Могой*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① Орлогчийн борлогч үзлийн орлогчийн мунгон армэний дунсан, халмуулах.</p>	<p>- Үүрэг даалгаварын биелэлт халмуулах боло.</p>
<p>② Дунзан мунгон армэний коллекторын халмуулах үйцэг нэмж, халмуулах, халмуулах, - халмуулах шалтгаан халмуулах, халмуулах халмуулах халмуулах</p>	
<p>③ Үзлийн орлогч дунсан халмуулах мунгон армэний халмуулах халмуулах байрлуулж.</p>	

Бүртгэлийн дугаар *3124*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амилтын гарын үсэг
сүх
20*25* оны *12* сарын *15* ний өдөр

ГЭМЭ

Бүртгэлийн дугаар ... 3124

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон эзэмтний гарын үсэг

.....
2025 оны 12 сарын ... -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *DWL-ний
инженер Т. Могоц*
Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
DWL-ний инженер Т. Могоц
Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.03

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашигласан орнуулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "УБНТС" ТӨХК

Комиссын гишүүн: Б. Нарангын

108 др хороо НХОГ-ын захиргаа
140-р хорооны орголтотны барилга.


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Орголтотны барилгын захиргааны хуваарилалт самбарын төлөлт өрөөн самбарт гал дамгаалагчийн гарталга төлөлт нь зөвхөн хийгдсэн.	1. Кадрийн шалгуурт хандсан.
2. Бүтээгч гажуудыг үүрэг даалгаврын биелэлтээр.	2. Үүрэг даалгаврын биелэлт дүүрмэл.
3. Захирагчийн самбарын гал/үрэлт мугтаагаас хуваарилалт самбарын өрөөн хийгдсэн.	3. Батлагдан амлын үүргийн дээр үндэслэсэн.


Бүртгэлийн дугаар 3124
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр


2025007986

ЛН
Лалтанд

Салал: Мүрэг даалгаврын
Биелэлээр шалгалтаг
сүүлдээ.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
Ф. Мунтхууц Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
Ф. Мунтхууц Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 12. 08

Бүртгэлийн дугаар 3124
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлтын гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

5

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ҮСНАДТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МХС

Комиссын гишүүн: *М. Доржиев*

*НЭ, 8-р хороо, 40-р дугаар
шаргууламжийг өргөтгөх
орлого.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Хяналтын камер дэвсгэ гүрэн өгшигүүлэх. (5 ш камер)</i></p> 	<p><i>Хяналтын камер дэвсгэ гүрэн өгшигүүлсэн.</i></p> 

Бүртгэлийн дугаар *3129*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгоом амлалтын гарын үсэг
Орлого
 2025 оны 12 сарын 13-ний өдөр
2025007987

4

АЛТАНД

Анхны: Ч.Төгсбаяр
Бие алтныг ашиглахад
оржлох

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Ч.Төгсбаяр Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2005. 11.04

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Ч.Төгсбаяр Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2005. 12.02

Бүртгэлийн дугаар ... 3124

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

2005 оны 12 сарын 15-ний өдөр

Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэгт БАРИЛГА ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг оруулах коми

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Алсанд УСУТ*

Комиссын гишүүн: *У. Тугум*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Тогна байрлах тус оригт хөвдөр Карсан Бохорын Шугам нь Төв түү бохорын шугамруу орно орундматд дугаарт Завар үеэсөөс Хөвдөг хүн орно Керат шат Тус Хөвдөг</i></p>	<p><i>Тус даалгаврын Биеэлтний хамт Бооме</i></p> <div data-bbox="829 1541 1433 1854" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>3124</i> ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг <i>Тугум</i> 20<i>25</i> оны <i>12</i> сарын <i>15</i> -ний өдөр</p> </div>

БН
ХЛЛАНД

Бүртгэлийн дугаар ... 3124 ...
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 12 сарын 15 -ний өдөр


Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.03

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Байгууллага: **НДБТ**

Комиссын гишүүн: **а/х Б. Цол-Эрдэнэ**

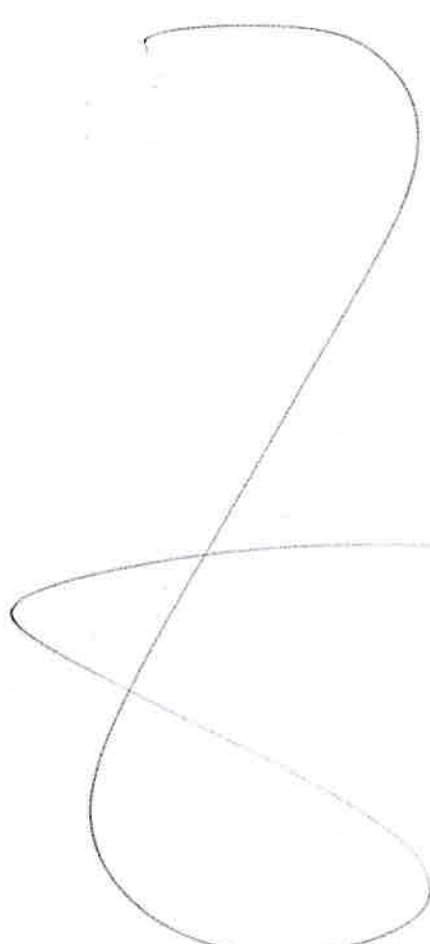Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>НД 8-р хороо НХОГ 50 ортой илэрхийллийн барилга</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Үеэ ултраас дарагчлон хоолой. Техникийн шаардлага MNS 6576:2016 стандартын дагуу гол ултраас хоолой хошууны тэнгэ хошум солиа /Бүдгэлтэй тэнгэ/ 2. Хэсэг хэсгийн дарагчлон нери дүрмийн дагуу 3. Барилгын газра дарагчлон авчирсан материалын илэрхийллийн дүрмийн хоолой үүсгэж /БНБД 31-14-22-ийн 5.д.3 дахь зөвөлт/ 	



Бүртгэлийн дугаар **3124**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эхэлтний гарын үсэг
сүх
 2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

2025007989



- 4. Үш дугь ажлын сэлт фото зураг нөлөж үзүүлнэ ✓
- 5. Замчлалт гүйцэтгэл авчир нар албан дугийн дүрмэл гаргем өгнө. ✓
- 6. Үс зайлуулса сүлс шүүнү жиде Чурт даалгаварын биеллэлт албан дугийн үзүүлнэ /Фото зураг хавсаргала/ ✓
- 7. Талын даалгаврын үнэс шүрэлтийн амжилтаг гэмүүлнэ ✓

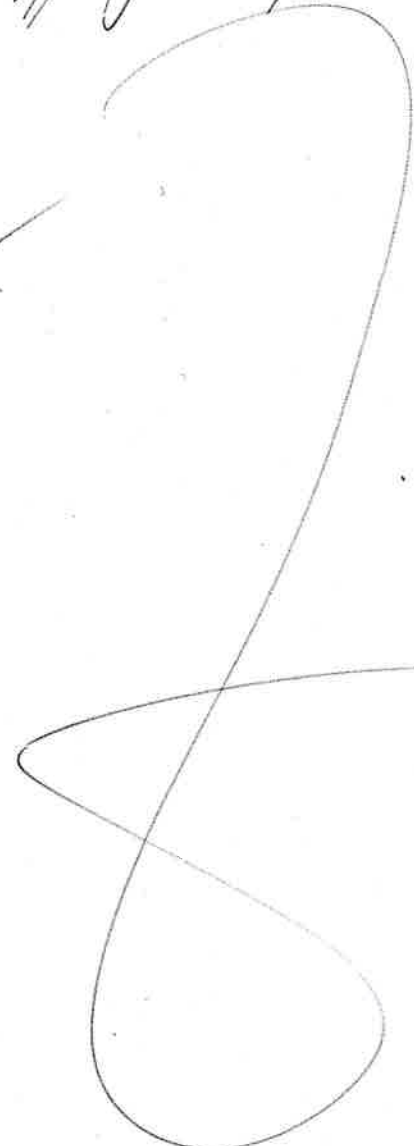

Чурт даалгавар Биелсэн

таланд



НД 8-р хороо
НХОГ
Э ортой хуульчилт үзүүлнэ

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 24

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 11 сарын 25 -ний өдөр

4. Архив үзүүлэх зорилгоор
шилэмэ хуудасны
алхам тийш, хама
шилэмэ гэрээг хийв.

4. Засвар хийсэн.

ЫН
ТГЛТАНД

5. Гэрээ хийж
орхон орон нутаг
дунд з засвар хийж,
гэрээг үргэлжлүүлж.

5. Архивийг зөвхөн үзэх
шилэмэ хийсэн.

6. Бүрэлдэхүүн хэргийг
дүн шинжилгээний
хэрэг үүсгэн, гэрээг
үргэлжлүүлж
шилэмэ хийсэн.

6. 1 8076 нөхөн
шилэмэ хийсэн.

7. Гудамж дунд зорилгоор
гэрээг зөвхөн үзэх
гэрээг үргэлжлүүлж.

7. Чамрын зөвхөн үзэх
гэрээг хийсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



/Тамга, тэмдэг/

1 6/11/2025. Гарын үсгийн тайлал

1 6/11/2025. Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 24

Огноо: 2025. 12. 09.



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ТАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиг
оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хуртэйм

Комиссын гишүүн: Б. Диваасурт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Өргөтгөл рүү өргөх хэсгийн боловцол налуу зочнаар хийх.	Биелсэн.
2. Амьсгийн АЦӨ-ний ин сууцнуудын хамар ХВХ-дээ зарцуулсан барилгыг хийх. (2 амьсгийн)	Биелсэн.
3. Тэгш чухал налуу зочны дээр хэсгийн барилгын хийгч хүлчлэх (2 тал ивэн).	2026.5 сард хийгч дүүсгэхэд албан ёсоор баганаажуулан болно.

Бүртгэлийн дугаар ... 3124 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

лтанд

Бүс газрын дугаар 3124
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өрхилтний гарын үсэг
Сүх
2025 оны 12 сарын 15 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Давансүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Давансүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.01.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАХ КОМИСС
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Нор үзэвэрлэлийн эрхлэл*

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Япон улсын ЗТ-ын шууд санхүүжилтээр ашигласан тасралтгүй санхүүжилт олгодог ирэн нь төсвийн хууцаандаа, чанартай эрэлтээр өөрсө болсон байсан. Эхт хэдий ч эрэлтийн эвцэг хүр хүр, мэрэг-мөн хооц дутмал, инженер техникийн бүрэлдэхүүн хэм цооц байснаас үүдэн гарсан дутагдалтай ажлууд тухай бүрт нь үршигчид мэдвэрлэсэн.</i></p> <p><i>1. Цаашид бид чанарын баталгааг хангал</i></p>	<p>Бүртгэлийн дугаар <i>3124</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг <i>Сүх</i> 20<i>25</i> оны <i>12</i> сарын <i>15</i>-ний өдөр</p>

2025007993

ашиглалтын хураанад
сүрж амиваа
доголдоос шуурхай
засварлах, хариуцагдах
хандах үүргийн
үржтэйгээ охи
байна.

2. Санхүүжилт
байгууллагын
мэдээлэл бүхий
салбарыг хэвлүүлж
орлогын гадна
байрлуулах.

Чуулбарын
биелэлтэр ашиглагдах
орлуулах саналтай
байна.

1. Ашиглалтын
явцад гарах
эргэлтэй
асуудлыг шуурхай
бүр ирж ашиглан
ашиглахаа
үржтэйгээ
хувьд батлан
амласан.

2. Усны хамшрын
дүрвэл гарсан
олгоор салбарыг
хэвлүүлж.

Биелсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Ж.Одгэрэл / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Ж.Одгэрэл / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.24

Бүртгэлийн дугаар 3124

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон өмжлтийн гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

12

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



ХЯНАЛТАД АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
БАРЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГ
ОРУУЛАХ КОМИСС

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зургаан дахиад Тийко Инженеринг ХХК*

Комиссын гишүүн: *Д. Мөнхфаргал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
	

Бүртгэлийн дугаар ... *3124* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өгөгсөн амжилтны гарын үсэг
Сүх
 2025 оны 12 сарын 15 -ний өдөр

2025007994

①. Агийн гол-и
сарг-и үс дайгуу
а-а зураг төсөл
и нэрлэлтөөс
харф үндэстэн

элтанд

Бусад галч үгс-и
үүрэг даалгав-и-л
Төлөөлгөөр Тайла-и
ашигтайг абаа
санаатай Тамга.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А. Монхфурал Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 11. 24.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А. Монхфурал Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 12. 01.

Бүртгэлийн дугаар 3124

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амилтны гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

13

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ
ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Гүйцэтгэл*


Комиссын гишүүн: *Төгс шийдэл дийл ХХК Э.Мөнхжаргал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссон гишүүдийн У.Д.Б-ээр Ажлын гэрээ олох санаатай байна.</i></p>	<div data-bbox="798 1384 1412 1697" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>3124</i> ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон амжилтны гэрэн үсэг <i>О.М.Я</i> 2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр</p> </div>

2025007995

ЛН

Талтанд



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

/Мөнхнаргал/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

/Мөнхнаргал/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.28

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашигуулах комисс
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Байгууллага: *НХС*

Комиссын гишүүн: *Д. Энхбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Тусчүүдгээр үүрэг даалгавар өгсөн бие эхнэрт байнгын ашиглалтад оруулах санхүүжилт байна.</i></p>	<p><i>үүрэг даалгавар биелсэн</i></p> <div data-bbox="778 1384 1396 1729" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>3124</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон өмгөлтний гарын үсэг</p> <p><i>Сүх</i></p> <p>2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр</p> </div>

Н

алтанд

Бүртгэлийн дугаар 3124

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: 2025.11.24

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.12.08

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг а оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УТА

Комиссын гишүүн: Н. Вушимиртал

НЭГЭР ДӨРӨӨ
НЭР/УУРГААГИЙН
ТӨРӨГӨӨ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Кувшин хөршөөн дүрхлөгт нийтлэг жагсаалт бичгээр дүрэн дүрдүүлэх	Биелсэн
2. Ил, салу амлогч акт, нэрэн зураг, дараа мөдөрмөдөрт шертэйгээр дүрэн дүрдүүлэх	Биелсэн
3. Даршил бичгийн хуурай зураглал, гэгээг төлөөт үндэс	Биелсэн
4. Амлогч зураг бөмбөн хөтөлгөөл даршил бичгээр хуурай дүрхлөгт хуурайг төлөөт	Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар 3124
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХҮҮДАСАР ҮНЭН
Хуудсар өгсөөн амлогч гарын үсэг
.....
2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

ЭН

Лалтанд

Бүт. з.ийн дугаар 3124..
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон шалтны гарын үсэг
суга
 2025 оны 12 сарын 15 ний өдөр

*Урэн залгаварын амлалт
 Намтгалдаг оруулах
 ажилтай байсан.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *Н. Огюм*
 /Тамга, тэмдэг/
Н. Огюм / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 11. 24

Үүрэг даалгаврын амлалт өгсөн:
 Гарын үсэг: *Н. Огюм*
 /Тамга, тэмдэг/
Н. Огюм / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 12. 15

Handwritten notes and signatures in a box:
 Огноо: 2025. 12. 15
 Гарын үсгийн тайлал
 Н. Огюм
