

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 12 сарын 25-ны өдөр

Дугаар

БА-353/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 1 блок 100 (Нэг зуун) ортой цэцэрлэг, 180 (Нэг зуун наян) суудалтай бага сургууль бүхий хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжид Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025.02.14, 2025.06.16 огноо, 0002083, 0002882 дугаар, БАЗГ2025/0062, БАЗГ2025/0450;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр, дугаар: DC-23-A3-02, БП-12/72;

2.3.Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011122089, регистрийн дугаар: 5369622, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Наадамчдын гудамж, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын цогцолбор барилга Б блок, холбоо барих утас: 11-327199, цахим хаяг: www.ulaanbaatar.mn

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Констант констракшн ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011885432, регистрийн дугаар: 5991781, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ35-455/24, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Бага тэнгэрийн ам /13314/, Дүнжингаравын 309 тоот, холбоо барих утас: 99111149,

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Тамга уул ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011103070, регистрийн дугаар: 5146968, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ11-126/22, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9 дүгээр хороо, Алтайн 34, 7А 703 тоот, холбоо барих утас: 88115679,

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Бат проект ХХК Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011113047, регистрийн дугаар: 2773643, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ19-583/22, Хаяг:

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бага тойруу-26, 1-213 тоот, холбоо барих утас: 99249997,

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх боловсролын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9070002036, регистрийн дугаар: 5224497, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо, Баянгол, Засаг даргын тамгын газрын байр 111 тоот, холбоо барих утас: 70171110, 99006520

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан;**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

-Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 1 блок 100 (Нэг зуун) ортой цэцэрлэг, 180 (Нэг зуун наян) суудалтай бага сургууль бүхий хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;



б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1.Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 1 блок 100 (Нэг зуун) ортой цэцэрлэг, 180 (Нэг зуун наян) суудалтай бага сургууль бүхий хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар 1 блок бага сургууль, цэцэрлэгийн барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын
Газар ОНӨААТҮГ-ын Барилга захиалагчийн
хяналтын хэлтсийн дарга



(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 32 ДУГААР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 2 ДАВХАР 1 БЛОК БАГА
СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс
Улаанбаатар хот

2025 оны 12 дугаар сарын 05

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 1 блок бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 12 сарын 05-ны өдрийн 08:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 10:30 цагт дуусав.

Хуралд:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | А.Мөнгөн |
| 2. Хяналт шалгалтын газрын, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч | Ж.Жүгдэрмаа |
| 3. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч | Э.Цогзолмаа |
| 4. Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер | Ц.Билэгт |
| 5. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны инженер | О.Болорцэцэг |
| 6. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн | Ц.Дагвадорж |
| 7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч | Б.Дөл-Эрдэнэ |
| 8. Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн | Б.Жаргал |
| 9. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын архивч | Н.Өлзийжаргал |
| 10. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны хүртээмжийн үнэлгэний ажилтан | Б.Ганбаатар |
| 11. Ашиглагч, Сонгинохайрхан дүүргийн Боловсролын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | Б.Бадамханд |
| 12. Зураг зохиогч, Батпроект ХХК-ийн захирал | Н.Наранчимэг |
| 13. Гүйцэтгэгч, Констант констракшн ХХК-ийн захирал | Ц.Ариунаа |

14. Захиалагч, Нийслэлэийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер

Х.Орхонсэлэнгэ

15. Гүйцэтгэгч, Тамга-Уул ХХК-ийн захирал

Н.Баярмаа

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 1 блок бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын гүйцэтгэлийг шалган ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.



СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварыг бүрэн хангах, гарын үсгээр баталгаажуулах
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх барилгын тухай хуулийн 14.3, 14.6 д заасны дагуу

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ж.Жүгдэрмаа**

- Спорт заалны металл дам нуруу баганатай холбосон зураг, акт хянуулж с төмөр алхам хучилтын зураг төсөл, усны хаялага (тэвш хэлбэр) зурагт тусгасан эсэх гүйцэтгэл хянуулах
- Барилгын суурийг 2017 онд гүйцэтгэсэн байдлыг тэмдэглэсэн (улаан журналд) байдлыг хянуулж ШУТИС-ын зөвлөмж 1-Б багана арчла, шугам суурьт бүс хийсэн гүйцэтгэл акт, фото зураг хянуулах
- Цэцэрлэгийн ариун цэврийн шалны түвшин ангиас 5см өндөр байгааг налуу болгох, шийдвэрлэж хариу өгөх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Цахилгаан тогооны өрөөний шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийг хаягжуулах
- Гадна дулааны худгийг цэвэрлэх

- Холигч үзелийн шугам хоолойг дулаалж, ТАД -ын дагуу хаягжуулах
- Дулааны зангилаа угсарсан актыг баталгаажуулах
- Барилгын дээвэр дээрх агаар сэлтгэлтийн шахтны малгайвчнаас бохирын үнэр гаргагч хоолойг өндөрлөх, дулаалга малгайвч хийх тор сетка татах
- Цэцэрлэгийн гал тогооны агаар сэлтгэлийн хэсгийн дуу чимээг намасгах стандартад нийцүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлж, тохируулах чанарын баталгаа ирүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Ц.Билэгт**

- Шинэ хэрэгчлэгийн залгах зөвшөөрөл бичиг
- Тогооны барилгын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих протокол
- Дизель генераторын холболт гүйцээх
- Дэд өртөө, дизель генератор, барилгын 0.4 кв кабель шугамын холболтын схем
- Дизель генераторын ажилгааг шалгасан ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагч акт
- Өрөөнүүдийн разеткаын өндөр 1,8 м хүрээгүй
- Цахилгааны самбаруудад бирк, схем, плакат хийх
- Актуудыг бүрэн баталгаажуулах
- Дизель генераторыг АЗБТ -д бүртгүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Дагвадорж**

- Цэцэрлэгийн хяналтын камер, зарлан мэдээлэл системийг бүрэн ажиллуулах
- 24 инчийн дэлгэц 2 ш суурилуулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Б.Жаргал**

- Барилгын тухай хуулийн дагуу заасан норм, нормативын сангийн төлбөрийг тооцуулж төлөх
- Анги бүлэгт хана тод өнгөөр хийгдсэн ханыг цайвар шаргал өнгөтэй болгох
- Чанарын баталгааг дээвэр, гадна зам талбай зэргийг ашиглагчид гаргах
- Спорт заалны шал шаардлага хангахгүй байна.
- Барилга д ашигласан барилгын материалын гарал үүсэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, лаборторын дүн зэргийг нөхөж шалгуулах
- Халаах секцийг хамгаалах хашлага халт хийх
- Анги танхимын цонхонд хязгаарлагч хийх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **О.Болорцэцэг**

- Хэрэглээний харуун усны шугамд тоолуур тавих
- Гадна цэвэр бохир усны шугам, цооног мэдээлэлийн санд оруулах
- Гадна бохир усны гаргалгаа худагт ф 1500 байх ёстойг ф 1000 мм худаг хийгдсэнд авторын дүгнэлт гаргах
- Бохир усны гаргалгаа шугамд үл буцах суурилуулах
- Гадна бохир усны шугам угсралтын далд ажлын акт үнэн зөв бичиж дахин баталгаажуулах
- Холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэн гэрээ хийх
- Гадна цэвэр усны худагт цэвэрлэх, шугам сүлжээг дулаалах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын архивч **Н.Өлзийжаргал**

- Ил далд ажлын актыг бүрэн баталгаажуулах
- Талбайн журналыг баталгаажуулах
- Баримт бичгийн бүрдлийг бүрэн бүрдүүлэх хуудас дугаарлан дотоод товьёг үйлдэх
- Барилгын эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны ажилтан **Б.Ганбаатар**

- Гадна авто зогсоолд ХБИ -д зориулсан зогсоол хийнэ
- Цэцэрлэгийн барилгын үүдэнд байгаа ажилчидын суултуур, угаалтуур шүршүүрт БНБД-32-23-22 норм стандартын шаардлага хангасан туслах бариул суурилуулна
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, хошууч **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Галын дохиололын утаа мэдрэгчийн таг авах
- Гал унтраах дотор даралтад цэгийн ГК ын хоолой хошууны тотго хомут солих, туршин шалгасан акт видео бичлэг үзүүлэх
- Гадна дулаалгад ашигласан материалын шинжилгээ лаборторын дүгнэлт нөхөж үзүүлэх
- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргаж өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл **Б.Бадамханд**

- Спорт заалны халаах хэрэгсэлийн урдуур хамгаалалт хийх
- Анги танхимын, спорт заалны үзүүр ирмэгтэй буланд хамгаалалт хийх, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Бат проект-ийн захирал **Н.Наранчимэг**

- Шатны бариулын дунд хэсэгт хийгдсэн бариулыг авах
- Хөндлөн чиглэлд хийгдсэн хэсэгт хүүхэд авирахаас хамгаалж хаалт хийх
- Сургуулийн гал тогооны хэсэгрүү орох хэмэгт шатанд гарсан нүхийг бөглөх (шатны хажуугийн хана)
- Угаалтуурт усан түгжээ хийх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

танд

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер **Х.Орхонсэлэнгэ**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч Констант констракшн ХХК-ийн захирал **Ц.Ариунаа**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Гүйцэтгэгч Тамга-Уул ХХК-ийн захирал **Н.Баярмаа**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 1 блок бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН БАРИЛГА
ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

8024041948
(А.МӨНГӨН)

Нийслэлийн Хөрөнгө
Оруулалтын Газар
(Б.ГАНЗОРИГ)

25/12/99

ХЯНАЛТ ШАЛ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХШГ**

Комиссын гишүүн: **Дарга. А.МӨНГӨН**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангах, гарын үсгээр баталгаажуулах.</p>	<p>1. Гишүүдийн үүрэг даалгаврыг хангун баталгаажуулсан.</p>
<p>2. Гуримтат хууцаарын баталгаа олгох ажил юу ч үрчлэх. (ФВХ-и 14.3, 14.6)</p>	<p>2. Констант констракци ХХК-ний 2025.12.19-ны №1220/25 хугаартай албан ёсоор гарын үсгээр баталгаа үрчлэн.</p>

Бүртгэлийн дугаар ...**3251**...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон зөвлөлтийн гарын үсэг
Сүх
2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008631

ЛТЫН

Шийгвэлтанд
ХС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А.Могооч

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025-12-05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А.Могооч

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025-12-24

Бүртгэлийн дугаар 5257

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүхр

2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХШГ. БТХУАБ*

Комиссын гишүүн: *Ж.ЖУГДЭРМЭЭ*

*Солонго хайрхан
Нутг 32р хороо 280
Хуржийн цэцэрлэг бага
Сүхрүүр цогцолбор дэвхд
Зворонг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Спорт заалнаг металл жем нэрүү батанатай холдсон үзвэл зураг, акт хянгынэ Стомор ахалл стувил хүрлелтэй зураг тосол, үйлэ халлага (Товчи хэвэр) зурагт тусгалаг жем үрлелтэй гол хянгынэж.</p>	<p>1. Спорт заалнаг металл жем нэрүү, стувилэ гэрлеллэ хүрлелтэй фото зураг үрлелтэй батпроект ХХК-ийн БА-5/хүүдэе, 1-38 Эксперт баталсан зурагт тэвчи тусгалагч байгааг хянгэ.</p>
<p>2. Барилган сүүрийн дорноу үрлелтэй жем байрлан тэвчлэлтэй (жаан нуурау) байрлан хянгынэ шүүтис-ийн зовлолелэ 1-6 багана арлаах шүүтислэ шүүтэй бүс хийлт үрлелтэй гол акт фото хянгынэж.</p>	<p>2. Барилган шүүтислэ сүүрийн бетон үрлелтэй арматурлалан акт, жем барилган анхи үрлелтэй жем тэвчлэлтэй зовлолеллэй гэрүү үрлелтэй жем байрлан тэвчлэлтэй байгааг хянгэ.</p>
<p>3. Цэцэрлэгт ариун цэврийн үйлэ тэвчлэл амжис 5м өгүүр байгааг Налуу болло шийгү вэрлэлэ хянгынэж.</p>	<p>3. Цэцэрлэгийн ариун цэврийн үйлэ тэвчлэл тэвчлэлтэй Налуу ам жаралг шийгү вэрлэллэй хянгынэ баталг айнуулан.</p>

Бүртгэлийн дугаар *345*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг
Сүхрүүр
 20*25* оны *12* сарын *25* -ний өдөр

2025008632

Үүрэг даалгаврын
Биеэлэлтэр амжилтаар
оржиг сангай
тушаар.

ЫН

Иглалтанд

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Амжилтаар*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг:

М. Хурраава

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.05.

Үүрэг даалгаврын биеэлэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг:

М. Хурраава

Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025.12.22

Бүртгэлийн дугаар ...3487
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг
сүхлэ
2025 оны 12 сарын 22 -ний өдөр

сая, сур тусгай ...
заншлагатай 280 хүүхд
цаурлог, бага сургуулийн
барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХШТГ*

Комиссын гишүүн: *Э.Цогзолмаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Цахимгаан тогтоно ороонийг иурал хоолой, тэнэг тохво-роонийг хаялжуулах.	- Биелет. (Фото зураг)
2. Гадна дугаана худгийг цэвэрлэх, иуралыг дугаан онийн сууцаар ороох	- Биелет. (Фото зураг)
3. Камыг үзлийн иурал хоолойг дугаан, ТАН-и дагуу хаялжуулах.	- Биелет.
4. Дугаана заншлаа үсвэрлал аяаг багасгаа-жуулах.	Багасгаажуулав.
5. Цуурлалын алийн хийлх аргаснд хаял хаялгалалт алийн	- Биелет.
6. Барилгын дэвэр дээрх АС-и шахна малайвчнаас бохирил иур гаргал хоолойг ондоглох, дугаана малайвч хийлх, тор сетна татах.	- Биелет.

Бүртгэлийн дугаар ...*3251*...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон адилтны гарын үсэг *сүх*

200*25* оны 12 сарын *15* -ний өдөр

2025008633

7. Үндэрсний нэг тоонон
 АС-и сэрэглэл өгсний
 дүү шийтгэл хамаргах, стандарт
 тус нийгүүлж.

8. Барилгын зураг хүргэлийн
 дагуу зургуурлал, төхирүүлэх
 хангамж баталгаа үзүүлж.

Билэвт.

— 2005.12.18-на 211 тоот
 албан ёсоор баталга
 үзүүлж.

ТАЛТЫН
 Р
 Иг ашигласанд
 МИСС

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/
 /*А.Урзулмаа* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2005.12.25




Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/
 /*А.Урзулмаа* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2005.12.25



Бүртгэлийн дугаар 3251
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчилтний гарын үсэг
Сүх
 2005 оны 12 сарын 25 ний өдөр

4.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБ ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

Комиссын гишүүн: Ц. Билигт.

ХНД 02 хөрөө

200 дугаар үзүүлэлт үзүүлэлт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэл
1. Шинэ хэрэгсэлд зориулж зориулалтын бичиг	2015/11/02-нон өдөр 25-00418-01 дугаартай зориулалтын бичиг
2. Тогсолов барилгын үзвэрүүдийн нэрүүнд хамтын протокол	"Декор" ХХК-ийн 2015/08/03-нон 20150353 дугаар үзвэрүүдийн нэрүүнд хамтын протокол
3. Дугуй ширээний хөндөг үзвэр	Дугуй ширээний хөндөг үзвэр
4. Дугуй ширээ, дугуй ширээ, бүрхүүн 0,4н В кабели шилжүүлэх ажиллагаа	Дугуй ширээ, дугуй ширээний хөндөг үзвэр



2025008634

ТАЛГАЙН
ийг ашиглалтанд

5. Дууны ширээгээр
ашигласан шалгалт
амжилт, үржлийн,
захиралт акт

Дууны ширээгээр
Бүрэн бүтэн баарын
шалгалт акт

6. Өргөмжлөлийн
розеткайн үүрэг
1.8м хүртэл

"Комстат констракшн"
ХХК-ийн 2025/12/23-н
1234/25,

7. Үндэсний мэдээлэл
Бүрэн, өрхөн, мэдээлэл
Хийх

"Дууны" ХХК-ийн
2025/12/23-н өргөмж
243/2025 дугаар
А-ийн бүтэн

8. Анхны бүтэн
бүтэн шалгалт

9. Дууны ХХК-ийн бүтэн
Тайлбар: Үүрэг захиралын
Мэдээлэл мэдээлэл
өргөмж

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025/12/05

Огноо:

2025/12/23

Бүртгэлийн дугаар ... 3257
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
2025 оны 12 сарын 23-ий өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГ.
 ГАЗАР
 Барилга байгууламжийг
 оруулах ком

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК*
 Комиссын гишүүн: *Ц. Дагвадорж*
СХД 32-р хороо, 280 хувьдсан цахуур, бага сургууль бүрэлдэ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- Цахуурын хяналтын кассер, зурган шийдвэрлэлтийг бүрэн амжилтуулах.</i></p> <p><i>- Нийгэмийн байрны тус бүр сургууль.</i></p> <p><i>Кассер Дэлгэр Жин</i> <i>Бетер 18 м</i></p>	<p><i>- Кассер, зурган шийдвэрлэлтийг амжилтуулах.</i></p> <p><i>- Дам сургууль.</i></p>


Бүртгэлийн дугаар *3257*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг
Сугла
 200... оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008635

ТЫН

Шиглалтанд

С



Сэтгэл: Чирм Оюунгарын
Басалтарт амалд
эрүүл.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Ч. Доржсүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.12.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Ч. Доржсүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.12.17

Бүртгэлийн дугаар ... 3257
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар бүтээгдсэн амлалтын гарын үсэг
.....
2025 оны 12 сарын 15 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
оруулах коми

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Уд сувгийн удирдах газар*

Комиссын гишүүн: *О.Болорцэцэг - 99060923*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1) Хэрэгцээтэй аажуук үеийн шугамыг тоолуур сурталуулах.</i>	<i>- Биелэсэн (фото зургаар)</i>
<i>2) Тэгш үеэр боалур үеийн шугам, цэвэрлэг ажилыг ажилуу оруулах.</i>	<i>- 2025.12.19-нд ажилуу оруулаа.</i>
<i>3) Тэгш боалур үеийн гэрээлгээг хугацаа 41500 байцаа "сэтгэл" 41000000 хугацаа ажилуу оруулах зургаар гэрээлгээ.</i>	<i>- Дураат хак-ны 2025.12.22-ны өдөр ажилуу оруулаа.</i>
<i>4) Боалур үеийн гэрээлгээг хугацаа 41500 байцаа "сэтгэл" 41000000 хугацаа ажилуу оруулах зургаар гэрээлгээ.</i>	<i>- Биелэсэн. (фото зургаар гэрээлгээ.)</i>

Бүртгэлийн дугаар *3257*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон хэргийн газрын үсэг
Орш
 2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008636

5.) Тэгнэ баяр усна
шүрэн үзгэрлэвч
данд ахныа акт үнэ
гэв бичигс гэрэл
баталгаажууна.

- Бичлэгн. (фото зургаар)



6.) Долоогдч бичиг
баримт бүрдүүлсн
гэрэл ахныа.

- Тэгнэ үнэ акт
2025. 12. 22-ны өдрөөн
№214 тоот албан
бичиг ахныа.

7.) Тэгнэ үнэ үснэ
ахныа үнэ үнэ, шүрэн
сүрэнгээ зургаар.

- Бичлэгн. (фото зургаар)

санал; үнэ гэрэлгэв-
рын бичлэгт гэр бичлэг-
гын ахныа

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: О. Зориг

/Тамга, тэмдэг/

О. Зориг Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: О. Зориг

/Тамга, тэмдэг/

О. Зориг Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 23



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ШАЛГАЛТ
ТАЗАР


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

байгууламжийг а
оруулах комис

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НОВГ*


Комиссын гишүүн: *Б. ДӨЛ-ЭРДЭНЭ*

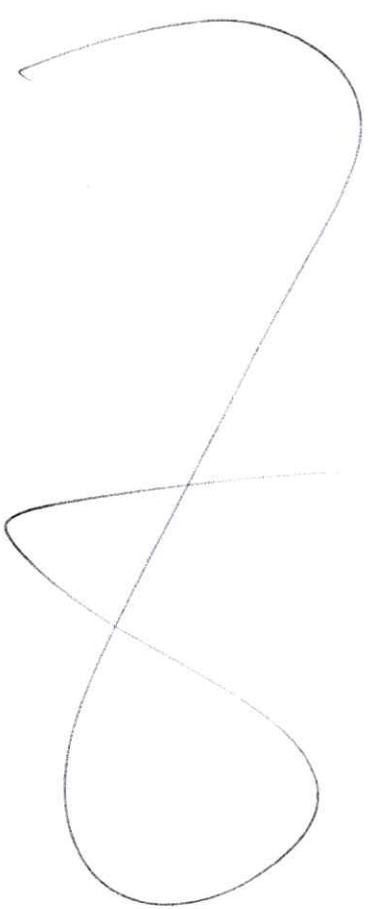Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СХД Зэр хороо</i> <i>НХОГ</i> <i>280 хууцгийн материал, бага</i> <i>сурвалжийн баримт</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Талын дохиоллын утга</i> <i>мэргэлийн тал авсан ✓</i> <i>2. Тал унтралай дотор дөрвөлтэй</i> <i>ийний ГК-ны хэсгийг хөндүүлж</i> <i>төмөр хашуу солиж (хөндсөвчтэй)</i> <i>турийн өслөсөн алт бүлэг (алт үзүүл)</i> <i>3. Тэгнэ дүрэмд ашигласан</i> <i>материалын шилжүүлж</i> <i>лабораторийн дүрэмт нөхөж</i> <i>үүзүүлж ✓</i> <i>4. Зохиолчийн нэгдсэн дүрэмт</i> <i>гаргал олоа ✓</i> 	

Бүртгэлийн дугаар *3257*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгоосон өмчлөлийн газрын үеэ
сзул
 2005 оны 12 сарын 15


2025008637

Ура дамларын дамгийн
 өдөр өдөр үржих
 /Фото зураг хавсаргах/




СХД 32-р хороо
 НХОГ
 280 хүрээний үйлчилгээ, ОУС
 суурьшил дарица

Ура дамлар биелсэн



Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 /Б. дор-Зунт / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 12. 05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 /Б. дор-Зунт / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 12. 22

Бүртгэлийн дугаар 3257
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өлгөөсөн амжилтгүй гарын үсэг

 2025 оны 12 сарын 25 ний өдөр

УМ. 32р мөрөө.
280 нүүрсиндээ цэвэрлэн,
буса суургууль

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг оруулах ком

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *БХТ.*


Комиссын гишүүн: *Б. Жаргал.*



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилга гүйцэтгэх журмын дагуу нэрлэн барилгачид ажлын гүйцэтгэл дүрмийг тусгаж үзүүлэх;</p>	<p>1. Нэрлэн барилгачид ажлын гүйцэтгэл дүрмийг тусгаж үзүүлэх.</p>
<p>2. Ажил, бүтээлт, ажлын гүйцэтгэл, ажлын хариуцаж байгаа ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл;</p>	<p>2. Ажил гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл.</p>
<p>3. Умарын дагуу ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл.</p>	<p>3. Ажил гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл.</p>



Бүртгэлийн дугаар *3257*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг
Сүх
 2005 оны 12 сарын 25 -ний өдөр

2025008638

<p>4. Спорт газрын <u>мөн</u> <u>мөрдүүлсэн</u> <u>гэн</u> <u>гэх</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u>.</p> <p>5. Үүрэг <u>гү</u> <u>амжилт</u> <u>байсан</u> <u>т</u> <u>амжилт</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u>, <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u>, <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u>.</p> <p>6. Хамгаалсан <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u>.</p> <p>7. Амжилт <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u>.</p>	<p>4. Зохиолын, <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u>.</p> <p>5. Үүрэг <u>гү</u> <u>амжилт</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u>.</p> <p>6. Хамгаалсан <u>гүр</u> <u>байсан</u>.</p> <p>7. Хамгаалсан <u>гүр</u> <u>байсан</u> <u>гүр</u> <u>гүр</u>.</p>
--	--



Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 / Б. Байар / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 12. 05.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 / Б. Байар / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 12. 22.

Бүртгэлийн дугаар 3187
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг
 2025 оны 12 сарын 25 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг оруулах коми

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МОНГОЛЫН ТЭРГЭНЦЭРТЭЙ ИРГЭДИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОЛВОО.*

Комиссын гишүүн: *Б. ГАНБААТАР.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. <i>Авто зогсоолд ХБХ-н машинг зориулсан зогсоол шинэ.</i></p>	<p><i>Хуунаас умураг хийж албан бичиг өссөн</i></p>
<p>2. <i>Цэвэрлэлийн барилгын үүдэнд бага ашигтай ариун цэврийн өрөөний суурингуур, угаалтнуур, шурингуурт бага сургуулийн ариун цэврийн өрөөний суурингуурт шурингуурт БНБД 32-23-22 нөхөн стандартын шаардлага хангасан турлах барилгын суурингуураа</i></p>	<p><i>бичиг зуршил гаргав авчварга.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *3217*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг

снлн

2007 оны 12 сарын 15-ний өдөр

2025008633

ТЫН

Иглалтанд

Handwritten signature or mark.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Тамбаатгар Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 05.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Тамбаатгар Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 11.

Бүртгэлийн дугаар ... 3157
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
луулбар олгосон шалтганы гарын үсэг
2025. 12. сарын 25-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН БАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *СХД, Боловсролын хэлтсийн дарга.*

Комиссын гишүүн: *Б. Бадамхана*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1) Спорт заалны тасарны үрдүүр хамгаалалт хийх.</p> <p>2) Анги, танхим, спорт заалны үрдүүр ирмэгтэй буланг хамгаалалт бийт, хууцсан ажлын үйл байгуулалт хамгаал.</p>	

Бүртгэлийн дугаар *3157*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНӨН
 Хуулбар олдсон ажлын тэрийн үеэ:
Сүх
 2025 оны 12 сарын 25 өдөр

2025008640

Н

алтанд

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

Б.Бадамхонг /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*


/Тамга, тэмдэг/

Б.Бадамхонг /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-17

Бүртгэлийн дугаар *3257*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *БӨТ "ПРОЕКТ" ХХК*

Комиссын гишүүн: *Н.Наранчимэг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Матниг Гариулын дунд хэсэгт хийгдсэн Гариулыг явах.</p> <p>2. Матниг хашлагын Котлолын шалгуур хийгдсэн хэсэгт хуурагд авчрахад хамгаалт хэсэгт хийж.</p> <p>3. Сургуулийн гал тогтоон хэсэг рүү орох проектын хэсэгт шатанд гарсан нүрнийг Тоглох (Матниг хотуурын хана).</p> <p>4. Улаа тууруудад усан тунгээ хийж.</p>	

Бүртгэлийн дугаар ... *3257*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүх **2025008641**

2025 оны 12 сарын 25 -ний өдөр

ТТҮН

шиглалтанд

с

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>[Signature]</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.05</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>[Signature]</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.17</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 3257

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛЬАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон өмгөмтэй гарын үсэг

[Signature]

2025 оны 12 сарын 15 Нийгдэр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХИНАЛТ ШАЛГАЛТ ГАЗАР


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **КОНСТАНТ КОНСТРАКШН ХХК**

Комиссын гишүүн: **Ц. Ариунаа**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Бүх гишүүдийн үүрэг даалгавар байдал амжилтад оруулахаар таслан зуржээ.</p>	

Бүртгэлийн дугаар **3257**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
С.Уяа
 2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

2025008642

МОНГОЛ
МАЛТАНД

2

2

Бүх үзэм даалгавар
Биеэлдэгт

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/12/05




Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/12/05



Бүртгэлийн дугаар 3257
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгогчдын ажлын газрын үсэг
.....
200... оны 12 сарын 15-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХАШИГАЛТ ШАЛГАЛТИ ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг аши оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Тамга-Уул" ХХК

Комиссын гишүүн: Н.Баярмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүдийн чирт даалгаврыг биеэрхтэйгээр байнгын ашиглалтад оруулах</p>	

Бүртгэлийн дугаар ... 3257 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Ауулбар олгосон ашигтны газрын үсэг
 2025 оны 12 сарын 15-ий өдөр 2025008643

Н
таланд

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н.Баарцаа
/ *Н.Баарцаа* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н.Баарцаа
/ *Н.Баарцаа* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Бүртгэлийн дугаар 3257
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлынхны гарын үсэг
Сүх
2025 оны 12 сарын 25 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АШИГЛАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг
оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХОГ*

Комиссын гишүүн: *Х. Орхонсэлэнгэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Энэт комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтэд бэлтгэн амжилтаар хүлээн авахыг татгалзах бүрэлдэж</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *3251*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬ АР ҮНЭН
 Хуульбар олгосон гэрлийн гэрэл үсэг
С.Орхон
 200*5* оны 12 сарын 15-ний өдөр
 2025008644

ЛТЫН

ШИГЛАЛТАНД
СС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Орхонсүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.05.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Орхонсүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23



Бүртгэлийн дугаар ... 3257
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмнөтний гарын үсэг
Orkhonsuren
2025.12.23 -ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашигт оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **УТА**

Комиссын гишүүн: **Н. Олзиймаргал**

СХД 321 Корсо
280 хүүхдийн үзвэрлэлт,
Одоо сургууль, ХАШИГЛАХ
ТӨВӨӨ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Мэдээлэл амжилт ажил бүрэн баталгаажуулах	1. Амжилт ажил бүрэн баталгаажуулах
2. Талбайн турналыг баталгаажуулах	2. Турналыг баталгаажуулах
3. Өөршлөлт бүрэн бүрдүүлж хуураас гутаарлах гэж төвөг үлдэх	3. Өөршлөлт бүрэн бүрдүүлж болсон хуураас гутааралт төвөг үлдсэн
4. Өөршлөлт х хувийг архивд хуртган олох	4. Өөршлөлт х хувийг архивд хуртган олох

Бүртгэлийн дугаар **3251**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг: **сгүл**
 2025 оны 12 сарын 25 -ний өдөр

2025008692

Чүрэг даалгаврын
дүгнэлтээр амжилтай
аруулах саналтай байна

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Сүхбаатар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Сүхбаатар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.25

Бүртгэлийн дугаар 3157
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгохон өмнөтний Гарын үсэг

20015 оны 12 сарын 25-ний өдөр
