

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2026 оны 01 сарын 09-ны өдөр

Дугаар БА-007/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 1 блок 100 (Нэг зуун) ортой цэцэрлэг, 180 (Нэг зуун наян) суудалтай бага сургууль бүхий хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 12 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/04/14 огноо, 0002424 БАЗГ2025/0223 дугаар,

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: БП-14/72,

2.3. Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9011122089 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5369622 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Наадамчдын гудамж, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын цогцолбор барилга Б блок, 11-327199 холбоо барих утас, www.ulaanbaatar.mn цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Алтайн буйлааст ХХК оноосон нэр, 1611001018 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 4064189 регистрийн дугаар, БУ43-269/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Ховд, жаргалант, 1-р баг Алагтолгой 00 тоот, 99005136 холбоо барих утас,

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Батпроект ХХК оноосон нэр, 9011113047 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2773643 регистрийн дугаар, ЗТ19-583/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 6 дугаар хороо, бага тойруу-26, 1-213 тоот холбоо барих утас: 99249997

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын дэргэдэх боловсролын хэлтэс оноосон нэр, 9070002036 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5224497 регистрийн дугаар, Хаяг:

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо, Баянгол, засаг даргын тамгын газрын байранд- 111 , 70171110 холбоо барих утас, www.shd.ub.gov.mn вахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ бага төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар, 1 блок 280 хүүхдийн хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

ХЯНАЛТ ШАЛ
ГАЗАР

Барилга байгууламж
орлуулах к

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 26 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар, 1 блок 100 (Нэг зуун) ортой цэцэрлэг, 180 (Нэг зуун наян) суудалтай бага сургууль бүхий хүчин чадалтай бага сургууль, цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сонгинохайрхан дүүрэг 21 дүгээр хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар 1 блок бага сургууль, цэцэрлэгийн барилга


Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын Барилга захиалагчийн
хяналтын хэлтсийн дарга


(А.Мөнгөн)


Нийслэлийн Хөрөнгө
Оруулалтын газар
1369622
(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.


МӨДЭЭЛЛИЙН САМГААРТГЭЭГ
Объект: ...
Огноо: 2016 01 09
Бүртгэсэн: О.М.Мунг
УЛААНБААТАР ХОТ ТТМ 415

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 2 ДАВХАР 1 БЛОК
БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 12 дугаар сарын 10

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
Улаанбаатар хот
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 1 блок бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 12 сарын 10-ны өдрийн 09:00 цагт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 10:30 цагт дуусав.

Хуралд:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | А.Мөнгөн |
| 2. Хяналт шалгалтын газрын, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч | Т.Цолмонтуяа |
| 3. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч | Э.Цогзолмаа |
| 4. Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер | Д.Сүхбаатар |
| 5. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн | Ц.Дагвадорж |
| 6. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч | Б.Дөл-Эрдэнэ |
| 7. Барилга хөгжлийн төв, Барилгын чанар аюулгүй байдлын үйлдвэрлэл хэлтсийн мэргэжилтэн | О.Ундрах |
| 8. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын архивч | Б.Оюунжаргал |
| 9. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны хүртээмжийн үнэлгэний ажилтан | Б.Даваасүрэн |
| 10. Ашиглагч: Сонгинохайрхан дүүргийн Боловсролын хэлтсийн сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Ч.Энхтөр |
| 11. Зураг зохиогч: Батпроект ХХК-ийн захирал | Н.Наранчимэг |
| 12. Гүйцэтгэгч: Алтайн буйлааст ХХК-ийн захирал | Н.Бадрах |

13.Захиалагч, Нийслэлэийн хөрөнгө оруулалтын газрын
хяналтын инженер

Х.Орхонсэлэнгэ

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 13
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 13

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 1 блок бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын гүйцэтгэлийг шалган ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Т.Цолмонтуяа**

- Барилгын ажилд зохиогчийн хяналт тавих дүрэм / БНБД 11-04-16/ дагуу зохиогч дүгнэлтэдээ өөрчлөлтийнг тусгаж ирүүлэх
- БТХ-ийн 14.3 14.6 чанарын баталгаа гаргах
- Ашиглагч байгууллагатай актаар хүлээлцэх албан бичиг ирүүлэх
- БТХ-ийн 40.1.2 бетоны бат бэх тодорхойлсон дүгнэлт ирүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Тогооны өрөөний шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж ТАД-ын дагуу хаягжуулах
- Холигч үзелийн шугам сүлжээ тоног төхөөрөмжийг хаягжуулах
- Усны нөөцийн савыг шинжилгээнд хамруулж улсын байцаагчын дүгнэлт шалгуулах
- Сургууль, цэцэрлэгийн гал тогооны АС-ын угсралтыг гүйцээж хэвийн ажиллагаанд оруулах
- Цэцэрлэг спорт заалны халаах хэрэгсэлд хаалт хамгаалат хийх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах чанарын баталгаа ирүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Д.Сүхбаатар**

ХЯНАЛТ Ц
ГА
Барилга байгуул
оруул

- Дэд өртөөний гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг нөхөж үзүүлэх
- Дэд өртөөний дугаар хадаж, залгаж салгах зөвшөөрөл нөхөж үзүүлэх
- Харьяа ХҮТ-тэй гэрээ хийж, тоолуурыг лацдах
- Эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу 30.1.8 30.1.18-д дэд өртөөг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид шилжүүлэх
- Ил далд ажлын актыг нөхөж үзүүлэх
- Цахилгааны өрөөний газардуулгын хүрээг хаалганы дээгүүр гүйцээж хийх. Хаалганд хаяг палкат хийх, хаягжуулах, хаалга битүүмжлэх
- ЕОС -д схем, бирк хаяг хийх
- Дутуу байгаа лоткины тоноглол хийх
- Мэдээлэлийн сангийн актыг нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Дагвадорж**

- Гадна дотор хяналтын камеруудын холболтын хэсэгт хамгаалалт хийх
- Камеруудын харан өнцгийг томруулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилга хөгжлийн төв, Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- 1 давхрын дотор ханын суурь хийсэн далд ажлын фото зураг
- Бетоны бат бэхийн лабораторын шинжилгээ үзүүлэх
- Гадна аваарын шатны суурийн боолт бэхэлгээг бүрэн хийх
- Үүдний саравчны усны хаялаганд тосгуур хийж буулгах
- Гадна фасадны ажлыг бүрэн дуусгах
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1 -д заасны дагуу төсвийн хүрээнд норм нормативийн төлбөрийг төлөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч **Б.Оюунжаргал**

- Архивын баримт бүрдүүлэх нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүртгэлтэй өгөх
- Хувийн хэргийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёог хийж өгөх
- Барилга байгууламжын реконстракшн төвийн тайланг тусд нь хувийн хэрэг бүрдүүлж өгөх
- Зохиогчийн хяналтын тайланг тусд нь бүрдүүлж өгөх
- Барилга угсралтын ажлын ил далд акт, гэрэл зургийг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёог бүрдүүлж өгөх

- Барилга хэргэлсэн бараа материал, чанар гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторын шинжилгээ дүгнэлтийг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёог бүрдүүлж өгөх
- Ажлын зургийг өөрчлөлтийн зурагтай бүрэн бүрдүүлж өгөх
- Барилга угсралтын тэмдэглэл дэвтэр бүрэн баталгаажуулж өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны ажилтан **Б.Даваасүрэн**

- Гадна авто зогсоолд ХБИ -д зориулсан зогсоол хийнэ
- Урд талын явган хаалганы шатанд налуу замын стандартын дагуу хийх
- Тоглоомын талбайруу налуу зам хийх
- ХБИ-ний АЦӨ-ний тоноглолыг зөв болгох (хөлтэй бариулаар). Цэцэрлэгийн ажилчидын ариун цэврийн өрөөг тоноглох
- Цэцэрлэгийн ангиудын 1 ш суултуурыг ХБИ- д зориулсан бариул хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, хошууч **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Галын дохиололын утаа мэдрэгчийг батлагдсан зургийн дагуу хийж байршуулах
- Гал унтраах дотор даралтад цэгийн ГК ын хоолой хошууны тотго хомут солих,
- Гадна аваарын шат болон дээвэрт гарах шатны хамгаалалт бэхэлгээг хийж гүйцэтгэх
- Батлагдсан зураг төслийн галын аюулгүй байдлын дүгнэлт нөхөж үзүүлэх
- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргаж өгөх
- Гадна дулаалгад ашигласан материалын шинжилгээ, лабораторын дүгнэлт гаргаж өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл **Ч.Энхтөр**

- Нийт шалны хулдаасыг засаж сайжруулах
- Гадна өнгөлгөө доод хэсэг гэх мэтийг гүйцээх
- Хана, шал зэрэг газрын будаг замаск цэвэрлэх
- Шатны бариул стандарт хангуулах
- Спорт заалны шитийг хамгаалах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Бат проект-ийн захирал **Н.Наранчимэг**

- Сургуулийн ангиудад угаалтуурын оронд гал тогооны тавиур хийснийг солих

- Сургуулийн ангиуд болон нийтийн эзэмжилд наагдсан шалыг засварлах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер **Х.Орхонсэлэнгэ**

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч Алтайн буйлааст ХХК-ийн захирал **Н.Бадрах**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Загвар зураг эх хувиар хянуулах
- Барилгын тухай хуулийн баталгаа 14.3 14.6 -ын дагуу албан тоот НХШГ-т ирүүлэх
- Агааржуулалтын хоолой барилгын баруун талд усны хаялага гүйцээх,
- Хулдаасан шал засах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар 1 блок бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН БАРИЛГА
ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА


А.МӨНГӨН


Б.ГАНЗОРИГ

25/994

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХШГ ББАБХ-ийн дарга*

Комиссын гишүүн: *А. Мөнхөн*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - Залвар зураг эх (А.Зураг) хувьцааг хянуулах - БТХ-ийн баталгаа 14.3; 14.6-нд агуу албан тоот НХШГ-т ирүүлэх. - Агаар шүүмэлт-н хоолой, барилг-н баруун тал усны хаялага гүйцээх, фасадны цэвэрлэлт гүйцээх. - Хураасан үнэм зурсах. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2026.01.02 - ны бүртгэл дугаар 01 хуульбар үнэм (УТА) ирүүлэв. - А.Тайн буйласт ХХК 2026.01.02 - ны өдрийн 01 баталгаа ирүүлсэн - фото зураг хянуулав. - фото зураг хянав.

Бүртгэлийн дугаар ...*51*.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуульбар олгосон амилтны гарын үсэг
Сүх
 20*26* оны *01* сарын *09* ний өдөр

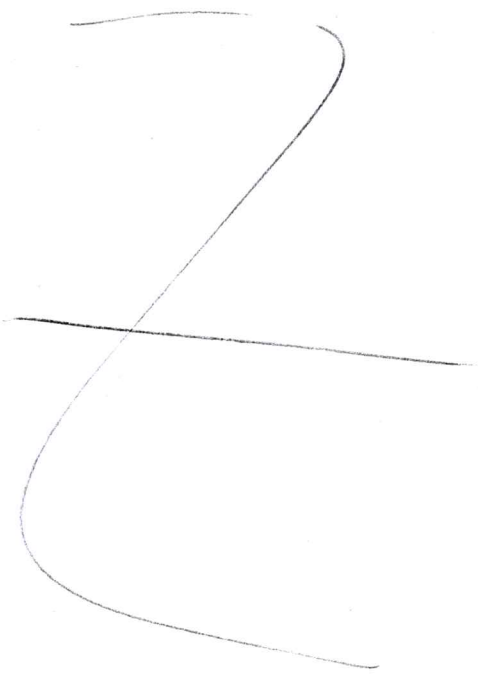
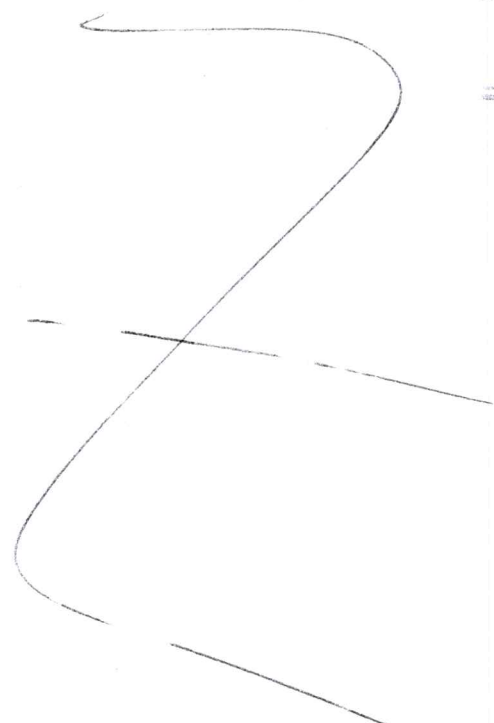
2025008841

ХАЛТГАНД

Бүртгэлийн дугаар ...57.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2026 оны 01 сарын 09-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/2026.01.08 / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.26

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.Түвшээ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>М.Чаммогзор</i></p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.Түвшээ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>М.Чаммогзор</i></p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.25</p>

Бүртгэл: хам дугаар ... 57 ...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

Сүх

2025 оны 01 сарын 09 ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НМШГ, ДБСХХ, ЭХХУБ*


Комиссын гишүүн: *А.Цогзолмаа*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Тогоонол орооний шуган сүржээ, тогоол ноохоронжийг ТАН-и дагуу хажууруулах</i>	<i>-Биелэлт (Фото зураг)</i>
<i>2. Хамгагч үзлийн шуган сүржээ тогоол ноохоронжийг хажууруулах</i>	<i>-Биелэлт.</i>
<i>3. Үнэ ноогоний саваг шилжилтэд хажууруулах үзсэн байцаалчийг дүгнэлт шалгуулах.</i>	<i>-Хажууруулах үзсэн гаргал</i>
<i>4. Сургууль, сургуулийн барилгад гол тоогонол АС-и үзсэлтэд үзлэлт, хөвийн ажиглагчийг оруулах</i>	<i>- Биелэлт (Фото).</i>
<i>5. Үзлэлт, спорт заалын хажуу хэрэгсэл хаант хажууруулах үзлэлт.</i>	<i>- Биелэлт (Фото зураг)</i>
<i>6. Барилга тухай хурийн дагуу хажууруулах, хажууруулах хажууруулах үзлэлт.</i>	<i>2025. 12.24-ийн 25/99 0007 албан бичигт биелэлт гаргал</i>

Бүрэлдүүлэх дугаар
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон өмчлөгч гарын үсэг
Цуг
2025. 01. 09 сарын 09-ий өдөр

2025008842

--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 / *Э. Цогзолмаа* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 12. 10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 / *Э. Цогзолмаа* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 12. 25.

Бүртгэлийн дугаар *57*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
Сүхр
 2026 оны 01 сарын 09-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэртэй
орлуулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэртэй

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБЦТС ТООХ.*

Комиссын гишүүн: *П. Сүрбээтөр*

*СЭА 2-р дорно
280 амьдралын үзүүлэлт
бага сурталчиллын
баримта.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Дэд оргооны гүйцэтгэл ба бүтэц баримтыг нооцож үзүүлэх.</i>	<i>1. Нооцож үзүүлсэн дотоо дүргээр.</i>
<i>2. Дэд оргооны дугаар хадагч даалгах дөвшөөрлөг нооцож үзүүлэх.</i>	<i>2. Нооцож үзүүлсэн дотоо дүргээр.</i>
<i>3. Дорноо АУТ-тэй гэрээ амьдрал тоолуурчдын ачааг үзүүлэх.</i>	<i>3. Гэрээ амьдрал.</i>
<i>4. Эрсийн хүндийн тухай ачирал 30.1.8, 30.1.13-д дааснал даалгах дэд оргоонг ачирал дөвшөөрлөг эрхийн гүйцэтгэл үзүүлэх.</i>	<i>4. 25/101 дотроо амьдрал бүтэц</i>
<i>5. Улс төрийн ажлын актыг нооцож үзүүлэх.</i>	<i>5. Нооцож үзүүлсэн.</i>
<i>6. Чахилгааны оргоонг газард ачирал хуралт ачирал ба дөвшөөрлөг гүйцэтгэл амьдрал даалгах, ачирал АА. пракакт амьдрал ачиралгын бүтэц.</i>	<i>6. Гүйцэтгэл дотоо дүргээр.</i>

ОУРГАЛТЫН ДУГААР 57

**ХНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амьдралтын гарын үсэг

Сүрбээтөр 2025008839



2025 оны 01 сарын 09-ний өдөр



7. ЕОС-аар саяа
Бурх, ааяг ашиг.
8. Дугуй Брала лоткин
Татнуудыг ашиг.
9. Мэдээлэл сангийн
актын наах чинсан.
Мийлэгээр.

7. Гүйцэтгэсэн
доо дурбаар.
8. Гүйцэтгэсэн
доо дурбаар.
9. Ашиг чинсан.
доо дурбаар.

Санаа: Үүрэг
Баангаварын
Биелэлтээр
Байнгын
Ашиггаалтаар
Авах.

Санаа: Байнгын
Ашиггаалтаар
Авах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
 Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.10.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
 Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.31.

Бүртгэлтэй дугаар 57
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмжитний гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 09 ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХС ТӨХХК*

Комиссын гишүүн: *В. Давваоржиев*

*МД, 21-р хороо
280 хувьцааны хувьцаач,
Дня сургуулийн барилга*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- Төрийн, Оюуны хяналтын кассаруудын хөндөгчөөс хэсэгт хамгаалагч хийх.</i></p> <p><i>- Кассаруудын хэрэг дүнсийг тасруулах.</i></p>	<p><i>- Хамгаалагч хийсэн.</i></p> <p><i>- Огноо тасруулсан</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *57*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Сүхр
2025 оны 01 сарын 09 ний өдөр

2025008843

Handwritten signatures in two columns, each consisting of a long diagonal line and a looped flourish.


Салал: Чувал Оюунгарын
 Дарлалттай ажиллагааг
 оруулах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2008. 12. 10.

Үүрэг даалгаврын биелэлт ялгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2008. 12. 02

... дугаар ... 57 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
 2008 оны 01 сарын 09 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт




**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХБГ*

Комиссын гишүүн: *Дэл-Зүрх*

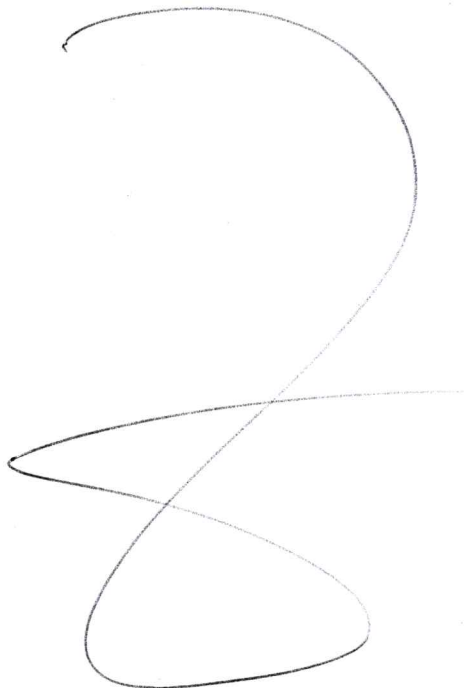
Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СХД 21-р хороо НХБГ 280 хүүхдийн ижвэрлэл, Тала сургууль</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Талын дохиоллын утса мөдрөгний батлагдсан зургийн дагуу шилжэж байрлуулах /Ихорт засаг, Тал төлөөтэй өрөөл /</i><i>2. Тал унтраах дотор даралтын цагийн хоолой хөшүүрэг тэстэ хөшүүрэг (Бүрэлдэв тэстэ)</i><i>3. Талд авсарын өвсөн гөлбөрөн гөрөөх шатны хамаралын батлагыг шилжэж гүйцэтгэх</i><i>4. Батлагдсан зураг төслийн голын шилжүүлэг байршил төлөвлөлийн дүрлэлт хоолой үзүүрлэл</i><i>5. Зохиогчийн нэгдсэн булалын гаргал өгөх</i>	



2025008838

6. Тэгнэ гүйцэтгэл амжилсан
материалын биелэлт,
мэдээлэлт бүрэлт гарвал
өгсөх

Чура даалгаврын биелэлтийг
вэбдэн дэлгэц ирүүлж
(Фото зураг хавсаргах)



СХД 21-р хороо
НХОГ
280 хүүхдийн хамруул, бусад
сургуулийн барилга

Үүрэг даалгавар өгсөн:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Давыдов /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 10

Чура даалгавар биелсэн



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Давыдов /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 22

Чура: элний дугаар 57
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон элний гарын үсэг

2026 оны 01 сарын 09 ний өдөр

БТЧ-ийн төв архивын
 280 хуудасны үзүүлэлт,
 бага үзүүлэлт 2
 давхар
 барилга

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
 ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 Оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АБГ ЧААХИВ
 Комиссын гишүүн: Оюунсаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Архив баримтсан баримт бүрдүүрхэл нийтэлт махаатан дагуу бүрэн бүрдүүлж өгнө	Биедсэгч
2. Нийгмийн хэрмэл нийтэлт махаатан дагуу бүрэн бүрдүүлж гүйцээг төвийн хийж өгнө	Биедсэгч
3. БТЧ-ийн реконстраци төвийн ташаан тусгаг нь хий бүрдүүлж өгнө	Биедсэгч
4. Зөвлөмлийн хяналтан ташаанг нь хувчар тусгаг нь хий бүрдүүлж өгнө	Биедсэгч

Бүртгэлийн дугаар 57
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчлөлтний гарын үсэг

 200... оны ... сарын ... ний өдөр

2025008840

<p>5. БУИ-н илгээг амьтны ахт үрэл зуршил бүрт бүрдэгдэн дөтөөг төвөг хитн өгөх</p> <p>6. Барилгад хэрэглэсэн баруу материал, ганаар үрэл зуршил үрэлт, АИИ/зур бүрт бүрдүүт дөтөөг төвөг хитн өгөх</p> <p>7. Амьт зуршил сөрмөгтэй зуршил бүрт бүрдүүт өгөх</p> <p>8. Барилгад хэрэглэсэн баруу материал үрэлт ганаар бүрт бүрдүүт өгөх</p>	<p>Биедсөү</p> <p>Биедсөү</p> <p>Биедсөү</p> <p>Биедсөү</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Оюу</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Оюу</i> гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 12. 10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Оюу</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Оюу</i> гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 12. 10</p>



ХУВЬСАН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
 2004 оны 01 сарын 09-ний өдөр

"Алтайн Булагост" ХХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгээлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТөв

Комиссын гишүүн: В. Чиграх

280 хурхосын цэцэрлэг, датаг сургуулийн барилга.
Сонгинохайрхан, 21-р хороо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① 1-р давхрын дотор ханын сурь хийсэн фото зурал, акт нөхөн үзүүлэх.	- Ханын орлогийн сурь хийсэн фото зурал нөхөн үзүүлэв.
② Бетоны гат төхөөн лабораторийн дүгнэлт үзүүлэх.	- Бетоны гат төхөөн дүгнэлт нөхөн үзүүлэв.
③ Газрын аваарын шалтны сурьийн боолтын төхөөлөгт бүрэн хийх	- Боолтын төхөөлөг хийсэн фото зурал нөхөн үзүүлэв.
④ Усны саравчны усны хаялган тосгуур хийн бүтээх.	- Усны хаялган хийн фото зурал үзүүлэв.
⑤ Барилгын газрын дараахны таныг бүрэн дүрсэлэх	- Дараахны таныг фото зургаар үзүүлэв.

Бүртгэлийн дугаар 57
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
2002.06.09



2025008846



6. Баримтын тухай
хуулийн 5.7.1-о зоосны
дагуу төсвийн
хүрээнд нурч,
нормын дагуу төлбөрийг
тоолох.

Нам хансаг

Санал:
- Өгсөн үүрэг даалгавар
биелэсэн тохиололоо
ашрагтайгаар оруулах
саналтай.

Биеллээ

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/ О. Цыраг / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-12-10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/ О. Цыраг / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-12-13

Бүртгэлийн дугаар 57
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмхилтний гарын үсэг
.....
200... оны 11 сарын 09 ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:





Комиссын гишүүн:

Давдасүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тарна авто машин зогсоол ХБН-ийн авто машин зориулсан зогсоолыг стандартын дагуу хийх. (Босоо талбайтай)	Биелэлт
2. Урь тавьж авсан хаалган цаашир налуу зөв стандартын дагуу хийх.	2026 оны 05-20-ны өдөр хийж гүйцэтгэж дуусгав албан ёсоор баталгаажуулах болно.
3. Шөмөөний талбайруу налуу зөв хийх. (Эвэлзэн).	
4. ХБН-ий АВД-ийг тогтооно зөв болгож засах. (Хөнгөн баримт).	Биелэлт
Цэвэрлэлийн Ашигрын АВД-г тогтооно.	
5. Цэвэрлэлийн ашигын 1-ий сүүлдүүрн ХБХ-г зориулсан баримт хийх.	Биелэлт

Бүртгэлийн дугаар 97
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2026 оны сарын 09 ний өдөр

2025008836


	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Б. Давсасурт</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.10.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Б. Давсасурт</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.21</p>

... дугаар ...


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Куулбар олгосон эхлэлтны гарын үсэг



200...оны... сарын...-ний өдөр




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС





(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **СХД Боловсролын хэвтэс**

Комиссын гишүүн: **Тхстөр**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Нийт шалны хугаасыг засах сайжруулах	Биелсэн.
- Гагна өнгөлөө доод хэсэг гэх шэвх зүүсгэх	Биелсэн.
- Ханга, Улаан гэрэг газрын бугдаг засмал үзвэрлэх	Биелсэн.
	

Бүртгэлийн дугаар**57**.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг **2025008848**
.....
2025 оны 01 сарын 09 -ний өдөр

<p>Угтны баригдлын стандарт хангах.</p> <p>Спорт заалмы уусийг хамгаалах. (Троссоор татах зэрэг)</p>	<p>Биелсэн</p> <p>Биелсэн ✓</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: С. Дижтөр</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/  Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/  Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.22.</p>

Бүртгэлийн дугаар 57

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон шийтгэлийн гарын үсэг

.....

2025 оны 12 сарын 22-ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: „ *Затарпроект* ” ХХК

Комиссын гишүүн: *Н. Нарангийн*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Сургуулийн ангид угаалтуурны оронд гол тогосны тосгуур шийсэн Гайгаг солих.</p> <p>2. Сургуулийн ангид болон Вертиболод наалдсан шалыг (сүлдээсэн) Таслах.</p>	

Бүртгэлийн дугаар*57*.....
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
.....*сүхэ*.....
20*26* оны *01* сарын *09* нд өдөр

2025008847

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp]</i></p> <p><i>[Signature]</i> арын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.10.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp]</i></p> <p><i>[Signature]</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.24</p>

Бүртгэлийн дугаар.....5/.....


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

.....*[Signature]*.....

2025 оны 12 сарын 24 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Албаан бүтээгдэхүүн ХХК*

Комиссын гишүүн: *Бадрал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>үүрэг даалгавар нь</i></p> <p><i>Бүтээгдэхүүн</i></p> <p><i>Комисс авах</i></p> <p><i>Саяагаар</i></p> <p><i>Бааца</i></p>	<p><i>үүрэг даалгавар нь</i></p> <p><i>Бүтээгдэхүүн</i></p> <p><i>ашигласнаар</i></p> <p><i>аваж хүсэлтэй</i></p> <p><i>Бааца</i></p> <p><i>үүрэг даалгавар нь</i></p> <p><i>Зурвч гүйцэтгэ</i></p> <p><i>Хийгээгээр</i></p> <p><i>Харгалсан бүтээгдэхүүн</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *57*





ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гэрэмж үсэг *2025008837*

Сүх

2026 оны 01 сарын 09


<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2015-12-10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2015-12-23</p>

Бүрээлийн дугаар ... 57 ...


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон элэлтийн гарын үсэг



2015 оны ... сарын ... -ний өдөр




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *АНХОГ ажлын байр*

Комиссын гишүүн: *Орхонсайтма*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Нийт комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг биеллээгүй болжээ. Ажлын байр дээрх ажил хэрэгтэй.</i></p>	



2025008844

[Large handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 10



Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026. 01. 02



Бүртгэлийн дугаар ... 57 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ижилтны гарын үсэг
[Signature]
2026 оны 01 сарын 02-ний өдөр
