

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2026 оны 02 сарын 10-ны өдөр

Дугаар. 60 - 042/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол улсын нийслэлийн Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар 1 блок, 200 (хоёр зуун) ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 12 сарын 03-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/10/28 огноо, дугаар, БАЗГ2025/1107 ;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төсөл шифр дугаар ЕГ Шифр: 40/2020-Б;

2.3. Захиалагч: Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам оноосон нэр, 9019009041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2076675 регистрийн дугаар, БУ11-968/25 барилгын ажлын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, Сөүлийн гудамж, тоот, 21-242190, 86114880 холбоо барих утас, trenchin05@gmail.com цахим хаяг,

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам, Барилга засвар, ашиглалт үйлчилгээний анги оноосон нэр, 9019009041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2076675 регистрийн дугаар, БУ11-968/25 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо, Дунд голын задгай гудамж, тоот, 90118832 холбоо барих утас, emunhorgil9@gmail.com цахим хаяг,

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй

2.6. Барилга байгууламжын зураг төсөл зохиогч байгууллага: Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам, Зураг төслийн төв оноосон нэр, 9019009041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2076675 регистрийн дугаар, ЗТ11-664/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Замчны гудамж, Өөрийн байранд 21-242741, 86112234 холбоо барих утас;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам, Ганзам цэцэрлэг оноосон нэр, 9019009041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2076675 регистрийн дугаар,

002997 цэцэрлэгийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, Өөрийн байр, 99058974 холбоо барих утас, naran.samtsag179@gmail.com цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

ХЯНАЛТ Ш
ГАЗ

байгуулам
оруулах

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар 1 блок, 200 (хоёр зуун) хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

a) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад тав хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

b) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцлийн хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

a) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

b) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

c) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна;

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар 1 блок, 200 (хоёр зуун) ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Баянгол дүүрэг 2 дугаар хороо, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам захиалгатай, зорьтой 2 давхар 1 блок, 200 (хоёр зуун) ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн
нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын
Их барилга, хөрөнгө оруулалтын
Албаны дарга



(Б.Баярмагнай)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БҮРТГЭВ.
Объектын дугаар: 031
Энэс: 021
Бүртгэсэн өдөр: 10
УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН 41534

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 2 ДУГААР ХОРОО, МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН
НИЙГЭМЛЭГ УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ ЗАХИАЛАГЧТАЙ ЗООРЬТОЙ 2
ДАВХАР ГАНЗАМ 200 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 12 дугаар сарын 03

Улаанбаатар хот
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Баянгол дүүрэг 2 дугаар хороо, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг
Улаанбаатар төмөр зам захиалагчтай Ганзам 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн
барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 1 давхрын
үйлчилгээний зааланд 2025 оны 12 дугаар сарын 03-ний өдөр 13:00 цагт 14
гишүүний бүрэлдхүүнтэй эхэлж 15:30 цагт дуусгав.

Хуралд

Комиссын дарга:

1. Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын
барилга байгууламжийн ашиглалт
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн

Нарийн бичгийн дарга:

2. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг
Улаанбаатар төмөр зам, Их барилга, хөрөнгө
оруулалтын албаны ерөнхий инженер

Ш.Эрдэнэбулган

Гишүүд:

3. Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын
Барилгын техникийн улсын байцаагч
4. Хяналт шалгалтын газар Дэд бүтцийн
стандарт, хяналтын хэлтсийн эрчим
хүчний техникийн хяналтын Улсын байцаагч
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ
ТӨХК ахлах инженер
6. Ус сувгийн удирдах газар инженер
7. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын гал
түймэртэй тэмцэх хэлтэс Ахмад
8. Үндэсний төв архивийн архивч
9. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо,
хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан
10. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар,
Хэрэглэгчид үйлчилэх төв-14 хэсгийн инженер
11. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг

Э.Алтанзул

Э.Цогзолмаа

Э.Ундрахцогт

Д.Отгонжаргал

Б.Дөл-Эрдэнэ

Б.Оюунжаргал

Н.Эрдэнэтөгс

Н.Амар-Од

Улаанбаатар төмөр замын, Барилга орон сууцны албаны инженер	З.Мягмарсүрэн
12. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын, Зураг төслийн төвийн ахлах инженер	Э.Батболд
13. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын, Дохиолол холбооны 2 дугаар ангийн холбоо хариуцсан инженер	М.Чимэдцэрэн
14. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын Эрчим хүч ус хангамжийн 1 дүгээр анги Улаанбаатар ЦШС хэсгийн инженер	Ц.Энхцогт

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 14
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаварын биелэлтээр санал гаргасан -14

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Баянгол дүүрэг 2 дугаар хороо, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам захиалагчтай зорьтой 2 давхар “Ганзам” 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.


Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын барилга байгууламжийн ашиглалт бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Нийт комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангаж, гарын үсгээр баталгаажуулах
- Гүйцэтгэгч Барилгын тухай хуулийн дагуу чанарын баталгаа ирүүлэх
- Зохиогч дүгнэлтээ БТХ-ын 11-04-16-ын дагуу шинэчилж бичих.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар Барилгын техникийн улсын байцаагч

Э.Алтанзул

- Барилгатай холбоотой бичиг баримт хянуулах
- В1 давхрын шалыг өнгөлөх
- Барилгын хаяавч, дутуу ажлуудыг хийж гүйцэтгэх
- Гадна тохижилтыг батлагдсан зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- Бетоны лабораторын сорьцын шинжилгээ хянуулах



- Барилгын чанарын баталгаа гаргаж албан бичгээр хянуулах

Хяналт шалгалтын газар Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн эрчим хүчний техникийн хяналтын Улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Гадна дулаан, дулаан механикийн гүйцэтгэлийн зургийг шалгуулах
- Холболтын зөвшөөрлийг шалгуулах
- Дулааны худгын фото зургийг шалгуулах / одоо байгаа/
- Гадна шугамын актыг фото зургийн хамт шалгуулах
- Узелийн өрөөний шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг ТАД-ын дагуу хаягжуулах, өргөлтийн насосны байрыг солиулах
- Барилгын дээвэр дээрх АС-ын шахтны малгайвчнаас бохирын үнэр гаргах хоолойг өндөрлөж дулаалга, малгайвч хийх
- Ангиудын агааржуулалтын решоткын байрлалыг зөв харуулах
- Баригдаж байгаа УДДТ-өөс зай хэмжээ хангаж байгааг нотлох баримт ирүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах, чанарын баталгаа ирүүлэх

Улаанбаатар дулааны сүлжээний ахлах инженер **Э.Ундрахцогт**

- УБДС ТӨК -иар холболтын зөвшөөрөл батлуулах
- Гадна дулааны шугамын өргөтгөл хийгээгүй талаар тайлбар албан бичиг өгөх, шаардлагатай бол НХОГ-аас албан бичиг авах
- ОСНААУГ-аас өргөтгөл хийгээгүй нөхцөлд дулаанаар хангах боломжтой талаар тодруулга авах
- ДХ-4-р худаг хийгдээгүй тайлбар албан бичиг ирүүлэх
- Гадна шугам, холигч насосны узель, дотор системийн актууд хангагч байгууллагаар баталгаажуулах
- ДХ-3-р худаг нөхөж шалгуулах
- Холигч насос үзелийн температур тохируулагч автомат датчик зөв суурилуулж EVL -120 ажилд оруулж тохируулга хийх
- Холигийн үзельд баланс хаалт суурилуулах
- Холимогийн үзелийн дутуу дулаалга гүйцээх
- Дулааны тоолуур тооцоонд өгч лацдуулах
- Холигч насосыг хажуу тийш харуулж суурилуулах

Нийслэлийн онцгой байдлын газарын гал

түймэртэй тэмцэх хэлтэс Ахмад **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Гал унтраах дотор даралтат цэгийн /ГК/ гал унтраах даралтын хоолой хошууны тотго хомут солих
- Гал тогооны өрөөнд галын дохиололын дулаан мэдрэгч суурилуулах
- Гадна фасадны өөрчлөлтийн зураг зөвшөлцөх

- Металл фасадны дээврийн рамыг бэхлэх, материалын шинжилгээ, лабораторын дүгнэлт нөхөж үзүүлэх. /НОБЕГ-ын дэргэдэх ГСҮХ-ийн лабораторын дүгнэлт
- Захиалагч, гүйцэтгэгч, автор нар албан бичиг, дүгнэлт гаргаж өгөх
- Дээврийн шахтын дутуу хийгдсэн ажлыг гүйцээж хийх
- Үүрэг даалгаварын биелэлтийг албан бичгээр ирүүлэх /фото зураг хавсаргах/

Үндэсний төв архивийн архивч **Б.Оюунжаргал**

- Цэцэрлэгийн барилгы хувийн хэргийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдүүлж, дотоод товъёг хийж өгөх
- Ажлын болон гүйцэтгэлийн зургийг зургийн бүрдлийн дагуу бүрэн эх хувиар өгөх
- БУА-ын ил далд ажлын акт, гэрэл зургийг ажлын дарааллаар бүрэн бүрдүүлж, дотоод товъёг хийж өгөх
- БУ-ын тэмдэглэл дэвтэр бүрэн баталгаажуулж, хаягжуулан эх хувиар өгөх
- Барилгад хэрэглэсэн бараа материалын гарал үүслийн гэрчилгээ бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх
- Техникийн комиссын баримт бичгийг хувийн хэрэгт оруулах

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Н.Эрдэнэтөгс**

- Гадна явган хүний зам талбайд харааны бэрхшээлтэй иргэний хөтөч зам хийх
- Үүдний довжооны налуу замын дутуу ажлыг гүйцээх
- 1-р давхрын ажилчдын болон нийтийн ариун цэврийн өрөөнд угаагуур, суултуурыг ХБИ-д зориулсанстандарт тоноглолоор тоноглох
- Ангиудад ХБИ зориулсан угаалтуур, суултуур тоноглох

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар Хэрэглэгчид үйлчилэх төв-14

Хэсгийн инженер **Н.Амар-Од**

- Халаалтын шугам болон салбар шугамд баланс хаалт тавих
- ECL120арр тохиргоо хийх даачкуудийг зөв байрлуулах
- Хэмжих хянах хэрэгслийг бүрэн бүтэн болгох, холигч үзелийн насосыг тооцооллын дагуу тохируулж тавих

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын

Их барилга, хөрөнгө оруулалтын албаны ерөнхий инженер **Ш.Эрдэнэбулган**

- Ашиглагч, гүйцэтгэгч нар хамтран гадна дулааны холболтын зөвшөөрөл авах, гэрээ байгуулах
- ХБИ-ний налуу шатыг гүйцээж хийх
- Гадна металл фасадны зааг дах селикон чигжээсийг гүйцээж хийх

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын
Барилга орон сууцны албаны инженер **З.Мягмарсүрэн**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын дагуу байнгын ашиглалтад оруулах хүсэлтэй байна

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын,
Зураг төслийн төвийн ахлах инженер **Э.Батболд**

- Барилгын гадна хаяавч бетоныг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- Гадна металл фасадны зааг дах селикон чигжээсийг гүйцээж хийх
- ХБИ-ний налуу шатыг гүйцээж хийх

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын
Дохиолол холбооны 2 дугаар ангийн холбоо хариуцсан инженер **М.Чимэдцэрэн**

- Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын
Эрчим хүч ус хангамжийн 1 дүгээр анги Улаанбаатар ЦШС хэсгийн инженер

Ц.Энхцогт

- 1-р давхрын щитний схем, тэмдгэлгээ, нэмж тавих газардуулгыг нэмж холбох

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 2 ДУГААР ХОРОО, МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ
НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ ЗАХИАЛАГЧТАЙ
ЗООРЬТОЙ 2 ДАВХАР "ГАНЗАМ" 200 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН ГАРГАСАН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ, БИЕЛЭЛТЭЭР КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ
ҮЙЛДЭХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭВ.


ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ


(А.МӨНГӨН)



НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН
НИЙГЭМЛЭГ УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ
ИХ БАРИЛГА, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР


(Ш.ЭРДЭНЭБУЛГАН)

26/11

12 ①



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХШГ ББАБХ дарга**

Комиссын гишүүн: **А. Мөнхон**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Нийт комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангаж, татрын хсэлээр баталгаажуулах</p>	<p>1. ХАНГАЖ</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 340 ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон өмлөлтийн гарын үсэг: <i>снл</i></p> <p>2026 оны 02 сарын 10 -ний өдөр</p> </div>
<p>2. Гийцэтгэгч ВТХ-ийн дагуу шаарын баталгаа үргүүлэх (14.3, 14.6)</p>	<p>2. <i>снл</i></p> <p>ВТЗБ ЗАУД</p> <p>2025.12.17</p> <p>88/1201 хс</p> <p>БАТЛАГАА</p>
<p>3. Зорлогч Ачиглагч ВНСА — 11-04-16-4</p>	<p>3. <i>снл</i></p>

Аагуу үнэмшилтэй Биесүх

2025008445

ЭН
ХАЛГАГАГЧИЙН
ТАМГА

[Large handwritten signature]

~~УБТЗБ ЗАВАТ~~ - нн
ХУУЛБАР
Сүрэншарв.
2026.01.09
21/07 1000
ХУУЛБАР

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ *А.Мөнхон* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шаарцсан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ *А.Мөнхон* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.15

Бүртгэлийн дугаар 390
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар өгсөөдөн эхлэлтний гарын үсэг
Сүрэншарв
2026 оны 01 сарын 15 -ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашигласан орнуулах комиссын

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХШГ БТХ үсгийн байцаагч*

Комиссын гишүүн: *Э.Алтанзул*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгатай холбоотой бичиг баримт хянуулах	1. Барилгатай холбоотой бичиг баримт дэхэн хянуулав
2. В1 дахь хрлын шалыг өнглөх	2. В1 дахь хрлын шалыг өнгөлсөн байна
3. Барилгын хаялыг хийж гүйцэтгэх	3. 4, 5 дахь үүрэг даалгаврын биелэлтийг үнэм Батар төмөр замын барилга зөвхөн ашиглан гүйцэтгэжээ
4. Барилгын дугуйг оныг хийж гүйцэтгэх	олгомы 2026.01.14 88/28 дугаартай олдон бичгээр дугуйг өнгөл хийж гүйцэтгэжээ
5. Тогтно төхөөрөлтөө баталгасон зурвас дугуй хийж гүйцэтгэх	буй төлөөр тайлбар олдон бичиг үргүүлэв
6. Бэтэмы лабораторын сорьцын шинжилгээ хянуулах	6. Бэтэмы бат БЭХийн сорьцын шинжилгээг хянуулав
7. Тус барилгад чөлөөт баталгаа гаргах албан бичгээр үргүүлэх	

Бүртгэлийн дугаар *340*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
сүж


2026 оны 01 сарын 10-ний өдөр

2025008446

8. Үүрэг даалгаврын биелэлттэр байнгын амжилтог арга замтай байна.

7. 2026 оны 01 дугаар 14-ны өдрийн 88/29 дор дугаартай Алдсн бичгээр тус баралтог чанарын баталгаа гаргах ирүүлнэ

МОНГОЛ



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, гэмдэг/ УЛСЫН БАЙЦААГЧ
02-13-01/34 Гарын үсгийн тайлал



Огноо: 2015.12.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, гэмдэг/ УЛСЫН БАЙЦААГЧ
02-13-01/34 Гарын үсгийн тайлал



Огноо: 2016.01.15

Бүртгэлийн дугаар ... 340 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
[Signature]
2016 оны 01 сарын 10 чий өдөр

УБИС ХТТ-ийн захирал
 тэй 200 дунгийн (3)
 үнэмлэхийн барилга.



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дугаар хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХШГ, ДБСХХ, ӨХХУБ**

Комиссын гишүүн: **Э. Цогзолмаа**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газра дурван, дурван механик х	- Гүйцэтгэлийн зурал, гүйцэтгэлийн зуралыг шалгуулах мөрдлийн сангийн ахуйг шалгуулав.
2. Кабальтон зовшоорлийг шалгуулах.	- 2005.12.11-ний 06/49000т кабальтон зовшоорлийг шалгуулав.
3. ӨХ-ийн Фото зуралыг шалгуулах. (Одоо байгаа)	- Шалгуулав. (Фото зурал)
4. Газра шуралом ахуйг Фото зуралын хамт шалгуулах	- Шалгуулав.
5. Үзлийн өрөөнийг шурал цэвэр, тоног төхөөрөмжт ТӨД-ийн дагуу хэсэгшүүлэх, өрөөнт х нэвсгэл байрлал сайжруулах.	- Биеллст. (Фото зурал)
6. Барилган дотор дээрх АС-и шалтгаал мэдэгдэвчээс бохирын үндэр перлаа хэсгийг өндөрлөх дуралгаа, мэдэгдэвч хийх.	- Биеллст.
7. Амшудом АС-и решеткаана байрлалыг зөв харуулах.	- Биеллст.
8. ОСНААЧГ-и төрүүлээ албан болгийг шалгуулах. (Өрөөлөн шийх хяар)	- Кабальтон зовшоорал, ОСНААЧГ-и шийжүүлэх тухай албан болгийг хянуулав.



9. Барилгын бийтэй үзвэл-өөс
зүйт хамтга келгаш бейтсат
котлох барилт цууриг.
10. Барилгын тухай нүүрийн
дагуу зурвудыг, захирулах,
пенсери бослого цууриг.

-2005.01.08-иа 21/05 дугаартай
тайлбар, хүсэлт, уригаштай
бичигийг цууриг. ЛТАНД

- 2005.12.17-иа 88/1001000Т
албан бичгээр батлага гаргав.

Бүртгэлийн дугаар 340
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эзэмшлэны гарын үсэг
.....
2006 оны 01 сарын 10-ий өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/З. Цогзоригийн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.12.03



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/З. Цогзоригийн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2006.01.08





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **УБДС ТӨХК**

БТБ 2 р хороо

Комиссын гишүүн: **Ундрахцогт**

Төлөөлөгчөөр 2025.12.17-ийн өдөр хийгдсэн бичлэг.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 'УБДС' ТӨХК-аар холбогдох ажлын гүйцэтгэл багасгах.	1. 06/43 тоот холбогдох ажлын гүйцэтгэл багасгах бичлэг.
2. Тогтвортой байдал үндэсний төв архивтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх.	2. ИХТГ-ын 2025.12.17-ний өдөр 01/5474 тоот ажилын бичлэг хийгдсэн.
3. ОСНААУТ-аар ажлын гүйцэтгэл багасгах.	3. ОСНААУТ-аар 2026.01.06-ний өдөр ажлын гүйцэтгэл багасгах бичлэг.
4. АХ-4р хуудал хийгдсэн ажилын гүйцэтгэл багасгах.	УБТЗ БЗАН-аар 2025.12.16-ний өдөр 88/1200 тоот ажилын бичлэг хийгдсэн.


СҮРИТЭНИЙН ДУГААР 340

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхр

2025.12.17-ний өдөр

2025008448



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4-дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБТЗ ХНН Эрчим хүч, ус хангамжийн нэгдүгээр алд
Улаанбаатар УИИС хэргийн үйлдвэр

Комиссын гишүүн: Ц. Энхцогт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Давхрын шилжлийн схем, тэмдэглэл нэмж тавих, газардүүлгийг ховтоогч нэмж холбох</p>	<p>1. биелсэн</p>




Н
алтанд

Бүртгэлийн дугаар 340
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
.....
2008 оны 02 сарын 10 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ У. Энхцогт / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2008.12.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ У. Энхцогт / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2008.12.18



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэрт хэргийг ашиг оруулах комисс


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБТЗ Дохиолол халбооны ЗР агш (Халбоотуулалт)*

Комиссын гишүүн: *М. Чимэдууцэрэн*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хуртн авах санхүүгийн байца.</i></p> <p><i>"Байнгын ашиглалтанд оруулах" санхүүгийн байца.</i></p>	<p><i>Биелсэн</i></p>



2025008450

Бүртгэлийн дугаар ... 340 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон баримтын гарын үсэг
.....
2004 онд ... сарын ... -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/М.Чамэдүрэн / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-03


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/М.Чамэдүрэн / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.15



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УСЧГ*

*БГД 2-р хороо
179-р өргөтгөл үийн
200 хүүхдийн цацарлаа*

Комиссын гишүүн: *Отгонжаргал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
-Техникчид нөхцөлийн хугацаа дууссан. ✓	Техникчид нөхцөл 25.12.30 өдрийн 17/357Б тоот албан ёсгүйгээр 1 жилээр сунгасан
-Тех.нөхцөлийн дагуу ХҮТ-14 дараахь цэвэр усны Ø50мм шугамыг Ø80мм болгож өргөтгөх ажил хийгдээгүй? ✓	- өргөтгөх ажлыг 26.01.08 өдрийн 88/11 тоот албан ёсгүйн/дагуу 2026.06 сард шугам.ө. ажил хийж хавсаргав.
- Барилгажих талбайд орсон бохир усны салбар шугамыг зөөжг шилжүүлсэн талаар тодруулга тайлбар ✓	- 2026.01.02 өдрийн 2/5 тоот албан ёсгүй өгг тайлбар авсан.
- Бохир усны-1 худагт суур.сан өргөтгөл насосны мэдээлэл /фото зургаар/ ✓	- Фото зураг хавсаргав
- БУХ-2 станцартын дагуу /хобилтатах/ хийжг гүйцэтгэх ✓	- Фото зураг хавсаргав.

Урт.Эмхэл дугаар *340*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон өргөтгөл үийн 2026.06.10

Сүх

2026 оны 02 сарын 10

2025008451

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - цуглуулах худах /хүтгэл/ шалгуулах /осилячг-т/ /фото зураг хавсарх/ - Унд ахуйн үсэнд шинжилгээ өгг дүгнэлт гаргуулах - Чувьд трап хийх - Тойрох шугам болон сосок таслах - Чух шалгуулах /чувьд задгагуй/ - Чувьд үсны шугам дээр барилга барьсан. албан бичиг - Чувьд бохир үсны далд ажлын актууд /хангагг бүтүүл/ баталгаажуулах - Чувьд үсны далд ажлын акт дүтүү - Гүйцэтгэлийн зураг хотын мэдээллийн санд оруулсан акти сд хуульдар өгөх | <p style="text-align: right;">МАЛТАНД</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монтгол-Оросын хувь ижилчүүлэн нэгэнлэг УБТЗ улсын байцаагчийн 25.12.12 өдрийн Я10-13-08/222/496 тоот шинжилгээний дүгнэлт хавсаргав. - УБТЗ БЗЯ4 үйлчилгээний анги 25.12.16 өдрийн 88/1200 тоот албан бичгээр 2026.04 дүгээр сард хийж гүйц.х. - Фото зураг хавсаргав. - УБТЗ БЗЯ4 анги 26.01.08 өдрийн Я88/10 тоот тайлбар батланж албан бичиг хавсаргав. - Бохир үсны д.аактаанд осилячг хүт-14 сувдмай бат.сан - Чувьд үсны д.аактаанд осилячг хүт-14 х.шиж Амар-од бат.сан. - Гүйц.з сд хувийг мэд.санд оруулсан. |
|--|--|

Үүрэг даалгавар өгсөн: үүрэг даалгаварын биелэлтээр
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/ Д.ОТГОНЖАРГАЛ
 / Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025.12.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/ Д.ОТГОНЖАРГАЛ
 / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.06.09

Бүртгэлийн дугаар ...340...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон тооллын гарын үсэг
[Signature]
 2026 оны 06 сарын 10 ной өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт




БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НӨБГ ГТТХэлтэс**

Комиссын гишүүн: **Рол-Эрдэнэ**


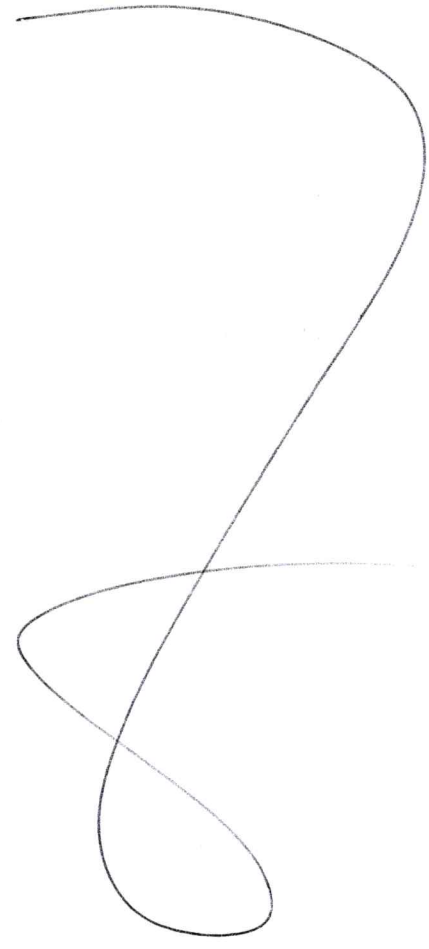
Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>БГА 2-р хороо Метал Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Усандаастур тийшэр зам 200 орлогч илэрлэг</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Төл унтраах дотор дарьлттай иэхийн ГТК-ны төл унтраах дарьлттай хоолой хошууны томог хандан илэрлэг ✓ 2. Төл төлсөн оросын хувь дохионыг дундаг илэрлэг суурьлуулалт ✓ 3. Тогна оросын оросын тийш зураг зөвчилсөн ✓ 4. Метал оросын дэврийн раши бэлдх, материалын шанжлага, лабораторын дундаг томог үзүүлэх / ОБЕГ-ын дундаг ГТК-ийн лабораторын дундаг ✓ 	

ОУРГАЛТИЙН ДУТВАД 340
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлалтын гэдгэм үсэг
 2007 оны 01 сарын 10 -ний өдөр

2025008452

5. Замнаага үндэстнийг
 автор нар албан ёсоор
 дүгнэлт гаргаж өгөх ✓
 6. Даврийн шахан дундуу хийгдсэн
 амьт дүрн үндэстнийг ✓
 Чүрэг даалгаврын биелэлтийг
 албан ёсоор илүүрэн
 /Орто зураг хавсаргах/

Чүрэг даалгавар биелсэн

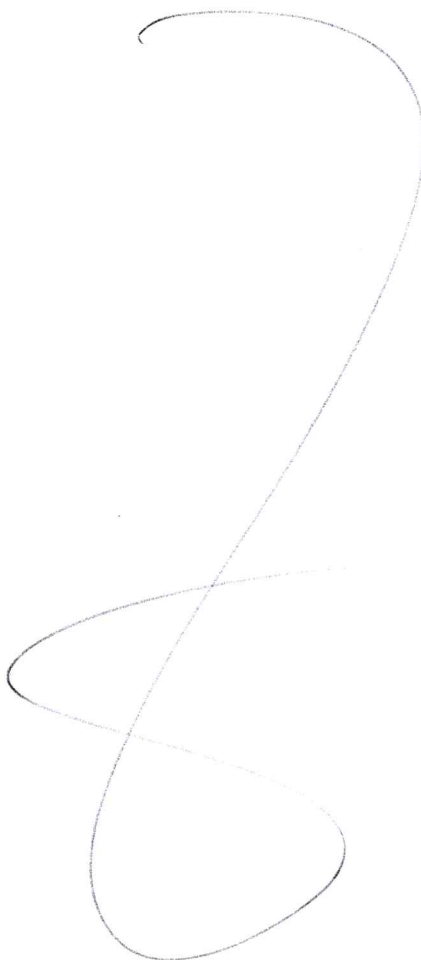

БГД 2-р хороо
 Мөнхон Орловын явж байгуулсан
 кишинийг
 Чувалдаагаар төмөр зам
 ДОО оронд үзүүлсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 25

Бүртгэлийн дугаар ... 340 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгоон өгөхтэй гарын үсэг

 200 ... оны ... сарын ... өдөр

№ 4573, ХНН-н
Тангын 200 - хуримд
Итгэрт 2 дахь хэр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **У.ТА**

Комиссын гишүүн: **Б. Окунжаргал**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Итгэрттэй баримт хувьд итгэрттэй мөсөөг дагуу бүрэн бүрдүүлж, гомтоог төвөг хийж өгөх	1. Баримт хувийн ажлыг, мөсөөг дагуу мөсөөг дагуу хийж өгсөн.
2. Ашиг болон үндэстэй зуримд зуримд бүрдүүлж дагуу бүрэн эх хувиар өгөх	2. АЗ-ГЗ-г х хувиар өгсөн.
3. БУ-н и дагуу ашиг акт, итгэ зуримд ашиг дараалаар бүрэн бүрдүүлж гомтоог төвөг хийж өгөх	3. БУАН и ба дагуу өгсөн мөсөөг дагуу бүрэн бүрдүүлж өгсөн.
4. БУ-н тангын гомтоог	4. БУ-н тангын гомтоог хувиар өгсөн (и хувиар өгөх)

Бүртгэлийн дугаар ... 370 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гомтоог үзэг
200... оны ... сарын ... өдөр

2025008453

Бүрэн баталгаатнуудыг
халтгаарлан эн
хуульч өгөн
5. Барилдаг хэрэгтэй
бараа материал, м/у/дун, галбар
гарал үүсгийн
хэрэгтэй бүрэн
бүрдүүрэн дотроо
төвөгшөөх
өгөн

6. Техникийн
комисси барилт
бүтцийг хуульч
хүрэн оруулах

5. Барилдаг хэрэгтэй
материал дотроо
материалыг бүрдүүрэн
өгөн. Дотроо төвөгшөө
хийсэн, ✓

6. ТК-г дотроо
барилт дотроо
хэрэг оруулах.

Бүртгэлийн дугаар 340 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эрхлэлийн гарын үсэг
Сүх
2025 оны 02 сарын 10 мий өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *Б.Онд*
/Тамга, тэмдэг/
Б.Онд
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 12. 03

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалтсан:
Гарын үсэг: *Б.Онд*
/Тамга, тэмдэг/
Б.Онд
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 12. 03



БИА ДУУГААР (М)
200 орон
Зүүрмэл

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ
ТАВАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ОРУУЛАХ КОМИСС
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБН АХБ

Комиссын гишүүн: Д.Дугмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тадна явган аунийг дам талбайг хараана бодомтоос иргэдэн хооор зам хий	- Албан Бичгээр баталгаа гаргасан
2. Үүднийг зовинсон халуу замга дутагд ажилыг гүйцэтгэв ала	- Албан Бичгээр баталгаа гаргасан
3. 19 дугаар ажиллагаа болон нутаг агуу ороонд уламжлал, сурьднуурно ХБН зориулсан өв агуу агуу төлөөр төлөмөө Мөн ажиллагаа ХБН үүдэнд зориулсан уламжлал, сурьднуур төлөмөө	- Биелсэн

Дүртгэлийн дугаар 390
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2009 оны 02 сарын 10 нөхдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОСНААУГ-ХҮТ-14 хэргийн илжирэг*

Комиссын гишүүн: *Н. Амар-о*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Хамгаалтын шугам болон хилүүрэн болон жижиг сэлдэр шугамууд болон хоолт тавих</p> <p>- Хоолт насас болон хоолт тавих тохиргоо хийж ECL120 app-к тохиргоо хийж даатгуудыг зөв байрлуулах</p> <p>- Хамгийн ямар хэрэгсэлчид бүрэн бүтэн байгаа хоолоо үзэмийн насамийн тохиргоо тавих тооцоолол хийх дагуу</p>	<div data-bbox="798 1644 1396 1961" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>390</i> ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>ХУУЛБАР ӨЛГӨӨН ӨЛГӨӨНИЙ ГАРЫН ҮСЭГ</p> <p><i>Сүх</i></p> <p>200<i>8</i> <i>01</i> сарын <i>10</i></p> </div>

АН

налтанд

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Амар-О</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Амар-О</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.03</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Амар-О</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Амар-О</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.24</p>

Бүртгэлийн дугаар 390

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон захиалгын газрын үеийг

Орш

2025 оны 02 сарын 10 өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зохмогч*

Комиссын гишүүн: *Э. Батболд*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгын гадна хаявгс биеийн зургийн дэвжээ хийж гүйцэтгэх</p> <p>2. Гадна металл фрескагийн зураг гаргаснаар чиглэл гүйцэтгэн хийх</p> <p>3. Хөдөлмөрийн баримттай гүйцэтгэн хийх</p>	<p>градус хураагдсан хийгдэх гүйцэтгэл биелэлтээр тооцье.</p>

Дүрмийн дугаар ... *340* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуульбар өлгөгсөн баримтын гэдгэн үсэг
Сүх
 2025 оны 01 сарын 10 өдөр

Борилтын бабыгын
амжилтааруу хүлээн
авар саналтай
байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/*Э.Бобболд*/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/*Э.Бобболд*/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.17

Зургаан дугаар 340
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгоогч өмчийн гарын үсэг
Э.Бобболд
200... ОНЫ ... СЭДЭН ... НМД ӨДӨР

Н
ЭЛТЭНД

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>cll</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Мунцагфун</i> Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.12.03-</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>cll</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Мунцагфун</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.12.15 -</p>

ЭРГЭЛЭЙН ДУГААР 340
ҮНДЭСНИЙ ТӨР АРХИВ
"ХУУНГАР ҮНЭМ"
ХУУНГАР ӨЛГӨСӨН ИДЭХЛЭГЭЙН ГАРЫН ҮСЭГ
С. Сүх
2025 оны 04 сарын 10 -ний өдөр

бүртгэлийн дугаар 340
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2005 оны 05 сарын 10 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/ *М. Эрүүсүлжиген*
 1 *[Signature]* Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.12.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 1 *[Signature]* Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.12.17
